

事業計画（千葉県浦安市）

1. 海岸対策

①海岸の状況

市内の地区海岸数	1 地区海岸
被災した地区海岸数	1 地区海岸
応急復旧を実施する地区海岸数	なし
本復旧を実施する地区海岸数	1 地区海岸
復興を実施する地区海岸数	なし

②堤防高

東京湾沿岸：T. P+3.4～7.1m（対象：高潮）

③復旧の経緯

復旧する施設の概要計画については、平成 23 年 4 月に策定済み。

これに基づく復興工事については、平成 23 年 8 月より順次工事に着工し、平成 24 年 11 月に全ての箇所ので完了した。

④ その他

地区海岸毎の計画等については別添一覧表に記載。

海岸保全施設の復旧・復興にかかる事業計画

市町村	地区海岸名	堤防護岸 延長 (m)	主な施設	施設の高さ (T.P)		応急 対策	復旧・復興の予定						H26年度の 実施内容等	H27年度の 実施内容等	その他の場合に詳細を 記載	備考
				被災前 現況高 (m)	被災後 復旧高 (m)		概要計 画策定	詳細計 画策定	左記の 実施状 況	工事 着工	左記の 実施状 況	工事 完了	左記の 実施状 況			
浦安市	浦安・浦安 海岸(日の 出1)	16,526	堤防	5.50日8.2	5.50日8.2	—	H23.4	—	—	H23.8	着工済み	H24.11	完了済み			復旧

2. 交通網

自治体管理道路

市道第 4-2 号線外 4 4 1 路線

①箇所（工事番号）名：42、43、58、60、61、62、64、68、70、215、216、217、218、219、220、221、222、223、224、225、226、227、228、229、230、231、232、233、234、235、236、237、238、239 番の 34 箇所 中、442 路線について、被災

②応急復旧による土砂撤去等により、3 月 12 日には、通行が可能となった。平成 24 年 12 月から幹線道路より災害復旧工事を進めている。

68、236、237、239 の 4 箇所については、復旧を完了。

③42、43、61、62、215、223（一部）、224（一部）、226、227、230、232、233、235、236、238、の 15 箇所の工事においては、平成 26 年度に着工したが、他事業との調整等により、繰り越し工事となっているが、平成 27 年度の早期完成を目指しております。

④平成 26 年度における成果

平成 26 年度では、幹線道路のほか、街区道路の着手を進め 42、43、61、62、215、223（一部）、224（一部）、226、227、230、232、233、235、236、238（一部）を着手した。このことにより、平成 24 年度から併せて全体で、発注ベースで 68%となり、26 年度末での出来高としては、41%となった。

⑤平成 27 年度の成果目標（集中復興期間の成果目標）

浦安市では、道路と宅地の一体的な液状化対策として、市街地液状化対策事業を進めており、平成 27 年度より、本格的に事業が進められる状況であり、道路の災害復旧工事としましては、市街地液状化対策事業との影響が考えられることから、事業の完了後に災害復旧工事を行わざるを得ないと考えており、市街地液状化対策事業と予定地区を除く路線について、工事完了に向け進めます。（27 年度末までの進捗として約 76%完了を目指します）

⑥事業完了予定年度

平成 29 年度


位置図

工事番号

42	市道第4-2号線外
43	市道第5-3号線外
215	市道第6-2号線外
216	市道第7-8号線外
217	市道第8-1号線外
218	市道第8-40号線外
219	市道第7-44号線外
220	市道第7-29号線外
221	市道第7-61号線外
222	市道第6-21号線外
223	市道第5-28号線外
224	市道第5-17号線外
225	市道第4-1号線外
226	市道第4-41号線外
227	市道第5-27号線外
228	市道第6-54号線外
58	市道第6-58号線外
229	市道第6-55号線外
60	市道第6-66号線外
61	市道第7-98号線外
62	市道第8-35号線外
230	市道第12-1号線外
64	市道第11-23号線外
231	市道第11-1号線外
232	市道第10-2号線外
233	市道第9-1号線外

工事番号

68	幹線9号外
234	幹線11号
70	幹線10号外
235	幹線5号
236	幹線4号
237	幹線3号
238	幹線6号
239	幹線2号外

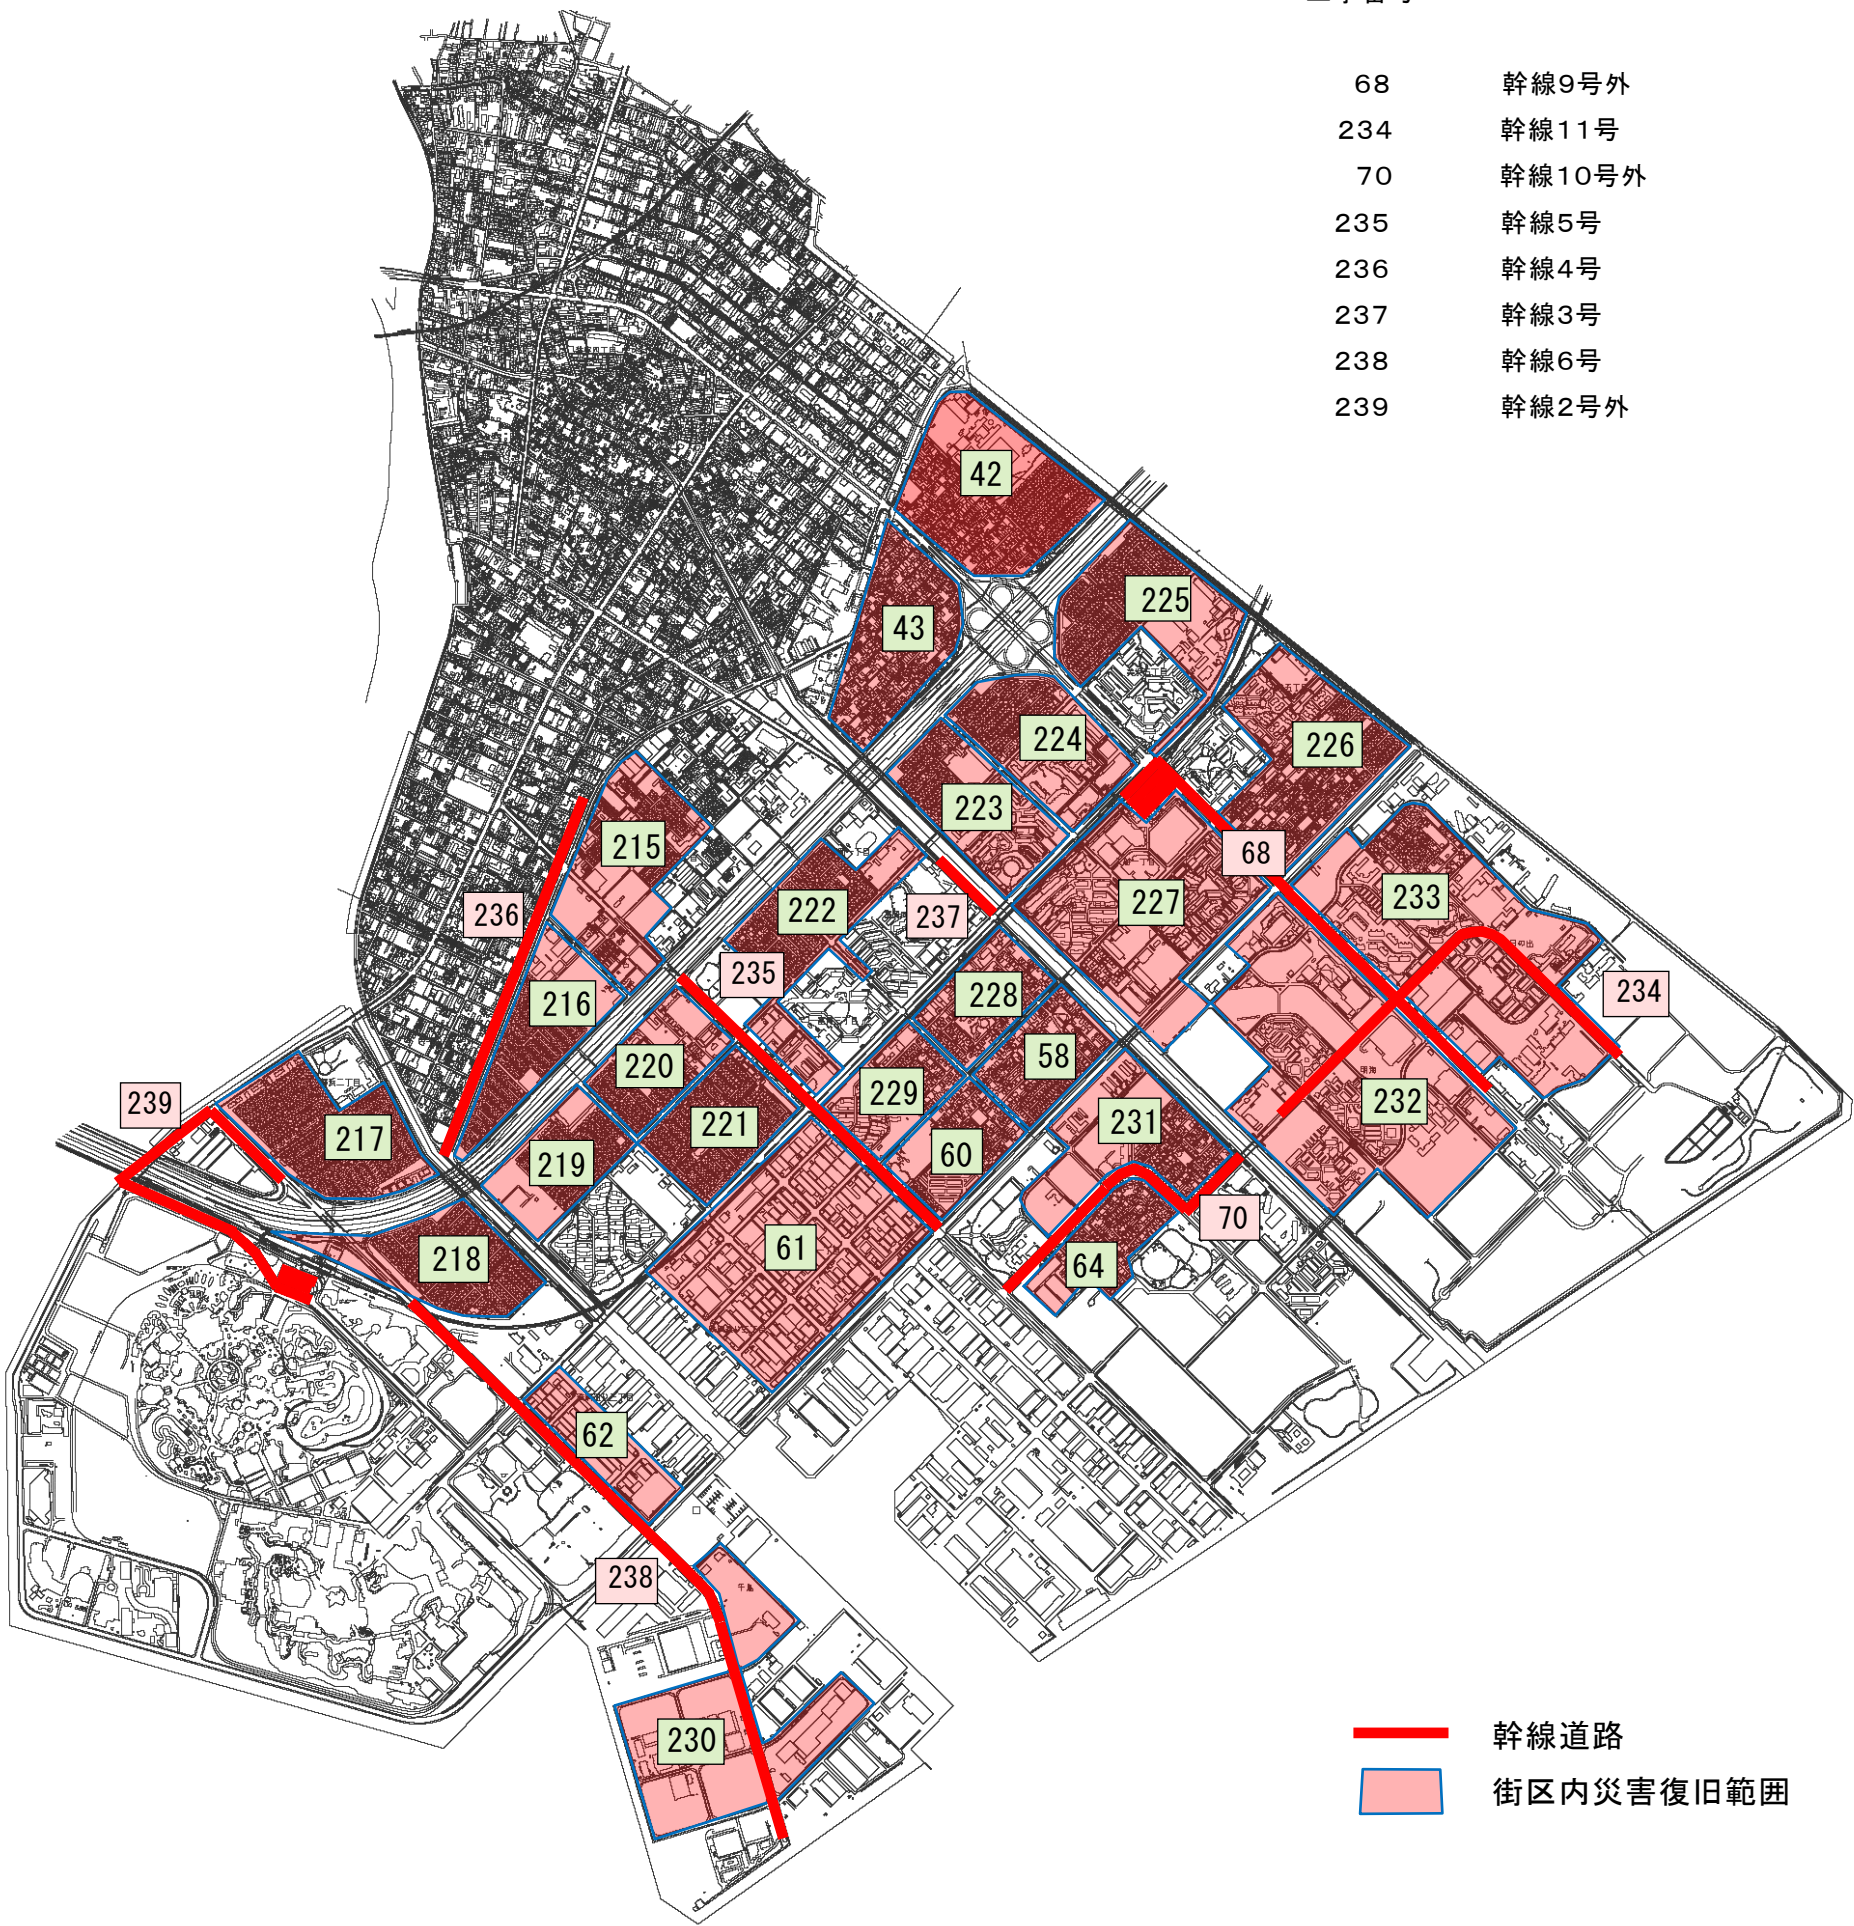

— 幹線道路
— 街区内災害復旧範囲

3. 液状化対策

①地区名：中町・新町地区

②東日本大震災復興交付金を活用して、平成 23 年度から地質調査等により公共施設と宅地との一体的な液状化対策について調査・検討を開始。

今後、液状化対策について住民合意等が整った地区について事業に着手。

③平成 26 年度における成果

20 地区において、液状化対策事業計画案の策定に関する住民合意が成立したことから、地質調査や宅地の現況調査を実施し、事業計画の作成を行った。

④平成 27 年度の成果目標

住民の費用負担について同意が得られた地区で、格子状地中壁工法による対策工事を実施する。20 地区の内、作業の進んでいる 14 地区を先行して施工する。

⑤事業完了予定年度

平成 28 年度

復興施策の工程表(千葉県浦安市)

	H 2 3				H 2 4				H 2 5				H 2 6				H 2 7				H 2 8				H 2 9				H 3 0 以降
	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月					
1. 海岸対策	施工準備 (堤防設計等) 本復旧 (対象区間について11月までに完了した。) 平成24年度完了																												
2. 交通網																													
自治体管理道路 市道4-2号線外441路線	応急工事 施工準備 (調査・設計等) 本復旧（逐次完了し、市街地液状化対策事業地区を除く路線については、27年度完了を目指す。 また、残りの路線については、市街地液状化対策の完了後に逐次工事を進め、29年度の完了を目指す） 平成29年度完了																												
3. 地盤沈下・液状化対策																													
	地質調査等により公共施設と宅地との一体的な液状化対策について調査・検討 住民説明会、勉強会実施 液状化対策事業計画案作成調査に着手 住民合意等が整った地区について事業に着手 平成28年度完了																												
