

事業計画（千葉県浦安市）

1. 海岸対策

① 海岸の状況

市内の地区海岸数	1 地区海岸
被災した地区海岸数	1 地区海岸
応急復旧を実施する地区海岸数	なし
本復旧を実施する地区海岸数	1 地区海岸
復興を実施する地区海岸数	なし

② 堤防高

東京湾沿岸：T. P+3.4～7.1m（対象：高潮）

③ 復旧の経緯

復旧する施設の概要計画については、平成 23 年 4 月に策定済み。

これに基づく復興工事については、平成 23 年 8 月より順次工事に着工し、平成 24 年 11 月に全ての箇所を完了した。

④ その他

地区海岸毎の計画等については別添一覧表に記載。

⑤ 事業完了年度

平成 24 年度

海岸保全施設の復旧・復興にかかる事業計画

市町村	地区海岸名	堤防護岸 延長 (m)	主な施設	施設の高さ(T.P)		応急 対策	復旧・復興の予定						H27年度の 実施内容等	H28年度の 実施内容等	その他の場合に詳細を 記載	備考	
				被災前 現況高 (m)	被災後 復旧高 (m)		概要計 画策定	詳細計 画策定	左記の 実施状 況	工事 着工	左記の 実施状 況	工事 完了					左記の 実施状 況
浦安市	浦安・浦安 海岸(日の 出1)	16,526.0	堤防	5.50 ～8.20	5.50 ～8.20	—	H23.4	—	—	H23.8	着工済み	H24.11	完了済み	—	—		復旧

2. 交通網

自治体管理道路

市道第 4-2 号線外 4 4 1 路線

- ① 箇所（工事番号）名：42、43、58、60、61、62、64、68、70、215、216、217、218、219、220、221、222、223、224、225、226、227、228、229、230、231、232、233、234、235、236、237、238、239 番の 34 箇所 中、442 路線について、被災
- ② 応急復旧による土砂撤去等により、3月12日には、通行が可能となった。平成24年12月から幹線道路より災害復旧工事を進めている。
42、43、61、62、68、70、215、222(一部)、223(一部)、224(一部)、226(一部)、227、230、232、233、234、235、236、237、238、239の21箇所については、復旧を完了。
- ③ 58、60、64、220(一部)、228、229、231の7箇所の工事においては、平成27年度に着工したが、他事業との調整等により繰り越し工事となっているが、平成28年度の早期完成を目指す。
- ④ 平成27年度における成果
平成27年度では、幹線道路のほか、街区道路の整備を進め58、60、64、220(一部)、228、229、231を着手した。このことにより、平成24年度から併せて全体で、発注ベースで85%となり、27年度末での出来高としては、76%となった。
- ⑤ 平成28年度の成果目標
浦安市では、道路と宅地の一体的な液状化対策として、市街地液状化対策事業を進め、住民調整や工事着手を行っている。道路の災害復旧工事は、市街地液状化対策事業との影響が考えられるため、液状化対策完了後に着手せざるを得ない。市街地液状化対策事業の進捗を踏まえ、復旧工事の完了を図る。（28年度末までの進捗は約86%完了を目指す）
- ⑥ 事業完了予定年度
平成29年度


位置図

工事番号

- 42 市道第4-2号線外
- 43 市道第5-3号線外
- 215 市道第6-2号線外
- 216 市道第7-8号線外
- 217 市道第8-1号線外
- 218 市道第8-40号線外
- 219 市道第7-44号線外
- 220 市道第7-29号線外
- 221 市道第7-61号線外
- 222 市道第6-21号線外
- 223 市道第5-28号線外
- 224 市道第5-17号線外
- 225 市道第4-1号線外
- 226 市道第4-41号線外
- 227 市道第5-27号線外
- 228 市道第6-54号線外
- 58 市道第6-58号線外
- 229 市道第6-55号線外
- 60 市道第6-66号線外
- 61 市道第7-98号線外
- 62 市道第8-35号線外
- 230 市道第12-1号線外
- 64 市道第11-23号線外
- 231 市道第11-1号線外
- 232 市道第10-2号線外
- 233 市道第9-1号線外

工事番号

- 68 幹線9号外
- 234 幹線11号
- 70 幹線10号外
- 235 幹線5号
- 236 幹線4号
- 237 幹線3号
- 238 幹線6号
- 239 幹線2号外

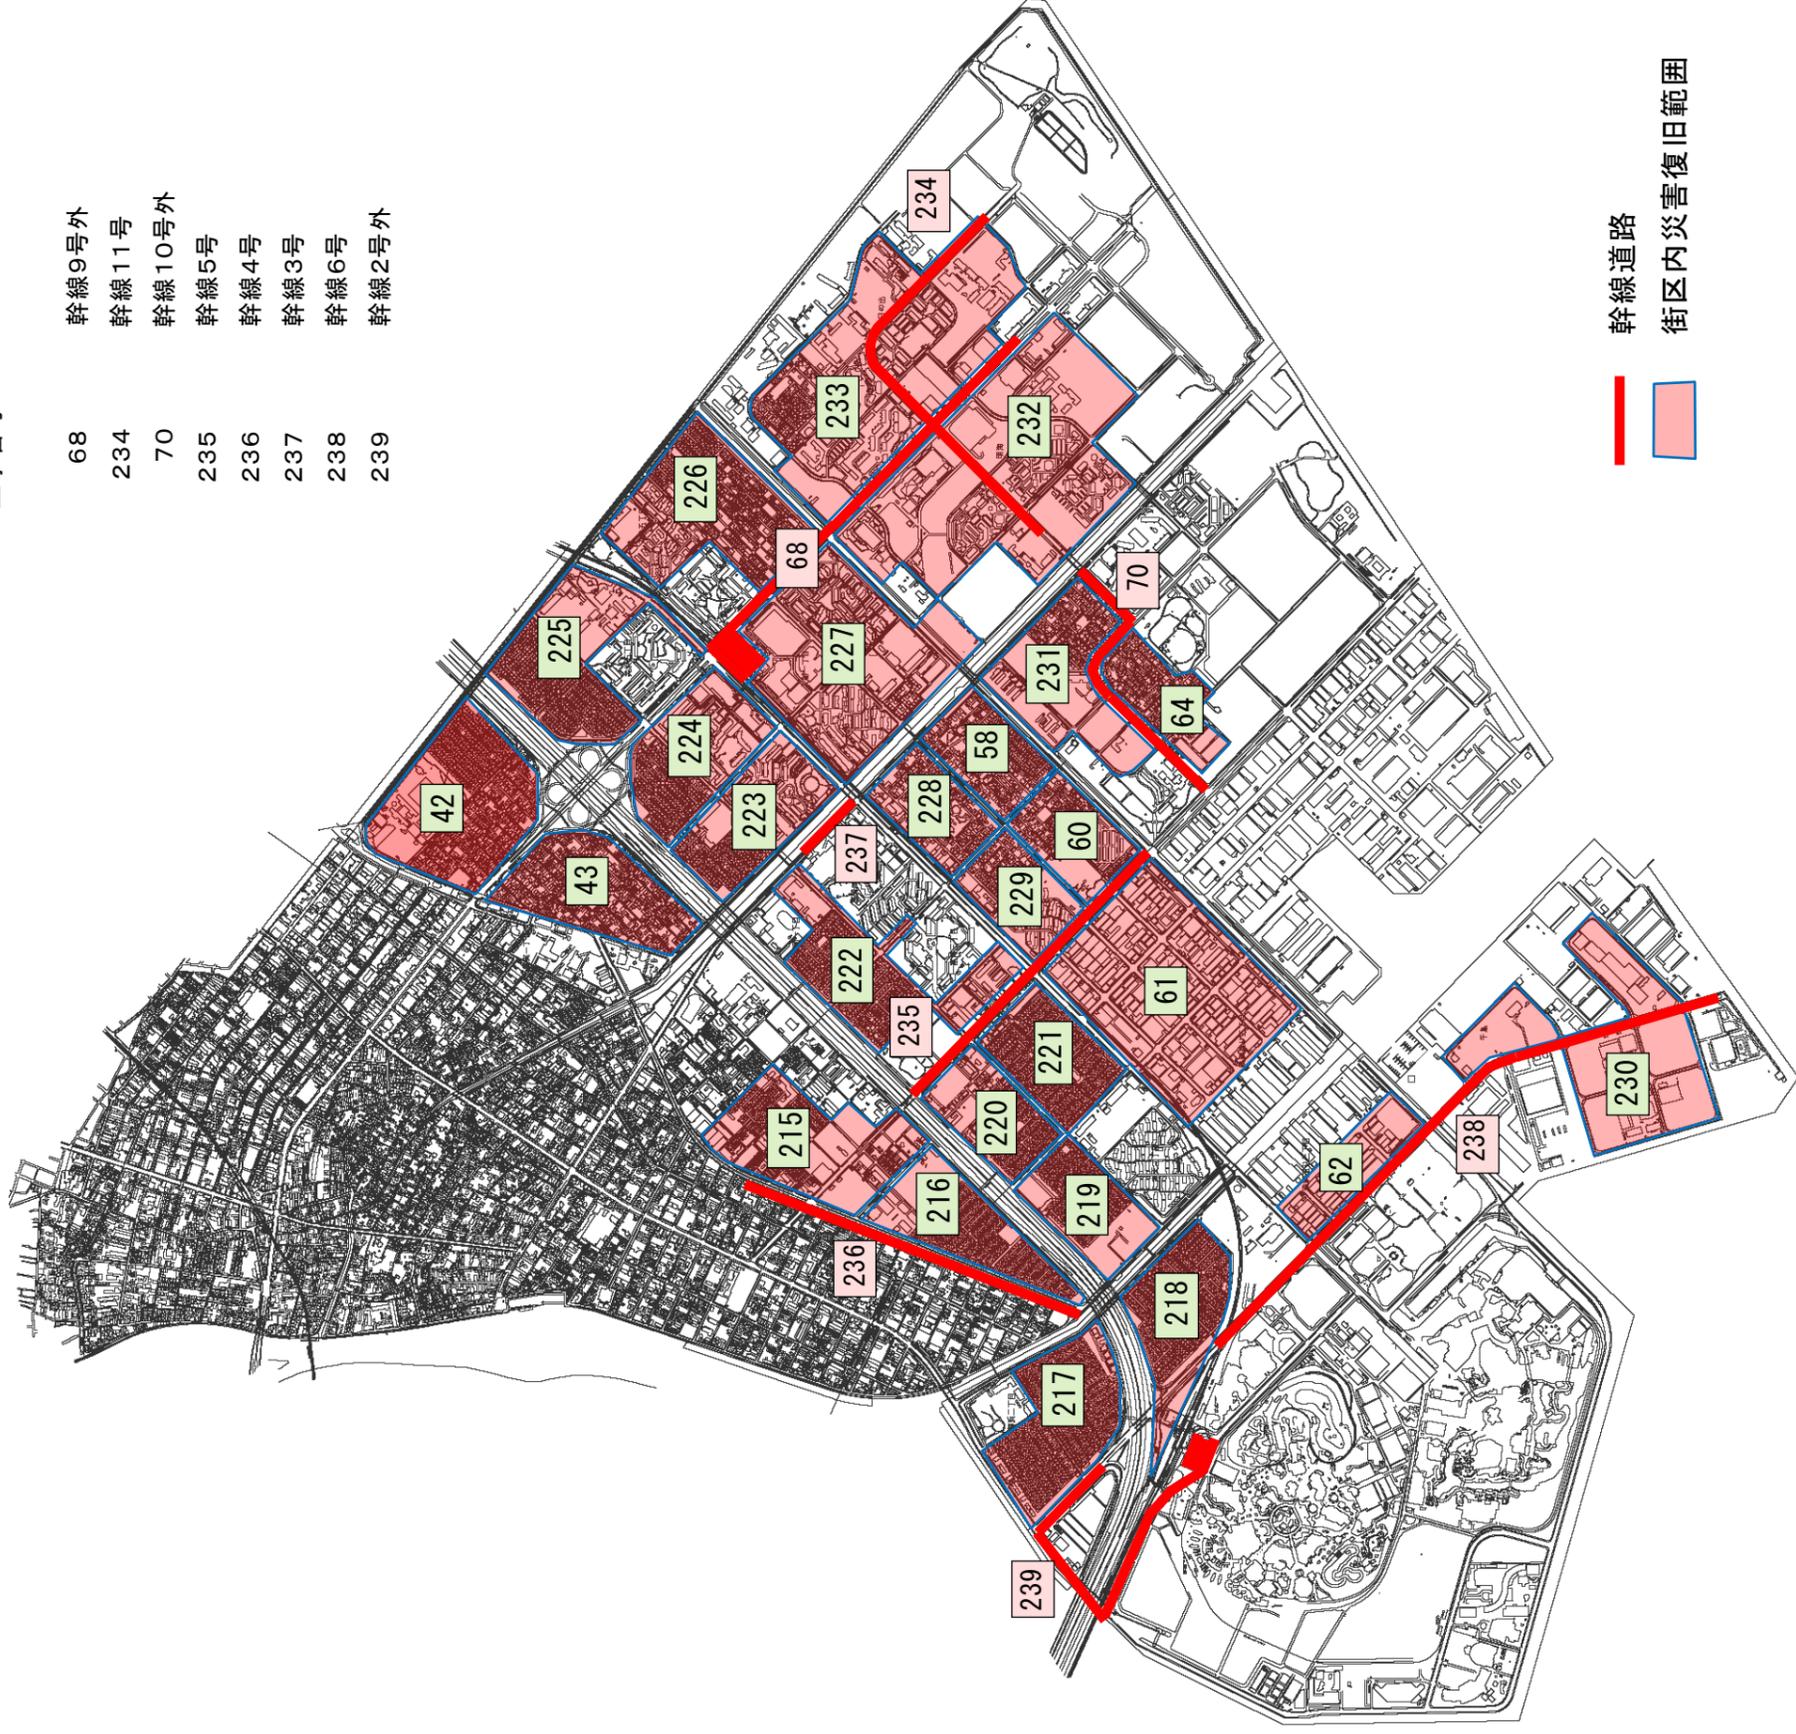

— 幹線道路
 街区内災害復旧範囲

3. 液状化対策

- ① 地区名：中町・新町地区

- ② 東日本大震災復興交付金を活用して、平成23年度から地質調査等により公共施設と宅地との一体的な液状化対策について調査・検討を開始。
今後、液状化対策について住民合意等が整った地区について事業に着手。

- ③ 平成26年度における成果
20地区において、液状化対策事業計画案の策定に関する住民合意が成立したことから、地質調査や宅地の現況調査を実施し、事業計画の作成を行った。

- ④ 平成27年度における成果
平成27年7月から28年3月までに事業計画案に関する住民説明を16地区で実施し、事業の実施に向けた住民同意の確認を進めた。
平成27年11月に1地区45宅地で事業を決定した。
平成28年1月に2地区の検討を終了した。

- ⑤ 平成28年度の成果目標
事業を決定した地区の液状化対策工事を実施する。
残る地区のうち事業の実施について同意が得られた地区で、格子状地中壁工法による対策工事を実施する。

- ⑥ 事業完了予定年度
平成28年度

復興施策の工程表（千葉県浦安市）

	H23				H24				H25				H26				H27				H28				H29				H30				H31				H32											
	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月												
1. 海岸対策					<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 本復旧 施工準備 <small>(堤防設計等)</small> (対象区間について11月までに完了した。) </div>								<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 平成24年度完了 </div>																																			
2. 交通網 自治体管理道路 <small>市道4-2号線外441路線</small>					<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 応急工事 </div>				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 施工準備 <small>(調査・設計等)</small> </div>				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 本復旧（逐次完了し、市街地液状化対策事業地区を除く路線については、27年度完了を目指す。 また、残りの路線については、市街地液状化対策の完了後に逐次工事を進め、29年度の完了を目指す） </div>												<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 平成29年度完了予定 </div>																							
3. 地盤沈下・液状化対策					<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 地質調査等により公共施設と宅地との一体的な液状化対策について調査・検討 </div>				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 住民説明会、勉強会実施 </div>				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 液状化対策事業計画案作成調査に着手 住民合意等が整った地区について事業に着手 </div>				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 平成28年度完了予定 </div>																															
