

事業計画（岩手県田野畑村）

1. 海岸対策

①海岸の状況

村内の地区海岸数	4 地区海岸
被災した地区海岸数	3 地区海岸
応急対策を実施した地区海岸数	なし
本復旧を実施する地区海岸数	3 地区海岸
復興を実施する地区海岸	1 地区海岸

②堤防高

平成 23 年 9 月 26 日に堤防高を公表※。

田野畑海岸：T.P. 14.3m（対象津波：昭和三陸地震）

※ 公表した堤防高を基本に、環境保全、周辺環境との調和、経済性、維持管理の容易性、施工性、公衆の利用等を総合的に考慮して決定する。

③復旧・復興の予定

復旧する施設の概要計画については、平成 24 年 10 月までに策定済み。

これに基づく本復旧工事については、平成 25 年 10 月より順次工事に着手し、平成 28 年度での完了を目指す。

復興する施設の概要計画については、平成 24 年 10 月までに策定済み。

これに基づく復興工事については、平成 27 年度より順次工事に着手し、概ね平成 29 年度での完了を目指す。

④平成 26 年度における成果

- ・全ての本復旧工事に着工した。（累計 3 地区海岸）

⑤平成 27 年度の成果目標（集中復興期間の成果目標）

- ・新たに、1 地区海岸において本復旧工事の完了を目指す。（累計 1 地区海岸）
- ・全ての復興工事で着工を目指す。（累計 1 地区海岸）

⑥事業完了予定年度

概ね平成 29 年度での事業完了を目指す。

⑦その他

- ・地区海岸毎の計画等については別添一覧表に記載。

海岸保全施設の復旧・復興にかかる事業計画

市町村	地区海岸名	堤防護岸延長(m)	主な施設	施設の高さ(T.P)		応急対策	復旧・復興の予定						H26年度の 実施内容等	H27年度の 実施内容等	その他の場合に詳細を 記載	備考	
				被災前 現況高 (m)	被災後 復旧高 (m)		概要計 画策定	詳細計 画策定	左記の 実施状 況	工事 着工	左記の 実施状 況	工事 完了					左記の 実施状 況
田野畑村	島の越漁港	501	防潮堤、水門、陸閘	7.30	14.30	—	H24.10	H26.9	策定済み	H26.3	着工済み	H29.3	完了予定	本工事	本工事		復旧
田野畑村	平井賀漁港	349	防潮堤、水門、陸閘	7.30	14.30	—	H24.9	H26.12	策定中	H27.2	着工済み	H29.3	完了予定	地権者等との調整	本工事		復旧
田野畑村	明戸	378	防潮堤、水門、陸閘	9.00	14.30	—	H23.12	H26.6	策定中	H25.10	着工済み	H28.3	完了予定	本工事	本工事		復旧
田野畑村	島の越漁港	501	防潮堤120m 水門1基 陸閘1基	5.00	14.30	—	H24.10	H26.10	策定中	H27.9	着工予定	H30.3	完了予定	詳細設計	詳細設計		復興

2. 河川対策

【県・市町村管理区間】

- ① 2級水系松前川水系など^{※1}の県・村管理区間では、全箇所^{※2}の災害査定を完了し、9箇所^{※2}で災害復旧事業を予定。
本復旧については、平成24年度内に、設計、地元調整等の施工準備が整った7箇所で着手し、7箇所完了済。

- ②平成25年度に、新たに2箇所で本復旧に着手（累計9箇所）
平成26年度内に本復旧を完了させることを目標とする。
本復旧は、海岸堤防の整備計画及び村が策定する復興計画等と整合を図りながら逐次整備し、概ね3年を目途に全箇所完了させることを目標とする。（まちづくりと一体となって実施する区間については、まちづくりと堤防整備の調整を図りながら実施。）

- ③平成25年度までの成果
 - ・ 全箇所（9箇所）で災害査定を完了
 - ・ 9箇所で本復旧に着手
 - ・ 7箇所での本復旧を完了


- ④平成26年度の成果目標
 - ・ 本復旧の完了予定は、以下の通り
出水期（6月頃～）まで：1箇所
平成26年度末まで：1箇所（累計9箇所）

※1 位置図を参照

※2 一連区間の取扱い方等により、箇所数は変動しうる

復興施策の事業計画 参考図面 河川 田野畑村

図面：岩手県提供

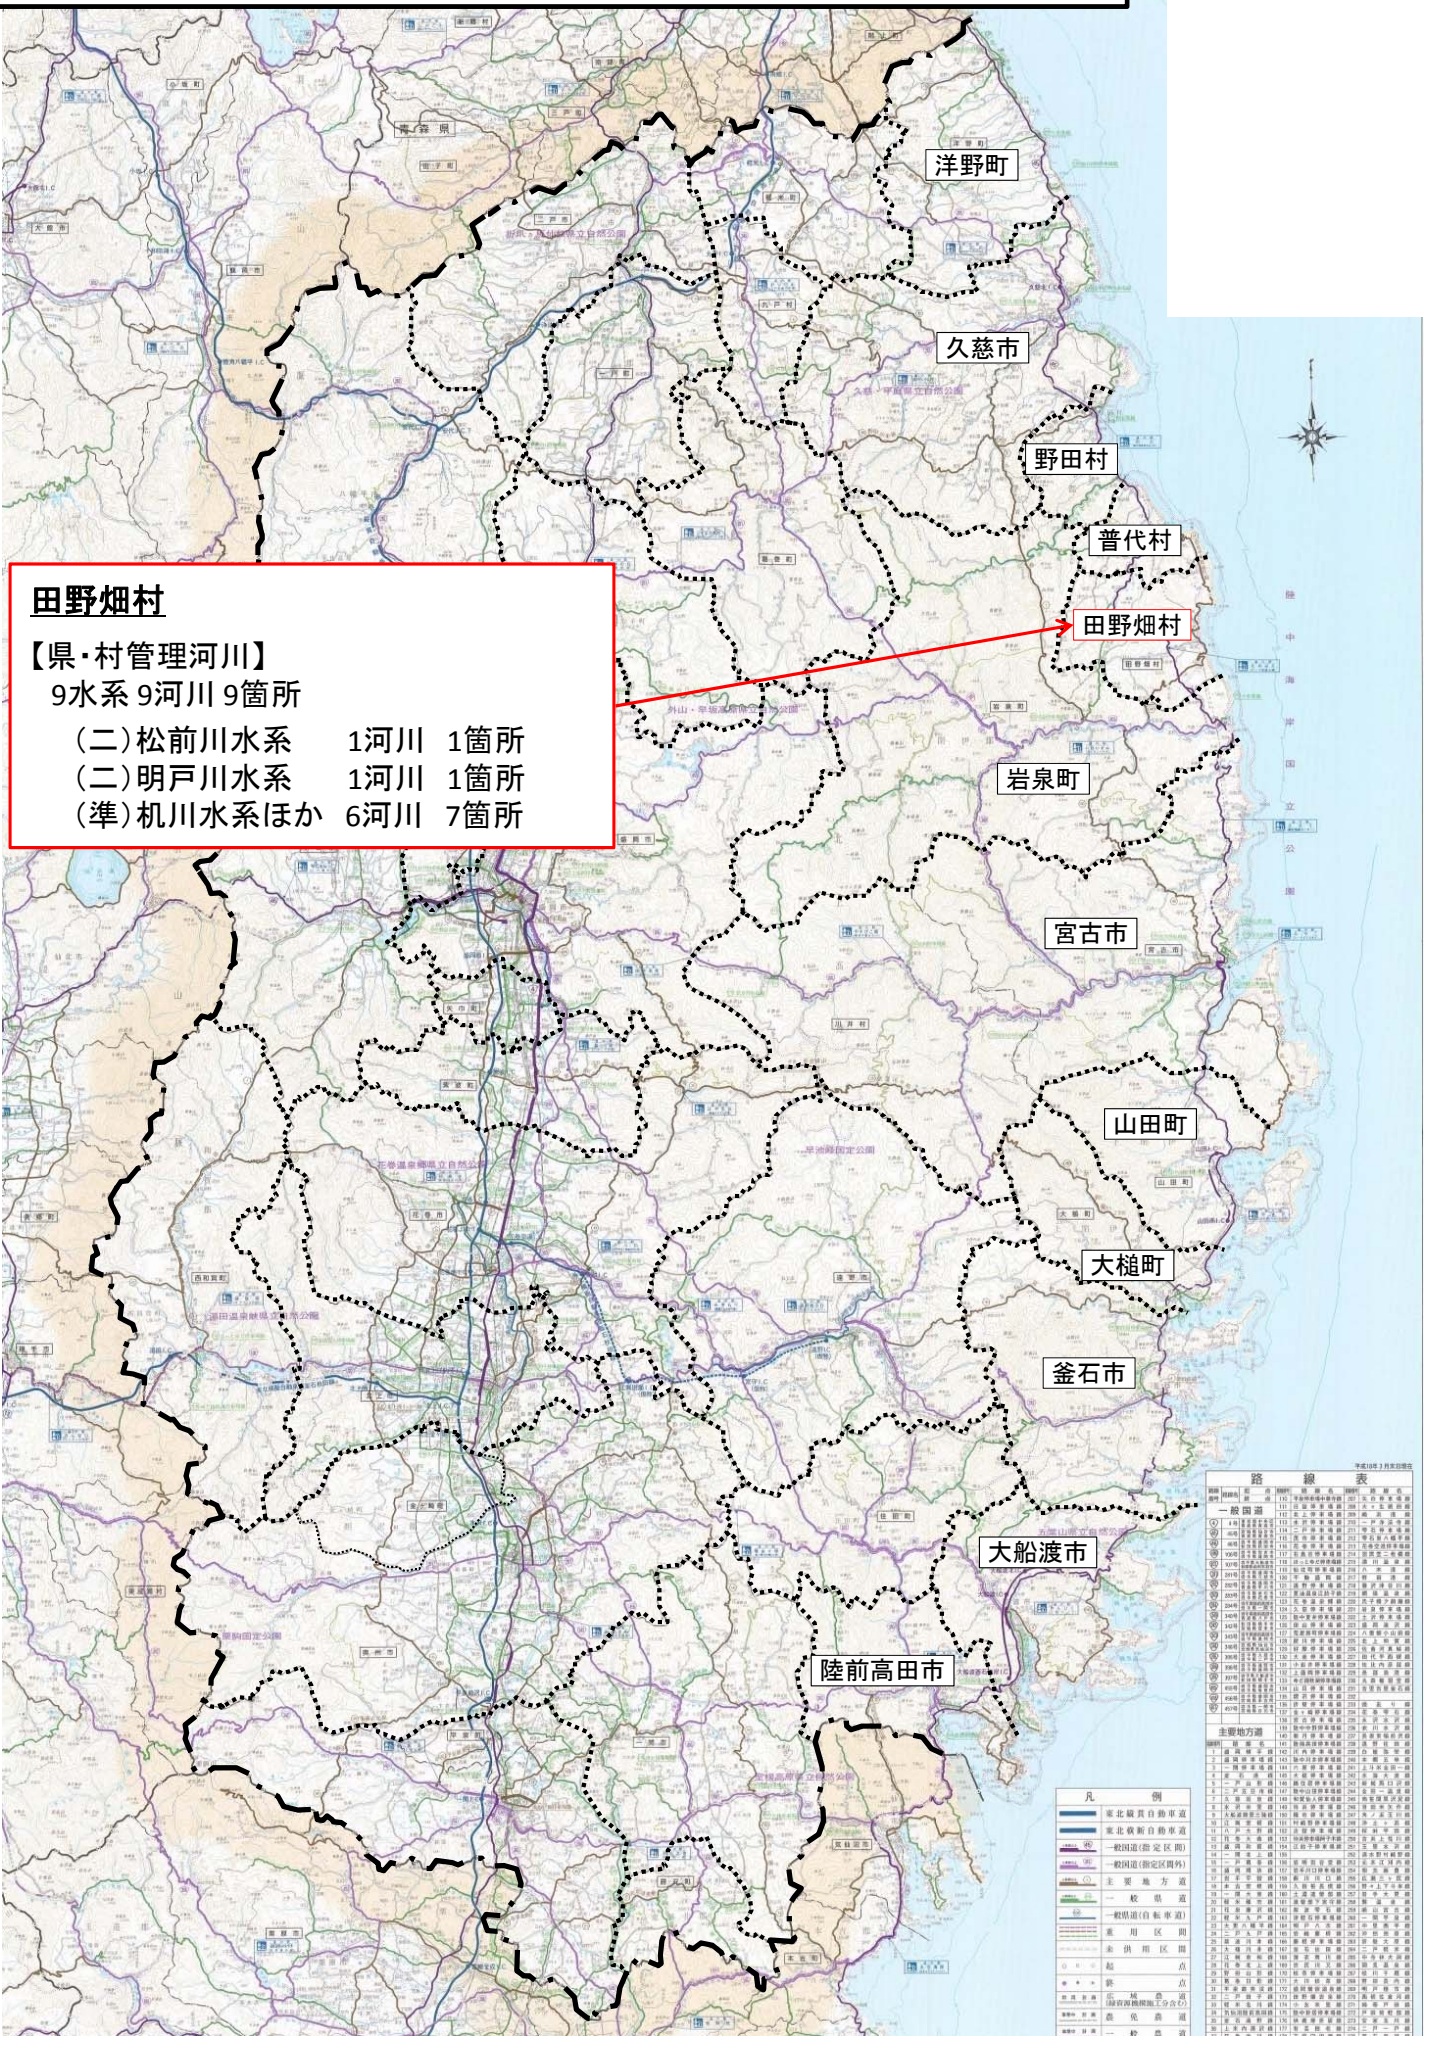

田野畑村

【県・村管理河川】

9水系 9河川 9箇所

- (二) 松前川水系 1河川 1箇所
- (二) 明戸川水系 1河川 1箇所
- (準) 机川水系ほか 6河川 7箇所

路線表

一般国道

路線番号	路線名称	起点	終点	延長
111号	山田山越線	山田町	山田町	0.0
112号	山田山越線	山田町	山田町	0.0
113号	山田山越線	山田町	山田町	0.0
114号	山田山越線	山田町	山田町	0.0
115号	山田山越線	山田町	山田町	0.0
116号	山田山越線	山田町	山田町	0.0
117号	山田山越線	山田町	山田町	0.0
118号	山田山越線	山田町	山田町	0.0
119号	山田山越線	山田町	山田町	0.0
120号	山田山越線	山田町	山田町	0.0
121号	山田山越線	山田町	山田町	0.0
122号	山田山越線	山田町	山田町	0.0
123号	山田山越線	山田町	山田町	0.0
124号	山田山越線	山田町	山田町	0.0
125号	山田山越線	山田町	山田町	0.0
126号	山田山越線	山田町	山田町	0.0
127号	山田山越線	山田町	山田町	0.0
128号	山田山越線	山田町	山田町	0.0
129号	山田山越線	山田町	山田町	0.0
130号	山田山越線	山田町	山田町	0.0
131号	山田山越線	山田町	山田町	0.0
132号	山田山越線	山田町	山田町	0.0
133号	山田山越線	山田町	山田町	0.0
134号	山田山越線	山田町	山田町	0.0
135号	山田山越線	山田町	山田町	0.0
136号	山田山越線	山田町	山田町	0.0
137号	山田山越線	山田町	山田町	0.0
138号	山田山越線	山田町	山田町	0.0
139号	山田山越線	山田町	山田町	0.0
140号	山田山越線	山田町	山田町	0.0
141号	山田山越線	山田町	山田町	0.0
142号	山田山越線	山田町	山田町	0.0
143号	山田山越線	山田町	山田町	0.0
144号	山田山越線	山田町	山田町	0.0
145号	山田山越線	山田町	山田町	0.0
146号	山田山越線	山田町	山田町	0.0
147号	山田山越線	山田町	山田町	0.0
148号	山田山越線	山田町	山田町	0.0
149号	山田山越線	山田町	山田町	0.0
150号	山田山越線	山田町	山田町	0.0

凡例

- 東北縦貫自動車道
- 東北横断自動車道
- 一般国道(特定区画)
- 一般国道(特定区画外)
- 主要地方道
- 一般県道
- 一般県道(自転車道)
- 重用区画
- 未供用区画
- 点
- 陸前高田市
- 釜石市
- 大船渡市
- 山田町
- 大槌町
- 宮古市
- 岩泉町
- 田野畑村
- 久慈市
- 洋野町

3. 農地・農業用施設

①被災状況

津波により 2 ha の農地及び農業用施設に甚大な被害

②農地の復旧状況

平成 24 年度までに復旧を完了した。

○平成 24 年度から営農が可能な農地 2 ha

4. 海岸防災林

①箇所名：明戸

②被災状況

津波により森林 6.00ha が流失した。

③事業計画の内容

被災した森林については、防災林造成事業により整備する。具体的な事業計画については、田野畑村復興計画等を踏まえ決定した再生方針に基づき検討しているところ。

④これまでの実施状況と今後の予定。

関係機関との調整を実施しているところ。

森林の復旧については、平成 28 年度に着手し、平成 30 年度の完了を目指す。

⑤平成 26 年度における成果

防災林造成事業： ア 関係機関との調整
イ 植栽試験地の経過観察

⑥平成 27 年度の成果目標（集中復興期間の成果目標）

防災林造成事業： ア 関係機関との調整
イ 植栽試験地の経過観察

⑦事業完了予定年度

平成 30 年度

（保全対象： 明戸地区集落、県道等）

5. 漁港

①被害状況

漁港数：5 漁港

被災漁港数：4 漁港

②スケジュール

田野畑村内の各被災4 漁港において、平成 24 年度末時点で、3 漁港で全延長の陸揚げ機能が回復し、1 漁港で部分的に陸揚げ機能が回復している。

今後、平成 27 年度までに、その他の漁港施設の復旧の完了を目指す。

6. 災害廃棄物等の処理

①推計量について

東日本大震災においては、地震による大規模な津波及び地震による建物の倒壊等により膨大な量の災害廃棄物等約 55 千トン※（災害廃棄物が約 37 千トン、津波堆積物が約 19 千トン）発生した。

②搬入状況について

住民が生活している場所の近くの災害廃棄物については、平成 23 年 5 月中に仮置場へ概ね搬入した。その他の災害廃棄物（損壊家屋等の解体により生じた災害廃棄物を含む。）、津波堆積物についても、平成 25 年 12 月末までに仮置場への搬入は完了した。

③処理状況について

平成 26 年 3 月末までに、災害廃棄物等約 55 千トン※（災害廃棄物が約 37 千トン、津波堆積物が約 19 千トン）の処理をすべて完了した。

※）災害廃棄物等推計量、災害廃棄物推計量及び津波堆積物推計量は、各推計量の合計値を 100 トン単位で個別に四捨五入した値のため、千トンの誤差を生じる場合がある。

復興施策の工程表(岩手県田野畑村)

	H23				H24				H25				H26				H27				H28				H29				H30
	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	以降
1. 海岸対策	<p>● 計画堤防高さの公表 (9/26岩手県公表)</p> <p>施工準備 (堤防設計等) → 本復旧・復興 (逐次完了し、全ての区間について概ねH29年度での完了を目指す。) → 平成29年度完了</p>																												
2. 河川対策 <small>(県・市町村管理河川)</small>	<p>施工準備 (堤防設計等) → 本復旧 → 平成26年度完了</p> <p>←→ 出水期 ←→ 出水期 ←→ 出水期 ←→ 出水期</p>																												
3. 農地・農業用施設 ヘドロ等が薄く 又は部分的に堆積している農地	<p>がれきの撤去 土砂撤去、除塩、用排水施設の機能確保等 営農再開</p> <p>平成24年度完了</p>																												
注) 本工程は、被災した農地を原形復旧する場合の工程を検討し、営農再開を目指す時期を示したもの。																													
4. 海岸防災林 (明戸)	<p>再生方針を決定 → 関係機関との調整、施工準備 (設計等) の実施 → 海岸防災林の再生に向けた事業を実施 → 平成30年度完了</p>																												
5. 漁港	<p>平成23年12月にがれき撤去完了 → 3漁港で全延長、1漁港で部分的に陸揚げ機能回復 → 27年度までに、その他の漁港施設の復旧の完了を目指す → 平成27年度完</p>																												
6. 災害廃棄物等の処理	<p>(住民が生活している場所の近くの災害廃棄物の撤去) → 平成23年5月に概ね完了</p> <p>(その他の災害廃棄物等の仮置場への搬入) → 平成25年12月に完了</p> <p>→ 平成26年3月に完了</p> <p>(中間処理・最終処分)</p>																												
