

# 事業計画（宮城県塩竈市）

## 1. 海岸対策

### ①海岸の状況

市内の地区海岸数	53 地区海岸
被災した地区海岸数	52 地区海岸
応急対策を実施した地区海岸数	7 地区海岸
本復旧を実施する地区海岸数	52 地区海岸
復興を実施する地区海岸数	11 地区海岸

### ②堤防高

平成 23 年 9 月 9 日に堤防高を公表※。

松島湾：T.P. 4.3m（対象津波：チリ地震）

※公表した堤防高を基本に、環境保全、周辺環境との調和、経済性、維持管理の容易性、施工性、公衆の利用等を総合的に考慮して決定する。

### ③復旧・復興の予定

復旧する施設の概要計画については、平成 23 年 12 月までに策定済み。

これに基づく本復旧工事については、平成 24 年 3 月より順次工事に着手し、平成 29 年度での完了を目指す。

復興する施設の概要計画については、平成 24 年 11 月までに策定済み。

これに基づく復興工事については、平成 26 年 3 月より順次工事に着手し、概ね平成 29 年度での完了を目指す。

### ④平成 26 年度における成果

- ・新たに、2 地区海岸において本復旧工事に着工した。（累計 32 地区海岸）
- ・新たに、4 地区海岸において復興工事に着工した。（累計 5 地区海岸）

### ⑤平成 27 年度の成果目標（集中復興期間の成果目標）

- ・新たに、5 地区海岸において本復旧工事の着工を目指す。（累計 37 地区海岸）
- ・新たに、5 地区海岸において復興工事の着工を目指す。（累計 10 地区海岸）

### ⑥事業完了予定年度

概ね平成 29 年度での完了を目指す。

⑦その他

- ・ 地区海岸毎の計画等については別添一覧表に記載。

## 海岸保全施設の復旧・復興にかかる事業計画

市町村	地区海岸名	堤防護岸延長(m)	主な施設	施設の高さ(T.P)		応急対策	復旧・復興の予定						H26年度の実施内容等	H27年度の実施内容等	その他の場合に詳細を記載	備考	
				被災前現況高(m)	被災後復旧高(m)		概要計画策定	詳細計画策定	左記の実施状況	工事着工	左記の実施状況	工事完了					左記の実施状況
塩竈市	平戸	159	護岸	6.20	5.00	—	H23.11	H24.1	策定済み	H24.3	着工済み	H25.3	完了済み				復旧
塩竈市	要の浜	133	護岸	6.20	5.50	—	H23.11	H24.1	策定済み	H24.3	着工済み	H25.3	完了済み				復旧
塩竈市	本屋敷	359	堤防	3.50	4.30	完了	H23.10	H24.1	策定済み	H24.3	着工済み	H27.7	完了予定	本工事	本工事		復旧
塩竈市	貝の浜	415	堤防	3.50	4.30	完了	H23.10	H24.1	策定済み	H24.3	着工済み	H29.9	完了予定	本工事	本工事		復旧
塩竈市	阿勢ヶ浦Ⅰ	54	護岸	3.50	3.50	—	H23.11	H25.5	策定済み	H25.10	着工済み	H28.3	完了予定	本工事	本工事		復旧
塩竈市	阿勢ヶ浦Ⅱ	271	護岸	3.50	3.50	—	H23.11	H25.5	策定済み	H25.10	着工済み	H28.3	完了予定	本工事	本工事		復旧
塩竈市	小谷地	72	護岸	2.10	3.10	—	H23.11	H25.5	策定済み	H25.10	着工済み	H29.3	完了予定	本工事	本工事		復旧
塩竈市	鰐ヶ淵A	81	堤防	3.50	3.50	—	H23.10	H25.5	策定済み	H25.10	着工済み	H29.3	完了予定	本工事	本工事		復旧
塩竈市	鰐ヶ淵B	118	護岸	3.50	3.50	—	H23.11	H25.5	策定済み	H25.10	着工済み	H29.3	完了予定	本工事	本工事		復旧
塩竈市	赤藻崎Ⅰ	81	護岸	3.10	3.10	—	H23.11	H25.5	策定済み	H25.10	着工済み	H29.3	完了予定	本工事	本工事		復旧
塩竈市	赤藻崎Ⅱ	161	護岸	3.10	3.10	—	H23.11	H25.5	策定済み	H25.10	着工済み	H29.3	完了予定	本工事	本工事		復旧
塩竈市	美女浦	112	護岸	3.10	3.10	—	H23.11	H25.5	策定済み	H25.10	着工済み	H29.3	完了予定	本工事	本工事		復旧
塩竈市	笹峯	98	護岸	3.10	3.10	—	H23.11	H25.5	策定済み	H25.10	着工済み	H29.3	完了予定	本工事	本工事		復旧
塩竈市	東三百浦2	91	堤防	3.10	3.10	—	H23.10	H25.5	策定済み	H25.10	着工済み	H28.3	完了予定	本工事	本工事		復旧
塩竈市	東三百浦3	108	護岸	3.10	3.10	—	H23.11	H25.5	策定済み	H25.10	着工済み	H28.3	完了予定	本工事	本工事		復旧
塩竈市	東三百浦4	91	護岸	3.10	3.10	—	H23.11	H25.5	策定済み	H25.11	着工済み	H28.3	完了予定	本工事	本工事		復旧
塩竈市	東三百浦5	97	護岸	3.10	3.10	—	H23.11	H25.5	策定済み	H25.11	着工済み	H28.3	完了予定	本工事	本工事		復旧

市町村	地区海岸名	堤防護岸延長 (m)	主な施設	施設の高さ (T.P)		応急対策	復旧・復興の予定						H26年度の 実施内容等	H27年度の 実施内容等	その他の場合に詳細を 記載	備考	
				被災前 現況高 (m)	被災後 復旧高 (m)		概要計 画策定	詳細計 画策定	左記の 実施状 況	工事 着工	左記の 実施状 況	工事 完了					左記の 実施状 況
塩竈市	東三百浦6	108	護岸	3.10	3.10	—	H23.11	H25.5	策定済み	H25.11	着工済み	H29.3	完了予定	本工事	本工事		復旧
塩竈市	東三百浦7	77	護岸	3.10	3.10	—	H23.11	H25.5	策定済み	H25.11	着工済み	H29.3	完了予定	本工事	本工事		復旧
塩竈市	東三百浦8	82	護岸	3.10	3.10	—	H23.11	H25.5	策定済み	H25.11	着工済み	H29.3	完了予定	本工事	本工事		復旧
塩竈市	西三百浦	230	護岸	3.10	3.10	—	H23.11	H25.5	策定済み	H25.11	着工済み	H29.3	完了予定	本工事	本工事		復旧
塩竈市	彦和田1	77	護岸	3.10	3.10	—	H23.11	H25.5	策定済み	H25.11	着工済み	H29.3	完了予定	本工事	本工事		復旧
塩竈市	彦和田2	217	堤防	3.10	3.10(一部)	—	H23.10	H25.5	策定済み	H24.11	着工済み	H29.3	完了予定	本工事	本工事		復旧
塩竈市	彦和田3	169	護岸	3.10	3.10	—	H23.11	H25.5	策定済み	H25.11	着工済み	H28.3	完了予定	本工事	本工事		復旧
塩竈市	鷺島Ⅳ	81	護岸	3.10	3.10	—	H23.11	H29.3	策定予定	H29d	着工予定	H29d	完了予定	背後の復興計画の策定・調整等	背後の復興計画の策定・調整等		復旧
塩竈市	野々島Ⅱ	54	護岸	3.10	3.10	—	H23.11	H29.3	策定予定	H29d	着工予定	H29d	完了予定	背後の復興計画の策定・調整等	背後の復興計画の策定・調整等		復旧
塩竈市	鷺島Ⅱ	94	護岸	3.10	3.10	—	H23.11	H29.3	策定予定	H29d	着工予定	H29d	完了予定	背後の復興計画の策定・調整等	背後の復興計画の策定・調整等		復旧
塩竈市	椋島Ⅰ	78	護岸	3.10	3.10	—	H23.11	H29.3	策定予定	H29d	着工予定	H29d	完了予定	背後の復興計画の策定・調整等	背後の復興計画の策定・調整等		復旧
塩竈市	大森島Ⅰ	134	護岸	3.10	3.10	—	H23.11	H29.3	策定予定	H29d	着工予定	H29d	完了予定	背後の復興計画の策定・調整等	背後の復興計画の策定・調整等		復旧
塩竈市	大森島Ⅲ	47	護岸	3.10	3.10	—	H23.11	H29.3	策定予定	H29d	着工予定	H29d	完了予定	背後の復興計画の策定・調整等	背後の復興計画の策定・調整等		復旧
塩竈市	鷺島Ⅴ	61	護岸	3.10	3.10	—	H23.11	H29.3	策定予定	H29d	着工予定	H29d	完了予定	背後の復興計画の策定・調整等	背後の復興計画の策定・調整等		復旧
塩竈市	大森島Ⅱ	57	護岸	3.10	3.10	—	H23.11	H29.3	策定予定	H29d	着工予定	H29d	完了予定	背後の復興計画の策定・調整等	背後の復興計画の策定・調整等		復旧
塩竈市	野々島Ⅲ	88	護岸	3.10	3.10	—	H23.11	H29.3	策定予定	H29d	着工予定	H29d	完了予定	背後の復興計画の策定・調整等	背後の復興計画の策定・調整等		復旧
塩竈市	椋島Ⅱ	72	護岸	3.10	3.10	—	H23.11	H29.3	策定予定	H29d	着工予定	H29d	完了予定	背後の復興計画の策定・調整等	背後の復興計画の策定・調整等		復旧
塩竈市	馬の背	85	護岸	3.10	3.10	—	H23.11	H29.3	策定予定	H29d	着工予定	H29d	完了予定	背後の復興計画の策定・調整等	背後の復興計画の策定・調整等		復旧
塩竈市	大森島Ⅳ	56	護岸	3.10	3.10	—	H23.11	H29.3	策定予定	H29d	着工予定	H29d	完了予定	背後の復興計画の策定・調整等	背後の復興計画の策定・調整等		復旧

市町村	地区海岸名	堤防護岸延長(m)	主な施設	施設の高さ(T.P)		応急対策	復旧・復興の予定						H26年度の実施内容等	H27年度の実施内容等	その他の場合に詳細を記載	備考	
				被災前現況高(m)	被災後復旧高(m)		概要計画策定	詳細計画策定	左記の実施状況	工事着工	左記の実施状況	工事完了					左記の実施状況
塩竈市	馬越	120	護岸	3.10	3.10	—	H23.11	H29.3	策定予定	H29d	着工予定	H29d	完了予定	背後の復興計画の策定・調整等	背後の復興計画の策定・調整等		復旧
塩竈市	鷺島Ⅲ	84	護岸	3.10	3.10	—	H23.11	H29.3	策定予定	H29d	着工予定	H29d	完了予定	背後の復興計画の策定・調整等	背後の復興計画の策定・調整等		復旧
塩竈市	菜ヶ崎	90	護岸	3.10	3.10	—	H23.11	H29.3	策定予定	H29d	着工予定	H29d	完了予定	背後の復興計画の策定・調整等	背後の復興計画の策定・調整等		復旧
塩竈市	野野島漁港	343	防潮堤、護岸	3.091.76	3.30	—	H23.11	H27.3	策定予定	H27.8	着工予定	H28.3	完了予定	本工事	本工事		復旧
塩竈市	寒風沢漁港	653	防潮堤、護岸	2.89	4.303.30	—	H23.11	H26.12	策定予定	H27.10	着工予定	H28.3	完了予定	本工事	本工事		復旧
塩竈市	野々島	1,352	堤防、護岸	3.102.00	4.30 3.30 3.10 2.00	完了	H23.12	H24.12	策定済み	H25.9	着工済み	H30.3	完了予定	本工事	地権者等との調整		復旧
塩竈市	毛無崎	42	護岸	3.10	3.30	—	H23.11	H24.12	策定済み	H28.2	着工予定	H29.3	完了予定	本工事	地権者等との調整		復旧
塩竈市	朴島	809	堤防、護岸	3.10	3.30 3.10	完了	H23.12	H24.12	策定済み	H25.9	着工済み	H30.3	完了予定	本工事	本工事		復旧
塩竈市	仙台塩釜港 海岸通・港町	880	堤防、護岸、胸壁、その他(陸閘)	2.70	3.30	完了	H23.11	H26.9	策定済み	H26.11	着工済み	H29.3	完了予定	本工事	本工事		復旧
塩竈市	仙台塩釜港中の島・真山道	3,929	護岸、胸壁、その他(樋門)	2.70	3.30	完了	H23.11	H26.6	策定済み	H26.7	着工済み	H30.3	完了予定	本工事	本工事		復旧
塩竈市	仙台塩釜港桂島(前浜)	486	護岸、突堤、離岸堤	3.90	4.30	完了	H23.11	H27.3	策定中	H24.9	着工済み	H30.3	完了予定	本工事	本工事		復旧
塩竈市	仙台塩釜港桂島(金ヶ浜)	0	離岸堤	2.39	2.39	—	H23.11	H24.7	策定済み	H24.10	着工済み	H26.6	完了済み	本工事	本工事		復旧
塩竈市	仙台塩釜港桂島(石浜)	297	護岸、離岸堤	2.59	3.30	—	H23.11	H27.3	策定中	H24.11	着工済み	H30.3	完了予定	本工事	本工事		復旧
塩竈市	仙台塩釜港桂島(梅浜)	286	護岸、堤防	1.76	1.76	—	H23.11	H27.3	策定中	H27.6	着工予定	H30.3	完了予定	詳細設計	本工事		復旧
塩竈市	仙台塩釜港野々島(毛無崎)	53	護岸、その他(陸閘)	3.09	3.30	—	H23.11	H27.3	策定中	H27.6	着工予定	H30.3	完了予定	地権者等との調整	本工事		復旧
塩竈市	仙台塩釜港寒風沢(前浜)	0	離岸堤	2.59	2.59	—	H23.11	H24.9	策定済み	H24.9	着工済み	H25.8	完了済み	本工事	本工事		復旧
塩竈市	塩釜漁港	無堤	胸壁、陸閘16基	—	3.30	—	H24.11	H27.3	策定予定	H27.9	着工予定	H30.3	完了予定	本工事	詳細設計		復興
塩竈市	桂島漁港	無堤	胸壁、陸閘2基	—	3.30	—	H24.11	H27.1	策定予定	H28.6	着工予定	H30.3	完了予定	本工事	詳細設計		復興
塩竈市	野野島漁港	343	胸壁	3.09 1.76	3.30	—	H24.11	H27.3	策定予定	H27.8	着工予定	H28.3	完了予定	詳細設計	詳細設計		復興
塩竈市	仙台塩釜港 海岸通・港町	無堤	防潮堤L=1,100m	1.10	3.30	—	H23.11	H26.3	策定済み	H26.3	着工済み	H28.3	完了予定	本工事	本工事		復興

市町村	地区海岸名	堤防護岸延長(m)	主な施設	施設の高さ(T.P)		応急対策	復旧・復興の予定						H26年度の 実施内容等	H27年度の 実施内容等	その他の場合に詳細を 記載	備考	
				被災前 現況高 (m)	被災後 復旧高 (m)		概要計 画策定	詳細計 画策定	左記の 実施状 況	工事 着工	左記の 実施状 況	工事 完了					左記の 実施状 況
塩竈市	仙台塩釜港 海岸通・港	無堤	水門N=1基	0.00	3.30	—	H23.11	H26.3	策定済み	H26.11	着工済み	H29.3	完了予定	本工事	本工事		復興
塩竈市	仙台塩釜港 中の島貞山 通	無堤	防潮堤L=1,724m	2.70	3.30	—	H23.11	H26.6	策定済み	H27.6	着工予定	H30.3	完了予定	本工事	本工事		復興
塩竈市	仙台塩釜港 要香浦	無堤	防潮堤L=340m	2.70	3.30	—	H23.11	H27.5	策定中	H27.6	着工予定	H30.3	完了予定	本工事	本工事		復興
塩竈市	仙台塩釜港 東宮浜	無堤	防潮堤L=194m	2.70	3.30	—	H23.11	H27.5	策定中	H27.6	着工予定	H30.3	完了予定	本工事	本工事		復興
塩竈市	仙台塩釜港 花洲浜吉田 浜	無堤	防潮堤L=160m	3.10	3.30 5.40	—	H23.11	H27.2	策定済み	H27.3	着工済み	H29.3	完了予定	本工事	本工事		復興
塩竈市	仙台塩釜港 代ヶ崎浜	無堤	防潮堤L=220m	2.70	3.30	—	H23.11	H26.5	策定済み	H27.3	着工済み	H28.3	完了予定	本工事	本工事		復興
塩竈市	仙台塩釜港 桂島石浜・ 寒風沢前浜	無堤	防潮堤L=900m	2.59 3.90	3.30 4.30	—	H23.11	H27.5	策定中	H27.3	着工済み	H30.3	完了予定	地権者等との調整	本工事		復興

## 2. 下水道対策

### ①整備目的

東日本大震災における地盤沈下及び津波被害を踏まえ、下水道施設を整備することにより、内水排除機能を強化すると共に、復興に向けた居住環境の向上を図るため、各施設の整備を行うもの。

### ②整備施設

雨水幹線、雨水ポンプ場増設及び新設、雨水貯留管、雨水枝線、区画整理関連下水道事業

### ③平成 26 年度までの成果

雨水幹線については、詳細設計が完了した路線から工事に着手済。雨水ポンプ場、貯留管等については着手済、区画整理関連下水道事業については、区画整理事業の進捗に合わせ着手予定。

### ④平成 27 年度の成果目標（集中復興期間の成果目標）

越の浦雨水ポンプ場の機械設備工事、電気設備工事及び放流渠工事の着手  
雨水枝線工事の着手、用地買収の契約  
用地買収の契約

以上の契約を行い、着手率 100%を目指す。

また、新浜町一丁目地区下水道事業（藤倉雨水ポンプ場）の年度内完成（供用開始）を目指す。

### ⑤事業完了予定年度

平成 29 年度

### 3. 交通網

自治体管理道路

(町) 新浜町大通線外 19 路線 (市町村単位で路線をまとめて)

①箇所(工区)名:(市道1級)新浜町大通線、新浜町1・2・3丁目 地内

②【新浜町大通線】・・・外2路線(新浜町三丁目十三号線・新浜町三丁目十四号線)

H26年度末で設計委託を終了。工事については外2路線についてはH27年度末に完了予定。新浜町大通線は平成28年度末で工事完了予定。

【H27年度完了予定路線】・・・9路線

尾島町東通線外3路線・中の島一号線外1路線・新富町貞山通線・旭町一号線外3路線・しおかぜ通り線外3路線港町四号線外5路線・海岸通一号線外2路線・北浜一丁目一号線外5路線・北浜一丁目二号線外5路線

【H27年度廃工予定路線】・・・4路線

新浜町三丁目二十二号線・中の島芦畔町線外1路線・浦戸線・浦戸線

【H26年度廃工路線】・・・4路線

北浜沢乙線・藤倉梅の宮線・港町一号線外2路線・北浜四丁目八号線外2路線

③H27年度末、復旧をすべて完了する予定

④平成26年度における成果

【設計委託完了】

3路線

【工事着手】

尾島町東通線外3路線・中の島一号線外1路線・新富町貞山通線・旭町一号線外3路線・港町四号線外5路線・海岸通一号線外2路線

⑤平成27年度の成果目標(集中復興期間の成果目標)


新浜町三丁目十三号線・新浜町三丁目十四号線・新浜町大通線・尾島町東通線外3路線・中の島一号線外1路線・新富町貞山通線・旭町一号線外3路線・しおかぜ通り線外3路線・港町四号線外5路線・海岸通一号線外2路線・北浜一丁目一号線外5路線・北浜一丁目二号線外5路線…計12路線工事完了

⑥事業完了予定年度

H27年度



# H23道路災事業計画 位置図 塩竈市

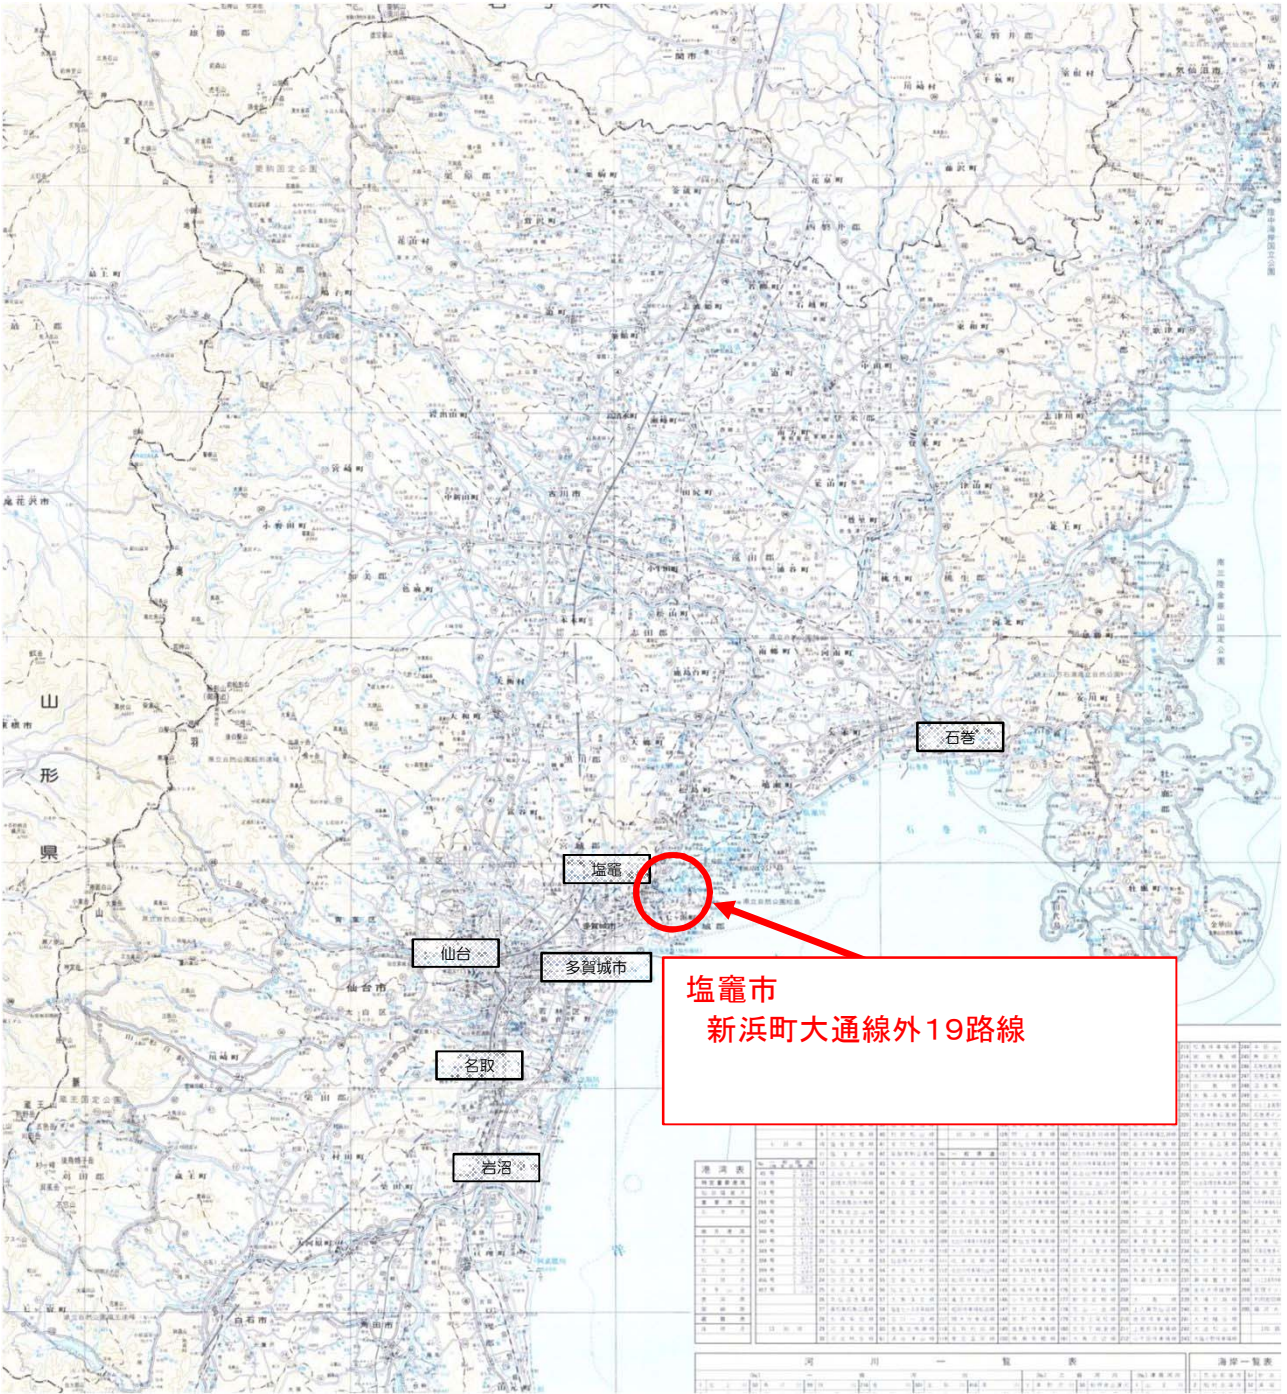

塩竈市  
新浜町大通線外19路線

海況表		河川一覧表	
項目	内容	河川名	備考
浪高	1.5m	荒川	
風速	10m/s	北上川	
風向	北東	阿武隈川	
潮位	高潮	利根川	
天候	晴	利根川	
視程	10km	利根川	
水温	15℃	利根川	
流速	0.5m/s	利根川	
水深	5m	利根川	
河床	砂	利根川	
河堤	あり	利根川	
橋梁	あり	利根川	
船舶	あり	利根川	
その他		利根川	

## 4. 農地・農業用施設

### ①被災状況

津波により約 30ha の農地及び農業用施設に甚大な被害

### ②農地等の復旧

復興計画等に基づく各種工程と調整を図りながら、早期の復旧を目指す。

○平成 24 年度から営農が可能な農地 約 7 ha

○平成 25 年度から営農が可能な農地 約 3 ha

○平成 26 年度から営農が可能な農地 約 2 ha

○平成 29 年度以降の営農再開を目指す農地 約 15ha

○平成 27 年度の成果目標（集中復興期間の成果目標）

平成 28 年度春の作付時期から、津波被災農地約 30ha のうち約 12ha（約 40%）で営農が可能となる見込み。

○事業完了予定年度 平成 29 年度

現時点における農地復旧の見通しを示したものであり、今後の地元調整等により、面積は変わり得るもの。

## 5. 海岸防災林の再生

①箇所名：塩竈市

②被災状況

津波により森林 0.4ha が被災した。

③事業計画の内容

被災した森林は、塩竈市復興計画策定等の議論を踏まえ検討する。

④これまでの実施状況と今後の予定

これまでに、海岸防災林の再生方針について塩竈市と調整を行った。調整の結果、被災した森林については、被害が小さく、防災機能への影響が軽微であることから、現状のまま経過を観察することとなった。

(保全対象： 農地、人家（浦戸地区）)

## 6. 漁港

### ①被害状況

漁港数：4 漁港

被災漁港数：4 漁港

### ②スケジュール

塩竈市内の各被災4 漁港において、平成25 年度末時点で、1 漁港で全延長の陸揚げ機能が回復し、2 漁港で部分的に陸揚げ機能が回復している。

今後、平成29 年度までに、その他の漁港施設の復旧の完了を目指す。

## 7. 復興まちづくり

### (1) 造成宅地滑動崩落緊急対策

①地区名：藤倉地区、青葉ヶ丘地区、母子沢地区

②東日本大震災復興交付金を活用して、平成 24 年度から造成宅地滑動崩落緊急対策工事に着手。25 年度末までに工事完了。

③平成 26 年度における成果  
なし（事業完了のため）

④平成 27 年度の成果目標  
なし（事業完了のため）

⑤事業完了予定年度  
なし（事業完了のため）

### (2) 学校施設等

#### ①幼稚園・小中高等学校等

##### (i) 公立学校

###### <塩竈市立学校>

小中学校施設 10 校は全て平成 23 年度内に完了した。

###### <県立学校>

塩竈市に所在する県立学校うち、東日本大震災により被災し、公立学校施設の災害復旧に係る国庫補助に申請した 1 校については、平成 24 年度内に復旧完了した。

##### (ii) 私立学校

東日本大震災により被災した私立学校のうち、私立学校施設の災害復旧に係る国庫補助を申請した 1 校については、比較的軽微な被害にとどまったことから平成 23 年度内に事業着手したが、工事の遅れにより平成 23 年度内に施工完了せず、平成 24 年 10 月に復旧完了した。

#### ②公立社会教育施設（公立社会体育施設と公立文化施設を含む）

##### <塩竈市立社会教育施設>

塩竈市公民館、ふれあいエスプ塩竈の 2 施設については全て平成 24 年度内に完

了した。

塩竈市民図書館、塩竈市民交流センターは、平成 23 年度内に完了した。

＜塩竈市立社会体育施設＞

塩竈市体育館、塩竈市温水プール、月見ヶ丘スポーツ広場、清水沢公園グラウンドの 4 施設については全て平成 24 年度内に完了した。

### (3) 津波復興拠点整備事業

①地区名：港町地区

②東日本大震災復興交付金を活用して、平成 24 年度から津波復興拠点整備事業に着手。

③平成 26 年度までの成果

平成 25 年 9 月に一団地の津波防災拠点市街地形成施設として都市計画決定し、平成 25 年 11 月に事業認可、平成 26 年 12 月に工事着手※1している。

④平成 27 年度の成果目標（集中復興期間の成果目標）

平成 27 年度の事業完了に向けて着実に工事を進めていく。

⑤事業完了予定年度

平成 27 年度予定

※1 工事着手には設計付き工事発注を含む

## 8. 土砂災害対策

- ①平成 23 年 8 月末までに、市内約 90 箇所の土砂災害危険箇所の点検を実施し、約 5 箇所で斜面の変状等を確認。降雨等により二次的な被害の恐れがある箇所等、必要に応じ土のう積みや観測等の応急対策を実施。(降雨の状況等を考慮し、随時再調査等を実施。)
  
- ②最大震度 6 強を観測した塩竈市では、地震により地盤が脆弱になっている可能性が高く、降雨による土砂災害の危険性が通常よりも高いと考えられるため、県と気象台が連携し、平成 23 年 3 月より土砂災害警戒情報の発表基準を引き下げて運用していたが、降雨と土砂災害発生状況を考慮して基準を見直し、平成 25 年 5 月に通常基準への引き上げを実施。

## 9. 災害廃棄物の処理

### ①推計量について

東日本大震災においては、地震による大規模な津波及び地震による建物の倒壊等により膨大な量の災害廃棄物等約 248 千トン（災害廃棄物が約 236 千トン、津波堆積物が約 12 千トン）発生した。

### ②搬入状況について

住民が生活している場所の近くの災害廃棄物については、平成 23 年 7 月中に仮置場へ概ね搬入した。その他の災害廃棄物（損壊家屋等の解体により生じた災害廃棄物を含む。）、津波堆積物についても、平成 25 年 3 月末までに仮置場への搬入は完了した。

### ③処理状況について

平成 26 年 2 月末までに、災害廃棄物等約 248 千トン（災害廃棄物が約 236 千トン、津波堆積物が約 12 千トン）の処理をすべて完了



# 復興施策の工程表(宮城県塩竈市)

	H23				H24				H25				H26				H27				H28				H29				H30以降
	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
1. 海岸対策	<p>応急対策</p> <p>施工準備 (堤防設計等)</p> <p>本復旧・復興 (逐次完了し、全ての区間について概ねH29年度での完了を目指す。)</p> <p>平成29年度完了</p>																												
2. 下水道対策	<p>施工準備 (詳細設計、用地補償等)</p> <p>本工事 (市策定の復興計画等を踏まえ、整備を逐次完了し、概ね5年を目途に全箇所工事完了予定。)</p> <p>平成29年度完了</p>																												
3. 交通網 自治体管理道路 (市)新浜町大通線 外19路線	<p>応急対策</p> <p>施工準備 (調査・設計等)</p> <p>本復旧 (H27年度中に完了を目指す。)</p> <p>平成27年度完了</p>																												
4. 農地・農業用施設	<p>ヘドロ等が薄く又は部分的に堆積している農地(早川地区等)</p> <p>がれきの撤去</p> <p>土砂撤去、除塩、用排水施設の機能確保等</p> <p>営農再開</p>																												
上記以外の農地	<p>がれきの撤去</p> <p>土砂撤去、除塩、畦畔の復旧</p> <p>営農再</p> <p>平成29年度完了予定</p>																												
(注)本工程は、被災した農地を原形復旧する場合の工程を検討し、営農再開を目指す時期を示したもの。																													
5. 海岸防災林	<p>※海岸防災林の再生方針について塩竈市と調整した結果、被害が小さく、防災機能への影響が軽微であることから、現状のまま</p>																												
6. 漁港施設	<p>23年9月にがれき撤去完了</p> <p>1漁港で全延長、2漁港で部分的に陸揚げ機能が回復</p> <p>29年度までに、必要な漁港施設の復旧の完了を目指す</p> <p>平成29年度完了</p>																												

