

事業計画（気仙沼市）

1. 海岸対策

① 海岸の状況

市内の地区海岸数	58地区海岸
被災した地区海岸数	49地区海岸
応急対策を実施した地区海岸数	17地区海岸
本復旧を実施する地区海岸数	48地区海岸

② 堤防高

平成23年9月9日に堤防高を公表※。

唐桑半島東部 : T.P. 11.3m（対象津波：明治三陸地震）

唐桑半島西部① : T.P. 11.2m（対象津波：明治三陸地震）

唐桑半島西部② : T.P. 9.9m（対象津波：明治三陸地震）

気仙沼湾 : T.P. 7.2m（対象津波：明治三陸地震）

気仙沼湾奥部 : T.P. 5.0m（対象津波：明治三陸地震）

大島東部 : T.P. 11.8m（対象津波：明治三陸地震）

大島西部 : T.P. 7.0m（対象津波：明治三陸地震）

本吉海岸 : T.P. 9.8m（対象津波：明治三陸地震）

※ 公表した堤防高を基本に、環境保全、周辺環境との調和、経済性、維持管理の容易性、施工性、公衆の利用等を総合的に考慮して決定する。

③ 復旧の予定

復旧する施設の概要計画については、平成23年12月までに策定※済み。

これに基づく本復旧工事の実施については、復興計画を踏まえ、他の事業との調整等を進めながら今後決定する。

本復旧工事の完了については、まちづくりや産業活動に極力支障が生じないよう、計画的に復旧を進め概ね6年での完了を目指す。

※ 概要計画策定とは、災害査定のための概略設計の完了をもっていう。

④ 平成25年度における成果

・新たに、15地区海岸において本復旧工事に着工※した。（累計22地区海岸）

※ 工事着工とは、復旧工事の工事契約等をもっていう。

⑤ 平成26年度の成果目標

・新たに、25地区海岸において本復旧工事の着工※を目指す。

※ 工事着工とは、復旧工事の工事契約等をもっていう。

⑥ その他

- ・ 地区海岸毎の計画等については別添一覧表に記載。

海岸保全施設の復旧にかかる事業計画

市町村	地区海岸名	堤防護岸 延長 (m)	主な施設	施設の高さ (T.P)		応急 対策	復旧の予定							H25年度の 実施内容等	H26年度の 実施内容等	その他の場合に詳細を 記載
				被災前 現況高 (m)	被災後 復旧高 (m)		概要計画 策定	詳細計画 策定	左記の 実施状況	工事 着工	左記の 実施状況	工事 完了	左記の 実施状況			
気仙沼市	中井地(神止)	734	護岸	4.50	4.50	—	H23.11	H24	策定済み	H25.7	着工済み	H26.11	完了予定	本工事	本工事	
気仙沼市	中の浜	320	護岸、突堤	4.50	4.50	—	H23.11	H24	策定済み	H25.7	着工済み	H26.11	完了予定	本工事	本工事	
気仙沼市	社松	150	護岸	4.20	4.20	—	H23.11	H24	策定済み	H25.7	着工済み	H26.11	完了予定	本工事	本工事	
気仙沼市	船尻	127	護岸、離岸堤	4.50	4.50	—	H23.11	H24	策定済み	H25.7	着工済み	H26.11	完了予定	本工事	本工事	
気仙沼市	鶴ヶ浦(三の浜)	487	護岸	3.00	3.00	—	H23.11	H24	策定済み	H25.1	着工済み	H25.12	完了済み	本工事		
気仙沼市	田の尻	277	護岸	4.00	4.00	—	H23.11	H24	策定済み	H25.3	着工済み	H26.3	完了済み	本工事		
気仙沼市	横沼	122	護岸	4.50	4.50	—	H23.11	H24	策定済み	H25.3	着工済み	H26.3	完了済み	本工事		
気仙沼市	登米沢	820	護岸、離岸堤、突堤	4.50	4.50	—	H23.11	H24	策定済み	H25.1	着工済み	H27d	完了予定	本工事	本工事	
気仙沼市	鮎立漁港	634	護岸	2.42	9.90	—	H23.11	H26.6	策定予定	H27.3	着工予定	H28.3	完了予定	背後の復興計画の策定・調整等	本工事	
気仙沼市	松岩漁港	671	防潮堤	3.12	7.20	—	H23.11	H26.6	策定中	H26.10	着工予定	H28.3	完了予定	背後の復興計画の策定・調整等	本工事	
気仙沼市	波路上漁港	1,854	護岸	4.52	7.20	完了	H23.11	H26.6	策定中	H26.10	着工予定	H28.3	完了予定	背後の復興計画の策定・調整等	本工事	
気仙沼市	浦の浜漁港	352	防潮堤、護岸	3.11	7.80	—	H23.11	H26.6	策定中	H26.10	着工予定	H28.3	完了予定	背後の復興計画の策定・調整等	本工事	
気仙沼市	気仙沼漁港	3,315	防潮堤、護岸	3.11	7.20	完了	H23.11	H26.6	策定中	H26.10	着工予定	H28.3	完了予定	背後の復興計画の策定・調整等	本工事	
気仙沼市	只越漁港	221	防潮堤	6.12	11.30	完了	H23.10	H26.3	策定中	H26.12	着工予定	H28.3	完了予定	地権者等との調整	本工事	
気仙沼市	神止浜漁港	85	護岸	4.50	4.50	完了	H23.12	H25.7	策定済み	H25.10	着工済み	H26.9	完了予定	本工事	本工事	

市町村	地区海岸名	堤防護岸 延長 (m)	主な施設	施設の高さ (T.P)		応急 対策	復旧の予定						H25年度の 実施内容等	H26年度の 実施内容等	その他の場合に詳細を 記載	
				被災前 現況高 (m)	被災後 復旧高 (m)		概要計画 策定	詳細計画 策定	左記の 実施状況	工事 着工	左記の 実施状況	工事 完了				左記の 実施状況
気仙沼市	宿舞根漁港	1,986	護岸、防潮堤	3.20	3.20 ～9.90	完了	H23.10	H26.3	策定中	H26.1	着工済み	H28.3	完了予定	本工事	本工事	
気仙沼市	鶴ヶ浦漁港	1,335	護岸、防潮堤	2.46	9.90	－	H23.10	H26.6	策定中	H26.10	着工予定	H28.3	完了予定	地権者等との調整	本工事	
気仙沼市	川原漁港	1,130	防潮堤	4.52	7.20	－	H23.10	H26.9	策定中	H26.9	着工予定	H28.3	完了予定	地権者等との調整	本工事	
気仙沼市	横沼漁港	334	護岸	5.12	5.12	完了	H23.10	H25.9	策定済み	H26.3	着工済み	H26.12	完了予定	本工事	本工事	
気仙沼市	駒形漁港	291	防潮堤	4.50	7.00	－	H23.10	H26.3	策定済み	H26.10	着工予定	H27.12	完了予定	地権者等との調整	本工事	
気仙沼市	要害漁港	559	護岸、防潮堤	4.12	7.00	－	H23.10	H26.3	策定済み	H26.10	着工予定	H28.3	完了予定	一定の安全確保がされている ため他地区を優先	本工事	
気仙沼市	土台磯漁港	80	護岸	4.52	4.52	－	H23.12	H25.9	策定済み	H27.4	着工予定	H28.3	完了予定	一定の安全確保がされている ため他地区を優先	一定の安全確保がされている ため他地区を優先	
気仙沼市	荒谷前	159	堤防、護岸	5.50	11.30	完了	H23.11	H24.12	策定済み	H25.9	着工済み	H28.3	完了予定	本工事	本工事	
気仙沼市	稲村浜	217	護岸	4.50	4.50	－	H23.10	H24.8	策定済み	H26.5	着工予定	H28.3	完了予定	本工事	本工事	
気仙沼市	後馬場	188	堤防、護岸	6.10	11.30	完了	H23.11	H24.8	策定済み	H26.5	着工予定	H28.3	完了予定	背後の復興計画の策定・調整 等	本工事	
気仙沼市	高石浜	107	護岸、離岸堤	4.50	4.50	完了	H23.10	H24.8	策定済み	H26.3	着工済み	H28.3	完了予定	本工事	本工事	
気仙沼市	栃浜	－	突堤、離岸堤	2.50	－	－	H23.10	H24.8	策定済み	H25.3	着工済み	H26.3	完了済み	本工事		
気仙沼市	西舞根貝浜	256	護岸	3.20	3.20	完了	H23.10	H24.8	策定済み	H26.3	着工済み	H28.3	完了予定	本工事	本工事	
気仙沼市	藤浜	－	離岸堤	－	－	－	H23.11	H24.7	策定済み	H25.3	着工済み	H26.3	完了済み	本工事		
気仙沼市	田の浜	84	堤防、護岸	2.50	9.90	－	H23.11	H24.12	策定済み	H26.9	着工予定	H28.3	完了予定	本工事	本工事	
気仙沼市	日向貝	263	護岸	3.20	3.20	完了	H23.10	H24.8	策定済み	H26.3	着工済み	H28.3	完了予定	本工事	本工事	
気仙沼市	片浜	694	堤防、護岸	3.40	7.20	－	H23.12	H24.12	策定済み	H26.3	着工済み	H29.3	完了予定	本工事	本工事	

市町村	地区海岸名	堤防護岸 延長 (m)	主な施設	施設の高さ(T.P)		応急 対策	復旧の予定						H25年度の 実施内容等	H26年度の 実施内容等	その他の場合に詳細を 記載	
				被災前 現況高 (m)	被災後 復旧高 (m)		概要計画 策定	詳細計画 策定	左記の 実施状況	工事 着工	左記の 実施状況	工事 完了				左記の 実施状況
気仙沼市	千岩田	386	堤防、護岸	3.10	7.20	－	H23.12	H24.12	策定済み	H26.6	着工予定	H29.3	完了予定	背後の復興計画の策定・調整等	本工事	
気仙沼市	台の沢	277	堤防、護岸	3.10	7.20 3.10	－	H23.11	H24.12	策定済み	H26.6	着工予定	H28.3	完了予定	背後の復興計画の策定・調整等	本工事	
気仙沼市	最知	712	堤防、護岸	4.50	7.20	－	H23.11	H24.12	策定済み	H26.6	着工予定	H29.3	完了予定	背後の復興計画の策定・調整等	本工事	
気仙沼市	岩井崎	104	護岸	2.50	9.80	－	H23.11	H24.8	策定済み	H26.9	着工予定	H28.3	完了予定	背後の復興計画の策定・調整等	本工事	
気仙沼市	杉の下	15	防潮水門	3.90	9.80	－	H23.12	H24.10	策定済み	H26.9	着工予定	H28.3	完了予定	背後の復興計画の策定・調整等	本工事	
気仙沼市	亀山磯草	1,245	堤防、護岸	3.20	7.20 3.20	完了	H23.11	H24.12	策定済み	H26.9	着工予定	H28.3	完了予定	背後の復興計画の策定・調整等	本工事	
気仙沼市	磯草	139	堤防、護岸	4.50	7.00	－	H23.11	H24.12	策定済み	H26.9	着工予定	H28.3	完了予定	背後の復興計画の策定・調整等	本工事	
気仙沼市	高井浜大向	954	堤防、護岸	4.50	7.20 4.50	完了	H23.11	H24.12	策定済み	H26.9	着工予定	H29.3	完了予定	背後の復興計画の策定・調整等	本工事	
気仙沼市	中沢	640	堤防、護岸	4.50	7.00	完了	H23.11	H24.12	策定済み	H25.12	着工済み	H29.3	完了予定	本工事	本工事	
気仙沼市	田中浜	－	離岸堤	－	－	－	H23.11	H24.8	策定済み	H25.6	着工済み	H27.3	完了予定	本工事	本工事	
気仙沼市	沖の田	177	堤防、護岸	3.90	9.80	－	H23.11	H24.12	策定済み	H26.5	着工予定	H27.3	完了予定	背後の復興計画の策定・調整等	本工事	
気仙沼市	大谷	126	堤防、護岸、人工リーフ	4.20	9.80	－	H23.11	H24.12	策定済み	H26.1	着工済み	H28.3	完了予定	本工事	本工事	
気仙沼市	中島	1,043	堤防、護岸、離岸堤	5.50	14.70	完了	H23.12	H25.3	策定済み	H26.6	着工予定	H28.3	完了予定	本工事	本工事	
気仙沼市	気仙沼港梶ヶ浦	360	護岸、その他(陸開)	2.99	7.20	－	H23.10	H26.3	策定予定	H26.6	着工予定	H28.3	完了予定	背後の復興計画の策定・調整等	本工事	
気仙沼市	気仙沼港小々汐	486	護岸、その他(陸開)	2.82	7.20	完了	H23.10	H26.4	策定予定	H26.9	着工予定	H29.3	完了予定	地権者等との調整	本工事	
気仙沼市	気仙沼港朝日	1,633	護岸、胸壁、その他(陸開)	3.19	7.20	完了	H23.10	H26.3	策定予定	H25.3	着工済み	H30.3	完了予定	本工事	本工事	

2. 河川対策

【県・市町村管理区間】

- ① 2級水系津谷川水系など※1の県・市管理区間では、全箇所（31箇所）※2の災害復旧事業を予定。そのうち、施設の被災及び背後地の状況に応じて緊急度の高い12箇所については大型土のう積み等による応急対策を完了。

本復旧については、平成23年度は、設計、地元調整等の施工準備が整った1箇所（1箇所）で着手し、完了済み。平成24年度は、1箇所（1箇所）で本復旧に着手。平成25年度は、新たに5箇所（5箇所）で本復旧に着手。

- ② 平成26年度に、新たに13箇所（13箇所）で本復旧に着手予定（累計20箇所）。

また、平成26年度内に3箇所（3箇所）で本復旧完了予定。

残る箇所についても、順次、本復旧に着手し海岸堤防の整備計画及び市が策定する復興計画等と整合を図りながら逐次整備。概ね7年を目途に全箇所完了させることを目標とする。（まちづくりと一体となって実施する区間については、まちづくりと堤防整備の調整を図りながら実施。）

併せて、堤防において液状化のおそれがある箇所については対策を実施。

- ③ 平成25年度における成果・4箇所（4箇所）で本復旧に着手（累計7箇所）

- ・ 1箇所（1箇所）で本復旧を完了（累計2箇所）


- ④ 平成26年度の成果目標

- ・ 新たに、13箇所（13箇所）で本復旧に着手予定（累計20箇所）
- ・ 本復旧の完了予定は、以下の通り
平成26年度末まで : 3箇所（3箇所）

※1 位置図を参照

※2 一連区間の取扱い方等により、箇所数は変動しうる


図面:宮城県提供

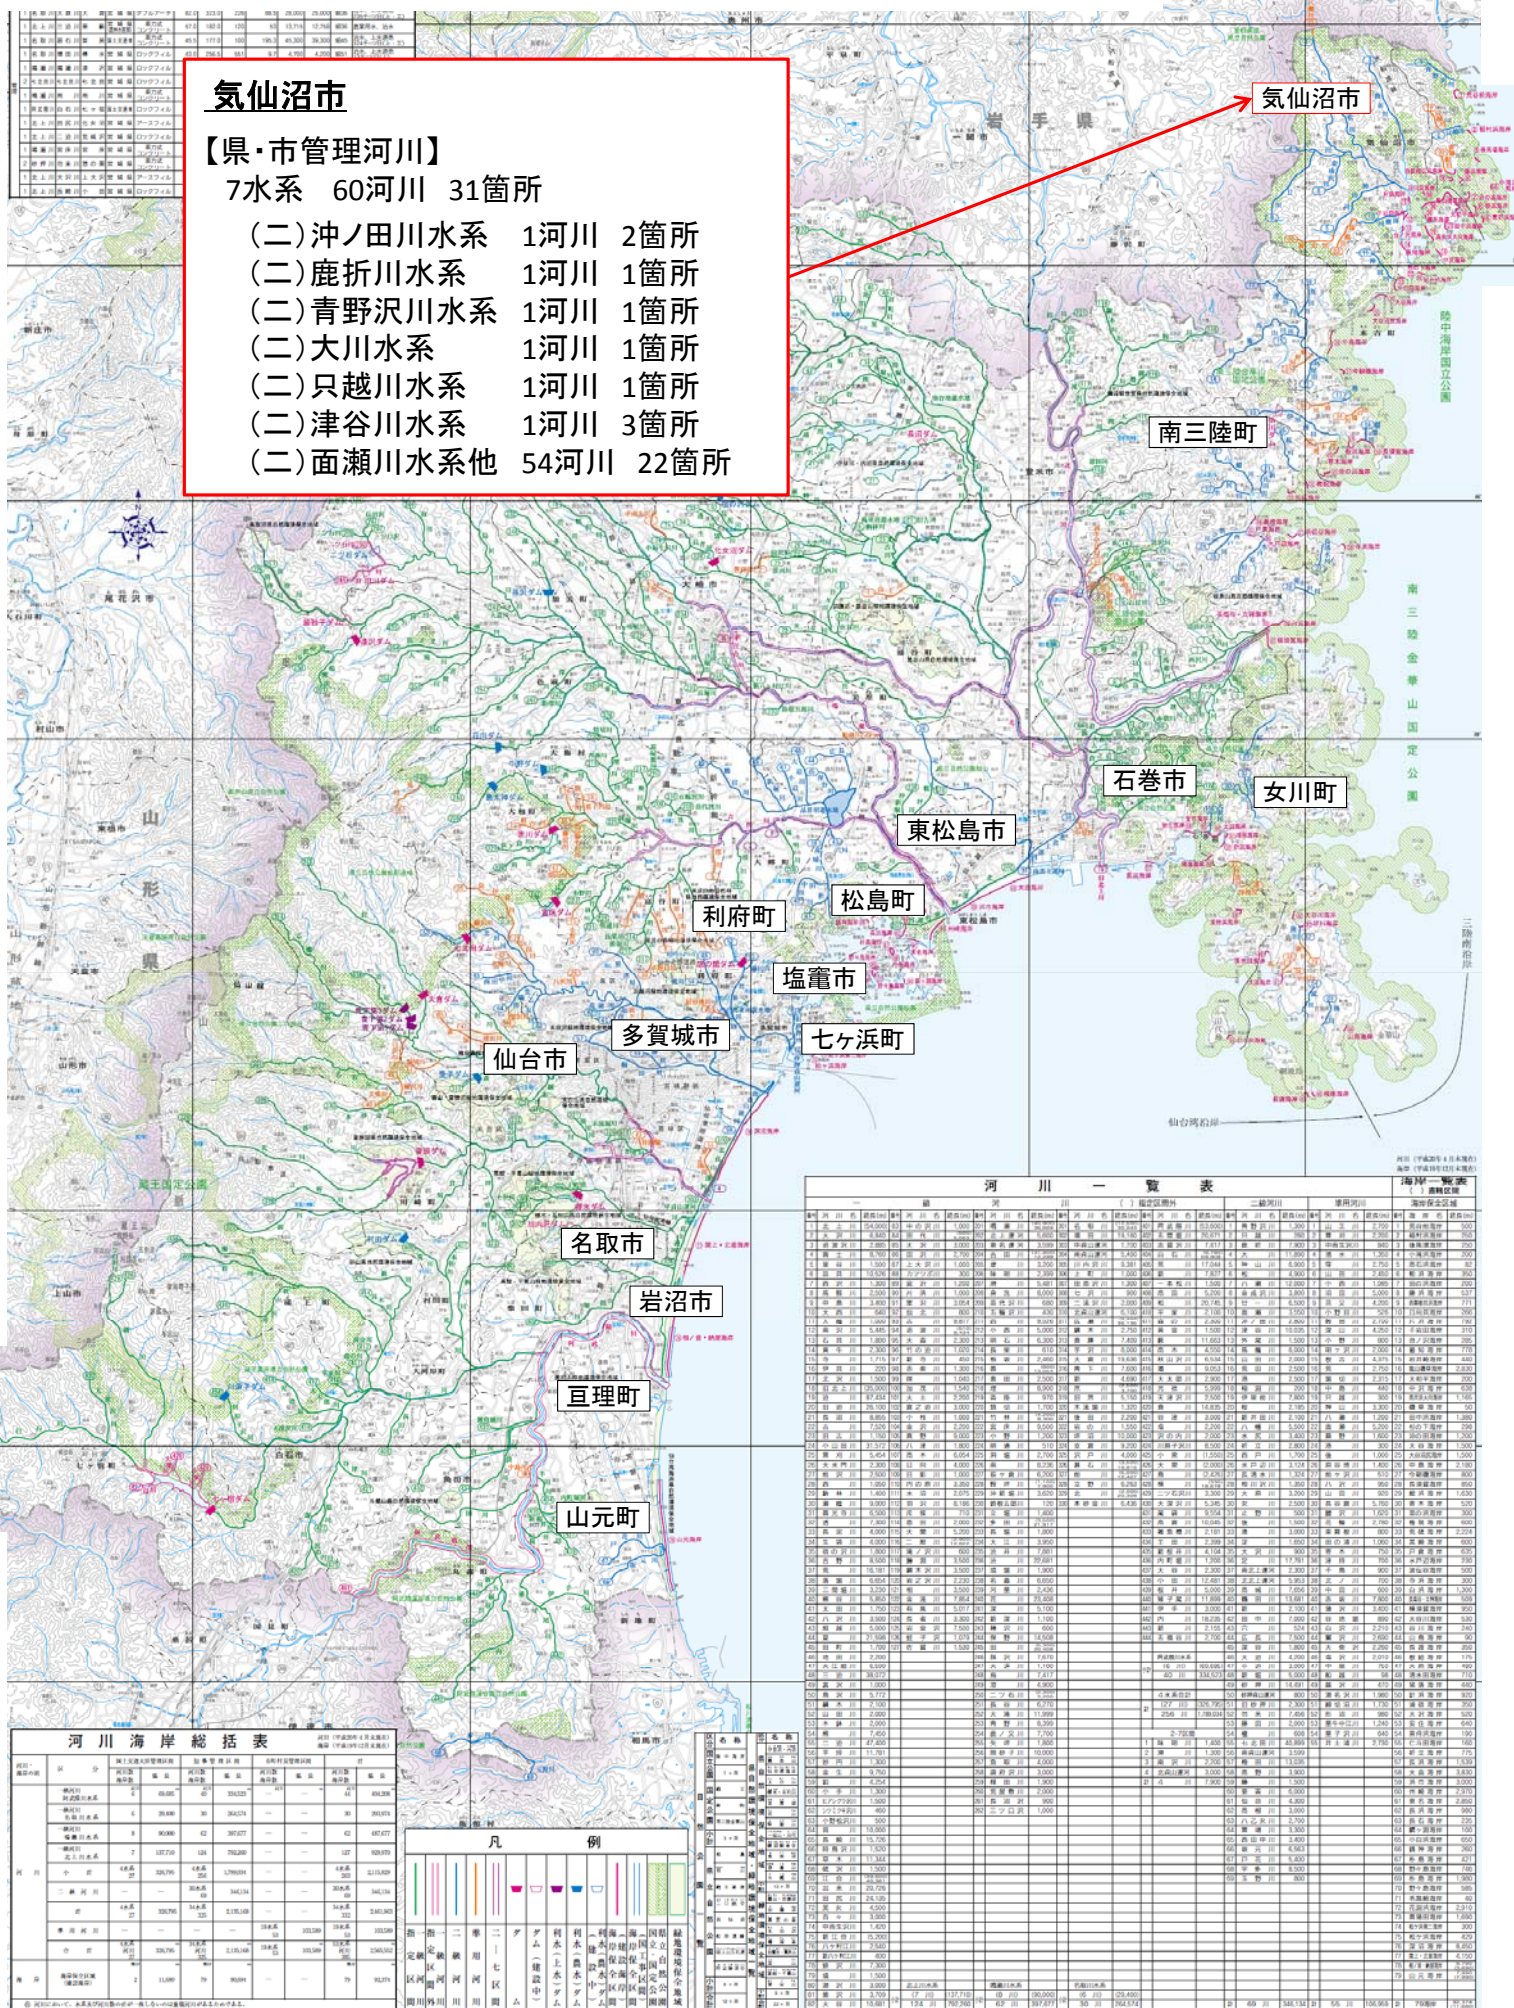

3. 下水道

- ① 箇所名：気仙沼終末処理場、津谷街浄化センター（※位置図を参照）
- ② 平成２５年度における成果
気仙沼終末処理場については、平成２５年１２月に原位置における水処理施設が復旧及び平成２６年３月に汚泥処理施設が復旧。
津谷街浄化センターについては、平成２５年３月に通常レベルの処理を開始。
- ③ 平成２６年度の成果目標
気仙沼終末処理場について、平成２７年３月に新管理棟が完成。

(参考)下水処理場 位置図

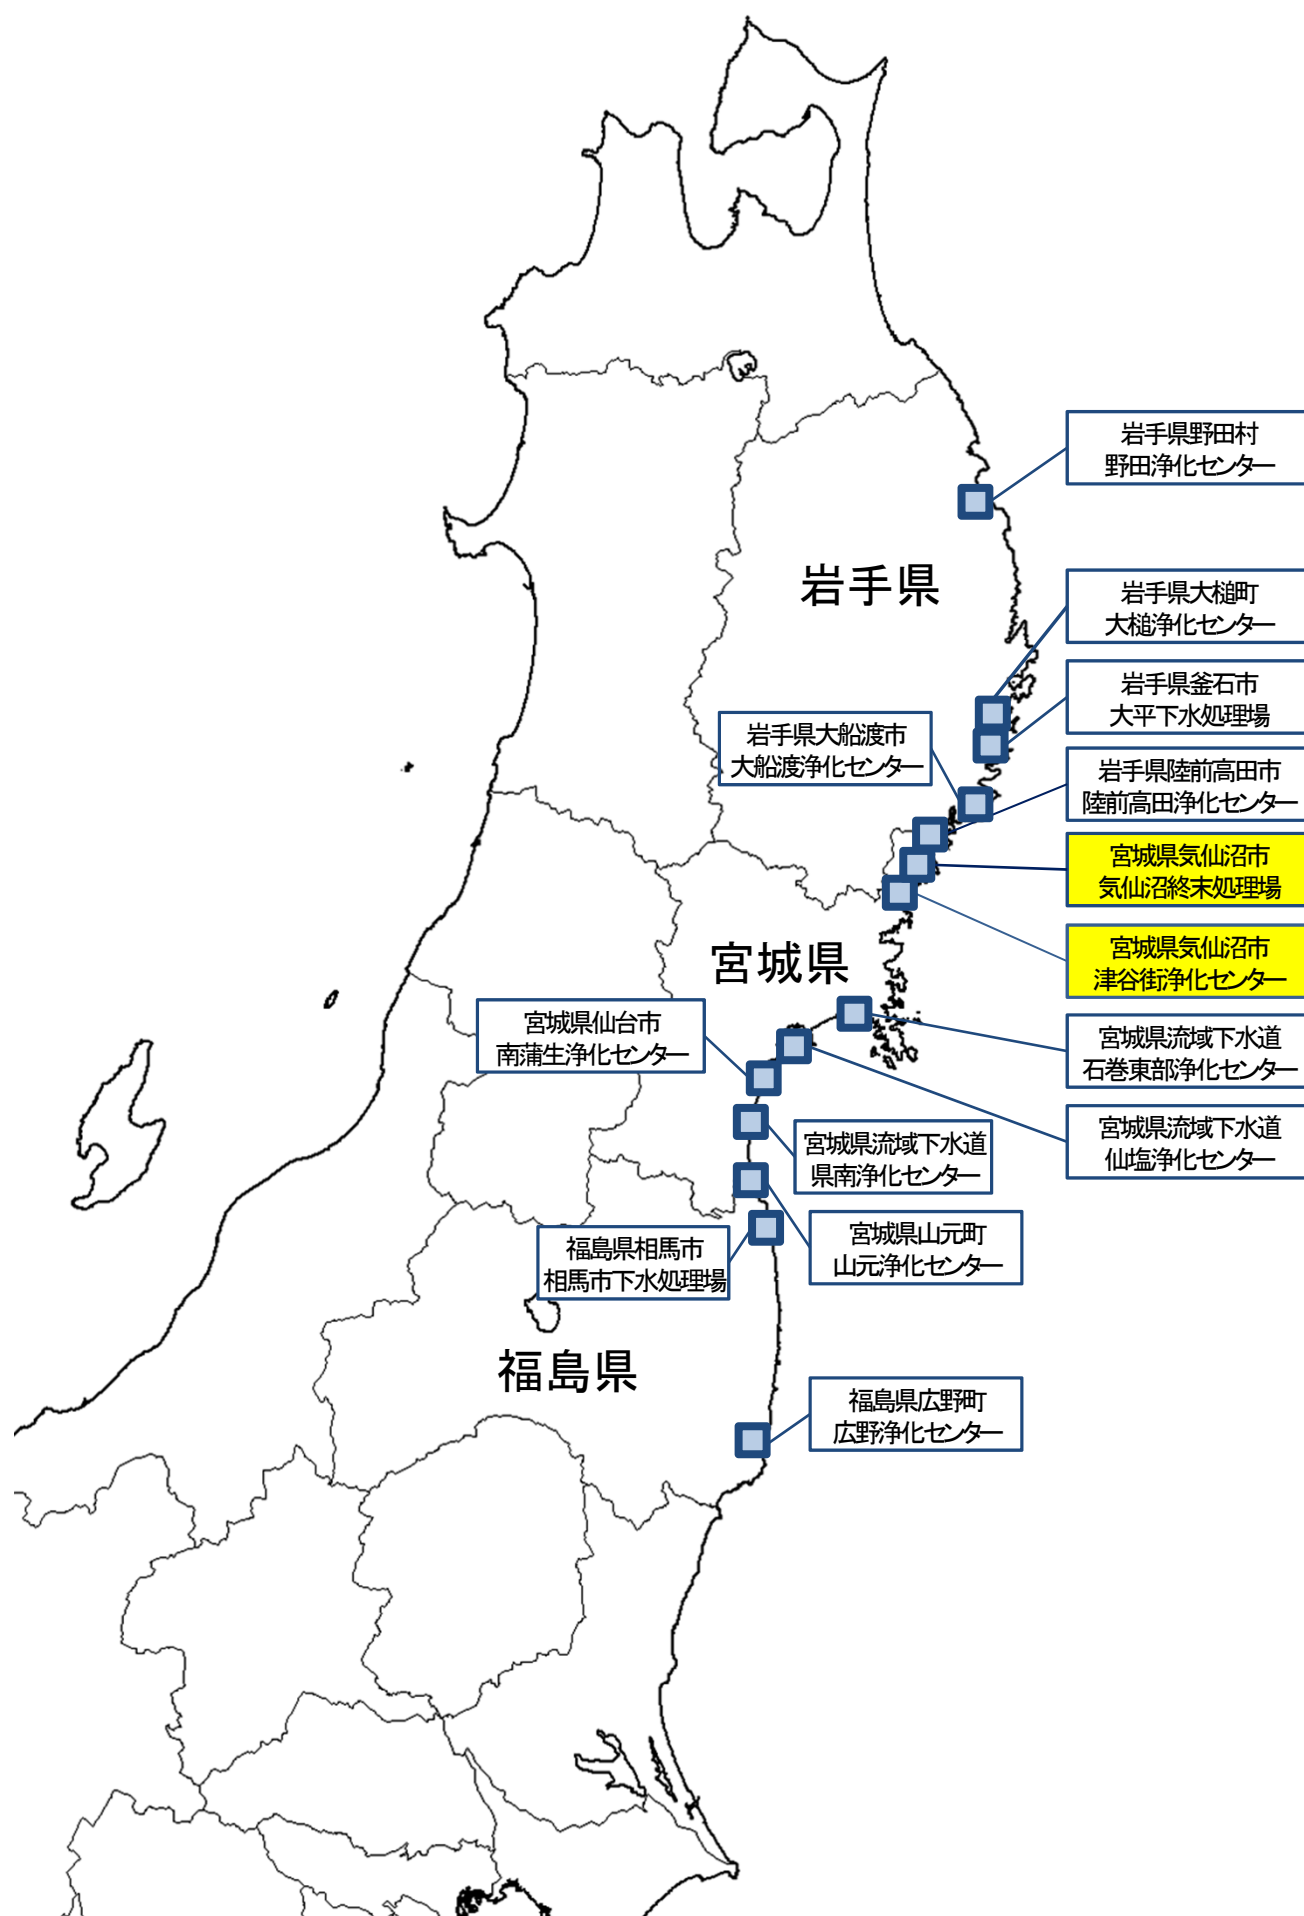

4. 農地・農業用施設

① 被災状況

津波により約 670ha の農地及び農業用施設に甚大な被害

② 農地等の復旧

復興計画等に基づく各種工程と調整を図りながら、早期の復旧を目指す。

○平成 24 年度から営農が可能な農地 約 104ha

(沖ノ田、内田地区等の一部農地)

○平成 25 年度から営農が可能な農地 約 194ha

○平成 26 年度から営農が可能な農地 約 127ha

○平成 27 年度の営農再開を目指す農地 約 32ha

○平成 28 年度以降の営農再開を目指す農地 約 56ha

〔現時点における農地復旧の見通しを示したものであり、今後の地元調整等により、面積は変わり得るもの。〕

③ 区画整理等検討状況

気仙沼地区において、大区画化等の区画整理を実施しているところ。

5. 海岸防災林の再生

① 箇所名： 旧唐桑町

② 被災状況

津波により防潮堤 40mが損壊した。

③ 事業計画の内容

被災した防潮堤（40m）については、治山施設災害復旧事業により復旧する。

④ これまでの実施状況と今後の予定

防潮堤の復旧工事については、平成 25 年度に着手し、平成 26 年度の完了を目指す。

⑤ 平成 25 年度における成果

治山施設災害復旧事業： 防潮堤 40mの復旧を実施。

⑥ 平成 26 年度の成果目標

治山施設災害復旧事業： 防潮堤の復旧を完了。

（保全対象： 県道 239 号線、農地、人家（高石浜地区）

① 箇所名： 旧気仙沼市

② 被災状況

津波により防潮堤 4,343m、森林 12.5ha が被災した。

③ 事業計画の内容

被災した防潮堤（4,343m）については、治山施設災害復旧事業により復旧する。
治山施設災害復旧事業のうち尾崎～千岩田、岩井崎、御伊勢浜の各地区は、国が特定民有林直轄治山施設災害復旧事業により復旧し、その他の地区については補助事業により復旧する。

被災した森林（12.5ha）は、防災林造成事業により整備をする。

④ これまでの実施状況と今後の予定

居住可能な家屋の残っている集落が背後に存する尾崎～千岩田及び岩井崎の地区については、平成 23 年度に特定民有林直轄治山施設災害復旧事業により応急復旧を実施した。また、防潮堤の復旧工事及び森林造成の事業計画の作成に向け、これまで気仙沼市や地元住民への説明を実施した。

防潮堤の復旧工事については平成 26 年度から着手し、平成 27 年度までの完了を目指す。

また、森林造成については、防潮堤の復旧工事が完了した箇所から苗木の植栽を実施し、平成 27 年度までの完了を目指す。

⑤ 平成 25 年度の成果

治山施設災害復旧事業： 事業計画の作成に向け地元調整を完了。

防災林造成事業： 森林造成の事業計画の作成に向け地元調整を完了。

⑥ 平成 26 年度の成果目標

治山施設災害復旧事業： 防潮堤 4,300m の復旧を実施。

(保全対象： 国道 45 号線、県道 208 号線他、農地、人家（千岩田地区）

① 箇所名： 旧本吉町

② 被災状況

津波により防潮堤 235m、森林 3.4ha が被災した。

③ 事業計画の内容

被災した防潮堤（235m）については、国が特定民有林直轄治山施設災害復旧事業により復旧する。

被災した森林（3.4ha）については、防災林造成事業により整備を行う。

④ これまでの実施状況と今後の予定

防潮堤の復旧工事及び森林造成の事業計画の作成に向け、これまで、気仙沼市や地元住民への説明会を実施した。

防潮堤の復旧工事については、平成 26 年度に着手し、平成 27 年度の完了を目指す。また、森林造成については、防潮堤の復旧工事が完了した箇所から苗木の植栽に着手し、平成 32 年度までの完了を目指す。

⑤ 平成 25 年度の成果

治山施設災害復旧事業： 事業計画の作成に向け、地元調整を完了。

防災林造成事業： 森林造成の事業計画の作成に向け、地元調整を完了。

⑥ 平成 26 年度の成果目標

治山施設災害復旧事業： 防潮堤 235m の復旧を実施。

(保全対象： 国道 45 号線、農地、人家（沖ノ田地区他）

(旧本吉町の沖ノ田地区は、特定民有林直轄治山施設災害復旧事業により、国が代行して実施する。)

① 箇所名： 野々下・沖ノ田海岸、野々下海岸、大谷海岸、三島海岸（国有林）

② 被災状況

津波により防潮堤 1,600m、森林 15ha が被災した。

③ 事業計画の内容

被災した防潮堤（1,600m）については、市復興計画及び他事業との調整等踏まえ、必要な構造設計等の後、治山施設災害復旧事業により着手予定。

④ これまでの実施状況と今後の予定

防潮堤については、居住可能な家屋の残っている集落が背後に存する区間や高潮、波浪による浸水の危険性が高いところで応急復旧を実施。本復旧については、地域全体のまちづくり計画との整合を図りつつ今後の復旧方針を決定する予定。防潮堤の復旧及び盛土等海岸防災林の林帯地盤の復旧は平成 27 年度に完了を目指す。苗木の植栽は、林帯地盤の復旧後、防風工の施工等が完了した箇所から順次実施し、全体の復旧を平成 32 年度に完了することを目指す。

⑤ 平成 25 年度における成果

治山施設災害復旧事業： 防潮堤 132mの復旧を実施。（野々下海岸）

⑥ 平成 26 年度の成果目標

平成 24 年に着手した野々下海岸の完成を目指すとともに、他地区についても地域全体のまちづくり計画との整合を図りつつ今後の復旧方針の決定を目指す。

（保全対象：国道 45 号線、JR 大谷海岸駅、大谷集落等）

（なお、国有林内については、国有林野内直轄治山施設災害復旧事業等により国が直接実施する。）

6. 漁港

① 被害状況

漁港数：３８漁港

被災漁港数：３８漁港

② スケジュール

気仙沼市内の各被災３８漁港において、平成２５年度末時点で、６漁港で全延長の陸揚げ機能が回復し、３２漁港で部分的に陸揚げ機能が回復している

今後、平成２９年度までに、その他の漁港施設の復旧の完了を目指す。

7. 復興まちづくり

(1) 学校施設等

① 幼稚園・小中高等学校等

(i) 公立学校

<気仙沼市立学校>

東日本大震災により被災した市立学校のうち、公立学校施設の災害復旧に係る国庫補助に申請した19校について、以下のとおり、早期の復旧を目指す。なお、甚大な被害を受けた南気仙沼小学校については、気仙沼小学校との統合を平成24年4月に行い、津波被害を受けた大谷幼稚園については、平成25年度に移転新築し復旧が完了した。

また、地震により、老朽化した園舎が被災した唐桑幼稚園については、平成25年度に移転新築し復旧が完了した。

○ 比較的軽微な被害に留まる18校については、平成25年度までに17校が復旧完了している。また、1校については平成26年度前期に復旧完了する予定としている。

<県立学校>

気仙沼市に所在する県立学校のうち、東日本大震災により被災し、公立学校施設の災害復旧に係る国庫補助に申請した又は申請予定の5校について、以下のとおり早期復旧を目指す。

比較的軽微な被害にとどまる4校のうち2校については、平成23年度内に事業着手し復旧した。また、残る2校については、平成23年度内に事業着手し、平成24年度内に復旧完了した。

津波による甚大な被害を受けた1校については、気仙沼市南部での再建を目指し、用地の取得・造成等について関係者との調整を進めた上で、平成29年度末の完成を目途に本格復旧に着手することとしている。

(ii) 私立学校

東日本大震災により被災した私立学校のうち、私立学校施設の災害復旧に係る国庫補助を申請した4校について、以下のとおり、平成24年度までに復旧完了した。

○ 比較的軽微な被害に留まる2校については、平成23年度中に復旧完了した。

○ 甚大な被害を受けた葦の芽幼稚園及び津波による甚大な被害を受けた葦の芽星谷幼稚園の2校については、葦の芽星谷幼稚園は平成23年度内に復旧完了し、葦の芽幼稚園は平成24年度内に復旧完了した。

② 公立社会教育施設（公立社会体育施設と公立文化施設を含む）

<気仙沼市立社会教育施設>

東日本大震災により被災した市立社会教育施設のうち、公立社会教育施設の災害復旧に係る国庫補助に申請し、または申請予定の16施設について、以下のとおり、早期の復旧を目指す。

○ 比較的軽微な被害に留まる 8 施設については、平成 25 年度に復旧完了した。また、応急仮設住宅に用地を提供している 2 施設については、応急仮設住宅の用途が終了後、速やかに復旧を実施する。

○ 甚大な被害を受け、隣接地への移転も含めた総合的な検討が必要となった気仙沼図書館については、市の復興計画を踏まえ復旧に着手する。

○ 津波による浸水及び流失の被害を受けた、中央公民館、中央公民館体育館、鹿折公民館、小泉公民館については、新たな街区配置等の推移を見ながら施設の復旧計画を策定し、平成 30 年度までの復旧完了を目標とする。また、津波により流失した気仙沼市南運動広場については、市の復興計画を踏まえ、今後整備を進める。

8. 土砂災害対策

① 所名：大洞沢^{おおほらさわ}2

② 地盤が緩み少量の降雨でも崩壊等が発生するおそれがあり、重要な保全対象を有している大洞沢^{おおほらさわ}2の土砂災害対策について完了。

③ 最大震度6弱を観測した気仙沼市では、地震により地盤が脆弱になっている可能性が高く、降雨による土砂災害の危険性が通常よりも高いと考えられるため、県と気象台が連携し、平成23年3月より土砂災害警戒情報の発表基準を引き下げて運用していたが、降雨と土砂災害発生状況を考慮して基準を見直し、平成25年5月に通常基準への引き上げを実施。

④ 平成25年度における成果

○大洞沢^{おおほらさわ}2

重要な保全対象を有している地区の緊急的な土砂災害対策を完了。

9. 災害廃棄物の処理

① 推計量について

東日本大震災においては、地震による大規模な津波及び地震による建物の倒壊等により膨大な量の災害廃棄物等約 2,016 千トン（災害廃棄物が約 1,114 千トン、津波堆積物が約 902 千トン）発生。


② 搬入状況について

現在住民が生活している場所の近くの災害廃棄物については、平成 23 年 8 月までに仮置場へ概ね搬入した。その他の災害廃棄物（損壊家屋等の解体により生じる災害廃棄物を含む。）、津波堆積物についても、平成 26 年 3 月末までに仮置場への搬入は完了した。

③ 処理状況と処理完了目標について

平成 26 年 3 月末までに、災害廃棄物等約 2,016 千トン（災害廃棄物が約 1,114 千トン、津波堆積物が約 902 千トン）の処理をすべて完了した。

復興施策の工程表(気仙沼市)

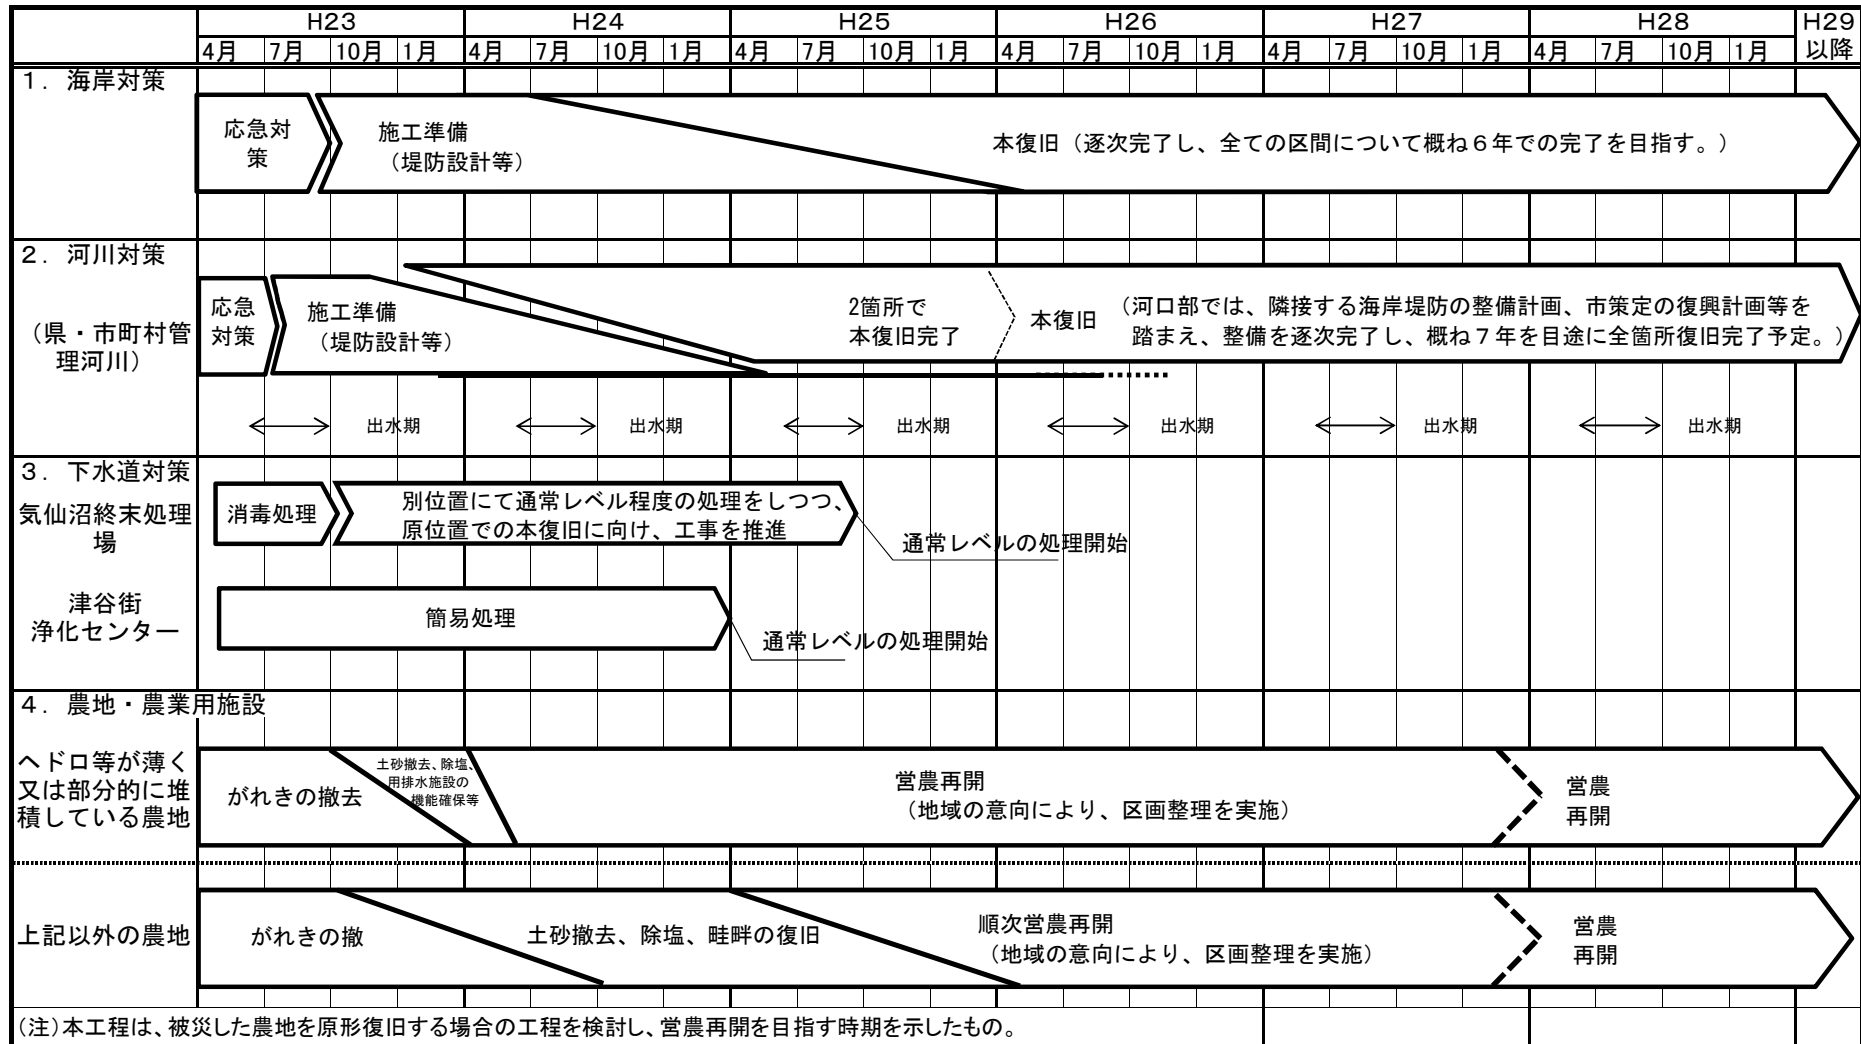

＜私立学校＞ 比較的軽微な被害に留まる学校の復旧	校舎等の本格復旧
甚大な被害を受けた学校の復旧	校舎等の本格復旧
公立社会教育施設（公立社会体育施設・公立文化施設を含む） ＜市立社会教育施設＞	
比較的軽微な被害に留まる社会教育施設の復旧	施設の本格復旧
甚大な被害を受けた社会教育施設の復旧	施設の本格復旧
	※津波による被害を受けた中央公民館、中央公民館体育館、鹿折公民館、小泉公民館、気仙沼市南運動広場については、平成３０年度までの復旧を目標とする。
8. 土砂災害対策	土砂災害危険箇所の点検等 緊急的な土砂災害対策の実施
	(※) 土砂災害警戒情報の発表基準を引き下げて運用していたが、平成２５年５月に通常基準への引き上げを実施。
9. 災害廃棄物等の処理	
	(住民が生活している場所の近くの災害廃棄物の撤去)
	(その他の災害廃棄物等の仮置場への搬入)
	(中間処理・最終処分)
