

# 事業計画（岩手県久慈市）

## 1. 海岸対策

### ①海岸の状況

市内の地区海岸数	7 地区海岸
被災した地区海岸数	6 地区海岸
応急対策を実施した地区海岸数	2 地区海岸
本復旧を実施する地区海岸数	6 地区海岸
復興を実施する地区海岸	1 地区海岸

### ②堤防高

平成 23 年 9 月 26 日及び 10 月 20 日に堤防高を公表<sup>※</sup>。

久慈湾：T.P. 8.0m（対象津波：昭和三陸地震（東日本大震災））

久慈南海岸：T.P. 12.0m（対象津波：昭和三陸地震）

野田湾：T.P. 14.0m（対象津波：昭和三陸地震）

※ 公表した堤防高を基本に、環境保全、周辺環境との調和、経済性、維持管理の容易性、施工性、公衆の利用等を総合的に考慮して決定する。

### ③復旧・復興の予定

復旧する施設の概要計画については、平成 24 年 3 月までに策定済み。

これに基づく本復旧工事については、平成 23 年 6 月より順次工事に着手し、平成 28 年度での完了を目指す。

復興する施設の概要計画については、平成 25 年 12 月までに策定済み。

これに基づく復興工事については、平成 27 年度より順次工事に着手し、概ね平成 27 年度での完了を目指す。

### ④平成 26 年度における成果

- ・全ての本復旧工事において事業の進捗を図った。

### ⑤平成 27 年度の成果目標（集中復興期間の成果目標）

- ・新たに、3 地区海岸において本復旧工事の完了を目指す。（累計 4 地区海岸）
- ・全ての復興工事で着工を目指す。（累計 1 地区海岸）

### ⑥事業完了予定年度

概ね平成 28 年度での事業完了を目指す。

⑦その他

- ・ 地区海岸毎の計画等については別添一覧表に記載。

## 海岸保全施設の復旧・復興にかかる事業計画

市町村	地区海岸名	堤防護岸延長 (m)	主な施設	施設の高さ (T.P)		応急 対策	復旧・復興の予定						H26年度の 実施内容等	H27年度の 実施内容等	その他の場合に詳細を 記載	備考	
				被災前 現況高 (m)	被災後 復旧高 (m)		概要計 画策定	詳細計 画策定	左記の 実施状 況	工事 着工	左記の 実施状 況	工事 完了					左記の 実施状 況
久慈市	久喜漁港	1,219	護岸、防潮堤、水門、陸閘、離岸堤	12.00	14.00	完了	H23.12	H24.7	策定済み	H23.6	着工済み	H29.3	完了予定	本工事	本工事		復旧
久慈市	久慈湊漁港	1,305	防潮堤、水門	8.00	8.00	完了	H24.3	H26.3	策定済み	H25.7	着工済み	H28.3	完了予定	本工事	本工事		復旧
久慈市	小袖漁港	278	防潮堤、水門、陸閘	10.00	12.00	—	H24.3	H26.3	策定済み	H26.3	着工済み	H28.3	完了予定	本工事	本工事		復旧
久慈市	久慈港半崎	238	離岸堤	1.50	1.50	—	H23.9	H23.12	策定済み	H24.2	着工済み	H24.10	完了済み				復旧
久慈市	久慈港諏訪下	2,816	堤防、胸壁、その他(陸閘)	7.30	8.00	—	H23.11	H26.6	策定済み	H25.3	着工済み	H28.3	完了予定	本工事	本工事		復旧
久慈市	久慈港玉の脇	395	離岸堤	2.78	2.78	—	H23.8	H23.12	策定済み	H24.2	着工済み	H24.10	完了済み				復旧
久慈市	久喜漁港	562	陸閘 2基	12.00	14.00	—	H25.12	H26.10	策定中	H27.5	着工予定	H28.3	完了予定	詳細設計	詳細設計		復興

## 2. 河川対策

### 【県・市町村管理区間】

① 2級水系久慈川水系など ※<sup>1</sup>の県・市管理区間では、全箇所<sup>※2</sup>の災害査定を完了し、2箇所<sup>※2</sup>で災害復旧事業を予定。

本復旧については、平成 24 年度内に、設計、地元調整等の施工準備が整った1箇所で着手し、完了済み。

②残る1箇所については、平成 25 年度に他事業との調整により廃工とした。

③平成 25 年度までの成果

- ・ 全箇所（2箇所）で災害査定を完了
- ・ 1箇所<sup>※2</sup>で本復旧を完了
- ・ 1箇所<sup>※2</sup>で他事業との調整により廃工（累計全2箇所）

※1 位置図を参照

※2 一連区間の取扱い方等により、箇所数は変動しうる

# 復興施策の事業計画 参考図面 河川 久慈市



### 3. 下水道対策

#### 【災害復旧事業】

①箇所名：久慈浄化センター

②久慈浄化センターは、平成 24 年 6 月に復旧を完了。

#### 【復興交付金事業】

①箇所名：久慈湊・大崎地区、元木沢地区污水管渠

②漁業集落防災強化事業における復興まちづくりにあわせた管渠整備。

③平成 26 年度における成果

平成 26 年 8 月に管渠整備を完了。

## 4. 農地・農業用施設

### ①被災状況

津波により 4 haの農地及び農業用施設に甚大な被害

### ②農地の復旧状況

平成 24 年度までに復旧を完了した。

○平成 24 年度から営農が可能な農地 4 ha

### ③区画整理等の実施状況

宇部川地区において、区画整理を実施しているところ。

## 5. 海岸防災林の再生

①箇所名：夏井町大湊、湊町湊

②被災状況

津波により森林 3.25ha が流失した。

③事業計画の内容

被災した森林については、防災林造成事業により整備する。

④これまでの実施状況と今後の予定

久慈市復興計画等の論議を踏まえて再生方針を決定した。

森林の復旧については、平成 25 年度に着手し、平成 28 年度の完了を目指す。

⑤平成 25 年度における成果

防災林造成事業：植栽工 0.42ha、護岸工 289m の復旧を実施（大湊地区）

⑥平成 26 年度における成果

湊地区は、防潮堤敷として久慈市へ所管替えとなり復旧を中止した。

防災林造成事業：林帯地盤の盛土 3,099m<sup>3</sup>（大湊地区）

⑦平成 27 年度の成果目標（集中復興期間の成果目標）

防災林造成事業：林帯地盤造成の完了（大湊地区）

⑧事業完了予定年度

平成 28 年度（大湊地区）

（保全対象：国道 45 号線、県道、病院等）



## 6. 漁港

### ①被害状況

漁港数：10 漁港

被災漁港数：10 漁港

### ②スケジュール

久慈市内の各被災 10 漁港において、平成 24 年度末時点で、全延長の陸揚げ機能が回復している。

また、その他の漁港施設の復旧も平成 25 年度までに完了している。

## 7. 復興まちづくり

公立社会教育施設（公立社会体育施設と公立文化施設を含む）

<久慈市立社会教育施設>

①箇所名：久慈市立地下水族科学館（通称「もぐらんぴあ」、以下「施設」という。）は、平成6年4月、国家地下石油備蓄基地の作業用トンネルを活用して開館し、全国初の地下にある水族館として人気を博した。全国科学館連絡協議会及び岩手県博物館等連絡協議会に加盟しており、久慈広域圏のほか、八戸市を含む青森県南の園児や児童の学習・見学者も多く、平成22年5月には入館者150万人を達成した。

当該施設が、先般の東日本大震災により被災し全壊したことから、公立社会教育施設の災害復旧に係る国庫補助及び復興交付金等を活用し、以下のとおり早期復旧を目指す。本施設の復旧に当たっては、複数の避難路の確保など入館者の安全対策に万全を期することとする。

地下トンネル内の水生生物展示施設（水族館）については、被災前の姿に戻す原形復旧とするが、防潮扉の設置やトンネル内の避難通路の設置など、入館者の避難誘導の強化に努めることとする。

地上部分の管理棟については、被災前の2階建から今回の復旧・復興事業で5階建にし、構造的にも大きな衝撃に耐えられる部材（RC造）を使用し、安全防災機能を強化した施設を建設する。

また、本施設は、被災前には日本地下石油備蓄基地株式会社久慈事業所の展示施設である「石油文化ホール」と一体となり管理・運営していたものであり、復旧に際しては両者で協議しながら進めることとする。

資材・労務単価の上昇により、着工までに期間を有したが、平成26年9月に主体工事及びトンネル内工事について着工し、平成27年11月までに事業が完了する予定である。

## 8. 災害廃棄物の処理

### ①推計量について

東日本大震災においては、地震による大規模な津波及び地震による建物の倒壊等により膨大な量の災害廃棄物等約 90 千トン（災害廃棄物が約 76 千トン、津波堆積物が約 14 千トン）発生した。

### ②搬入状況について

住民が生活している場所の近くの災害廃棄物については、平成 23 年 7 月末までに仮置場へ概ね搬入した。その他の災害廃棄物（損壊家屋等の解体により生じた災害廃棄物を含む。）、津波堆積物についても、平成 24 年 3 月末までに仮置場への搬入は完了した。

### ③処理状況について

平成 26 年 3 月末までに、災害廃棄物等約 90 千トン（災害廃棄物が約 76 千トン、津波堆積物が約 14 千トン）の処理をすべて完了した。

## 9. 都市公園

### 【復興関係】

①地区名：久慈市総合防災公園

②社会資本整備総合交付金（復興枠）を活用して、平成 25 年度から都市公園事業に着手。

③平成 26 年度における成果

平成 26 年 2 月に都市計画公園として都市計画決定し、平成 26 年度に用地補償調査・実施設計業務が完了し、平成 27 年 2 月に用地取得に着手している。

④平成 27 年度の成果目標（集中復興期間の成果目標）

平成 27 年度末までに工事着手する。


⑤事業完了予定年度

平成 31 年度予定

⑥事業完了予定年度

平成 31 年度予定

# 復興施策の工程表(岩手県久慈市)

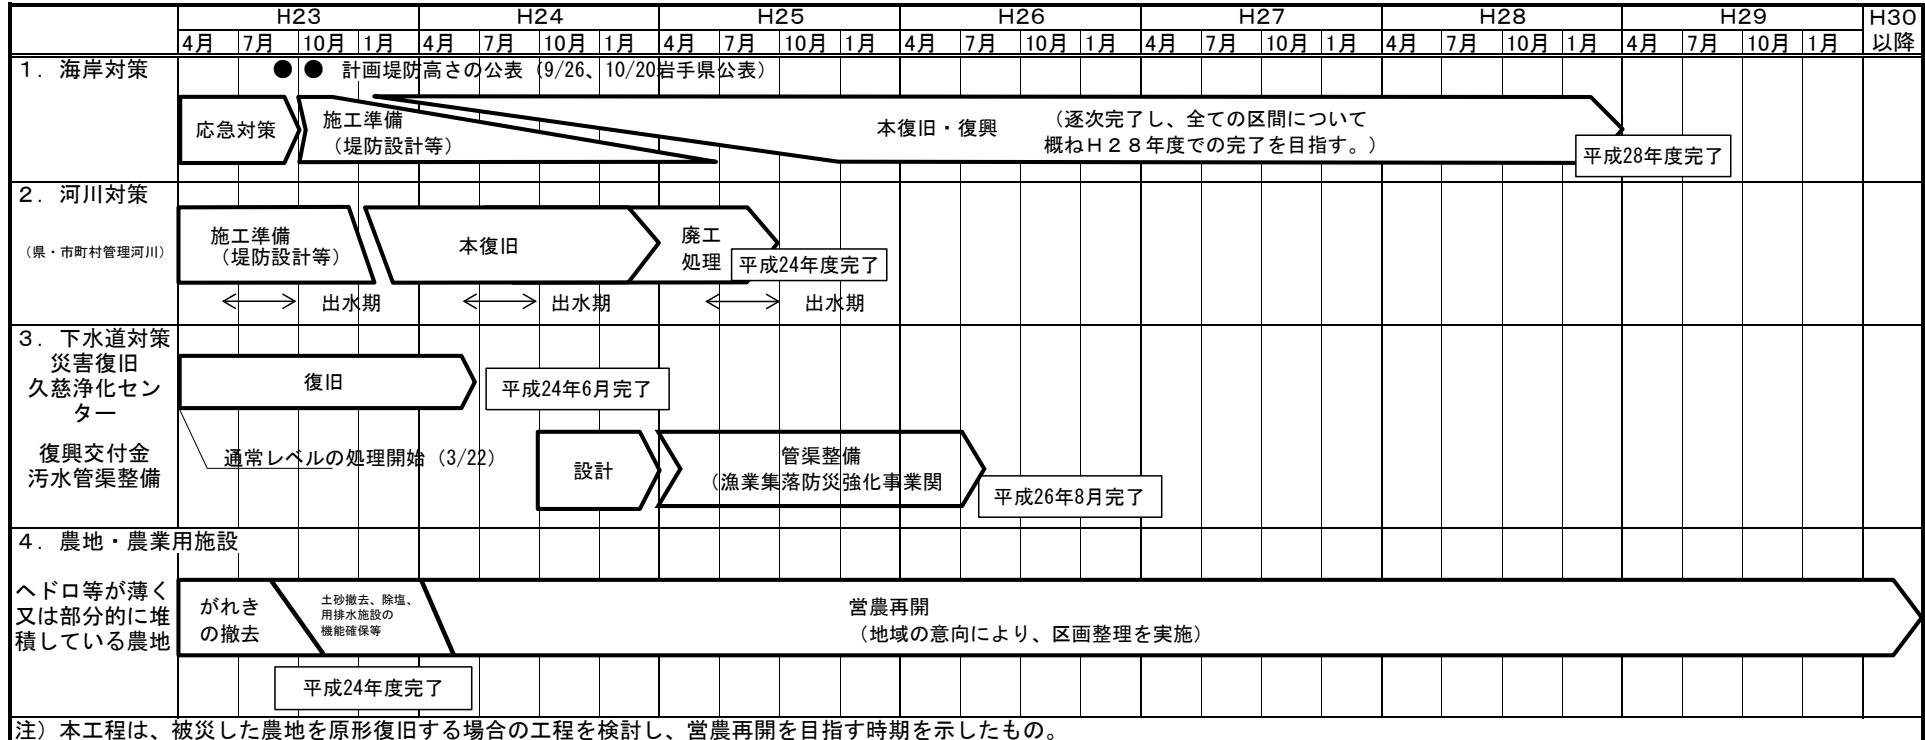

注)本工程は、被災した農地を原形復旧する場合の工程を検討し、営農再開を目指す時期を示したもの。

