

# 復興施策の事業計画（岩手県野田村）

## 1. 海岸対策

### ①海岸の状況

|                |        |
|----------------|--------|
| 村内の地区海岸数       | 6 地区海岸 |
| 被災した地区海岸数      | 5 地区海岸 |
| 応急対策を実施した地区海岸数 | 1 地区海岸 |
| 本復旧を実施する地区海岸数  | 5 地区海岸 |
| 復興を実施する地区海岸    | 3 地区海岸 |

### ②堤防高

平成 23 年 9 月 26 日に堤防高を公表※。

野田湾：T. P. 14. 0m（対象津波：昭和三陸地震）

※ 公表した堤防高を基本に、環境保全、周辺環境との調和、経済性、維持管理の容易性、施工性、公衆の利用等を総合的に考慮して決定する。

### ③復旧・復興の予定

復旧する施設の概要計画については、平成 23 年 12 月までに策定済み。

これに基づく本復旧工事については、平成 24 年 2 月より順次工事に着手し、平成 27 年度で完了を目指す。

復興する施設の概要計画については、平成 26 年 4 月までに策定済み。

これに基づく復興工事については、平成 25 年 3 月より順次工事に着手し、概ね平成 28 年度での完了を目指す。

### ④平成 26 年度における成果

- ・ 全ての本復旧工事において事業の進捗を図った。
- ・ 全ての復興工事に着工した。（累計 3 地区海岸）

### ⑤平成 27 年度以降の成果目標（集中復興期間の成果目標）

- ・ 全ての本復旧工事で完了を目指す。（累計 5 地区海岸）
- ・ 新たに、2 地区海岸で復興工事の完了を目指す。（累計 2 地区海岸）

### ⑥事業完了予定年度

概ね平成 28 年度での完了を目指す。

### ⑦その他

- ・ 地区海岸毎の計画等については別添一覧表に記載。

# 海岸保全施設の復旧・復興にかかる事業計画

| 市町村 | 地区海岸名        | 堤防護岸<br>延長<br>(m) | 主な施設                       | 施設の高さ (T.P)       |                   | 応急<br>対策 | 復旧・復興の予定   |            |                 |          |                 |          | H26年度の<br>実施内容等 | H27年度の<br>実施内容等 | その他の場合に詳細を<br>記載 | 備考  |                 |
|-----|--------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|----------|------------|------------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|------------------|-----|-----------------|
|     |              |                   |                            | 被災前<br>現況高<br>(m) | 被災後<br>復旧高<br>(m) |          | 概要計<br>画策定 | 詳細計<br>画策定 | 左記の<br>実施状<br>況 | 工事<br>着工 | 左記の<br>実施状<br>況 | 工事<br>完了 |                 |                 |                  |     | 左記の<br>実施状<br>況 |
| 野田村 | 野田(農振局)      | 677               | 堤防、排水樋門                    | 12.00             | 12.00             | —        | H23.11     | H23.11     | 策定済み            | H24.2    | 着工済み            | H24.8    | 完了済み            |                 |                  |     | 復旧              |
| 野田村 | 広内           | 209               | 防潮堤、水門、陸閘                  | 12.00             | 14.00             | —        | H23.10     | H26.6      | 策定済み            | H25.7    | 着工済み            | H28.3    | 完了予定            | 本工事             |                  | 本工事 | 復旧              |
| 野田村 | 野田(水国土局)     | 683               | 防潮堤、水門                     | 7.80              | 14.00             | —        | H23.9      | H23.12     | 策定済み            | H24.3    | 着工済み            | H25.3    | 完了済み            |                 |                  |     | 復旧              |
| 野田村 | 米田           | 365               | 防潮堤、水門                     | 12.00             | 14.00             | —        | H23.12     | H26.6      | 策定済み            | H24.8    | 着工済み            | H28.3    | 完了予定            | 本工事             |                  | 本工事 | 復旧              |
| 野田村 | 野田玉川         | 65                | 防潮堤、水門                     | 12.00             | 12.00             | 完了       | H23.10     | H23.12     | 策定済み            | H24.4    | 着工済み            | H25.5    | 完了済み            |                 |                  |     | 復旧              |
| 野田村 | 野田<br>(水国土局) | 無堤                | 防潮堤 357m<br>水門 1基<br>陸閘 2基 | 0.00              | 14.00             | —        | H23.12     | H26.6      | 策定中             | H25.3    | 着工済み            | H28.3    | 完了予定            | 本工事             |                  | 本工事 | 復興              |
| 野田村 | 野田<br>(農振局)  | 677               | 防潮堤 677m<br>水門 1基<br>陸閘 1基 | 7.80              | 12.00             | —        | H26.4      | H26.4      | 策定済み            | H26.4    | 着工済み            | H29.3    | 完了予定            | 本工事             |                  | 本工事 | 復興              |
| 野田村 | 米田           | 無堤                | 防潮堤 449m                   | 0.00              | 14.00             | —        | H23.12     | H26.6      | 策定中             | H26.7    | 着工済み            | H28.3    | 完了予定            | 本工事             |                  | 本工事 | 復興              |

## 2. 河川対策

### 【県・市町村管理区間】

- ① 2級水系宇部川水系など※<sup>1</sup>の県・村管理区間では、全箇所の災害査定を完了し、4箇所※<sup>2</sup>で災害復旧事業を予定。

本復旧については、平成26年度内に4箇所全て完了。

### ②平成26年度までの成果

- ・ 4箇所で本復旧を完了

※1 位置図を参照

※2 一連区間の取扱い方等により、箇所数は変動しうる



復興施策の事業計画 参考図面 河川 野田村

図面：岩手県提供





### 3. 下水道対策

#### 【災害復旧事業】

①箇所名：野田浄化センター

②平成 24 年 7 月に通常レベルの処理を開始し、平成 24 年 10 月に復旧を完了。

#### 【復興交付金事業】

①箇所名：米田・南浜、城内地区污水管渠

②都市再生区画整理・防災集団移転促進の各事業における復興まちづくりにあわせ  
た管渠整備。

③平成 26 年度の成果

平成 27 年 3 月に米田・南浜地区防災集団移転促進事業に係る污水管渠整備完了。


④平成 27 年度の成果目標（集中復興期間の成果目標）

城内地区の管渠整備は都市再生区画整理事業の進捗に併せて引き続き整備を進  
め、平成 27 年度完了を目指す。

⑤事業完了予定年度

平成 27 年度

## (参考)下水処理場 位置図

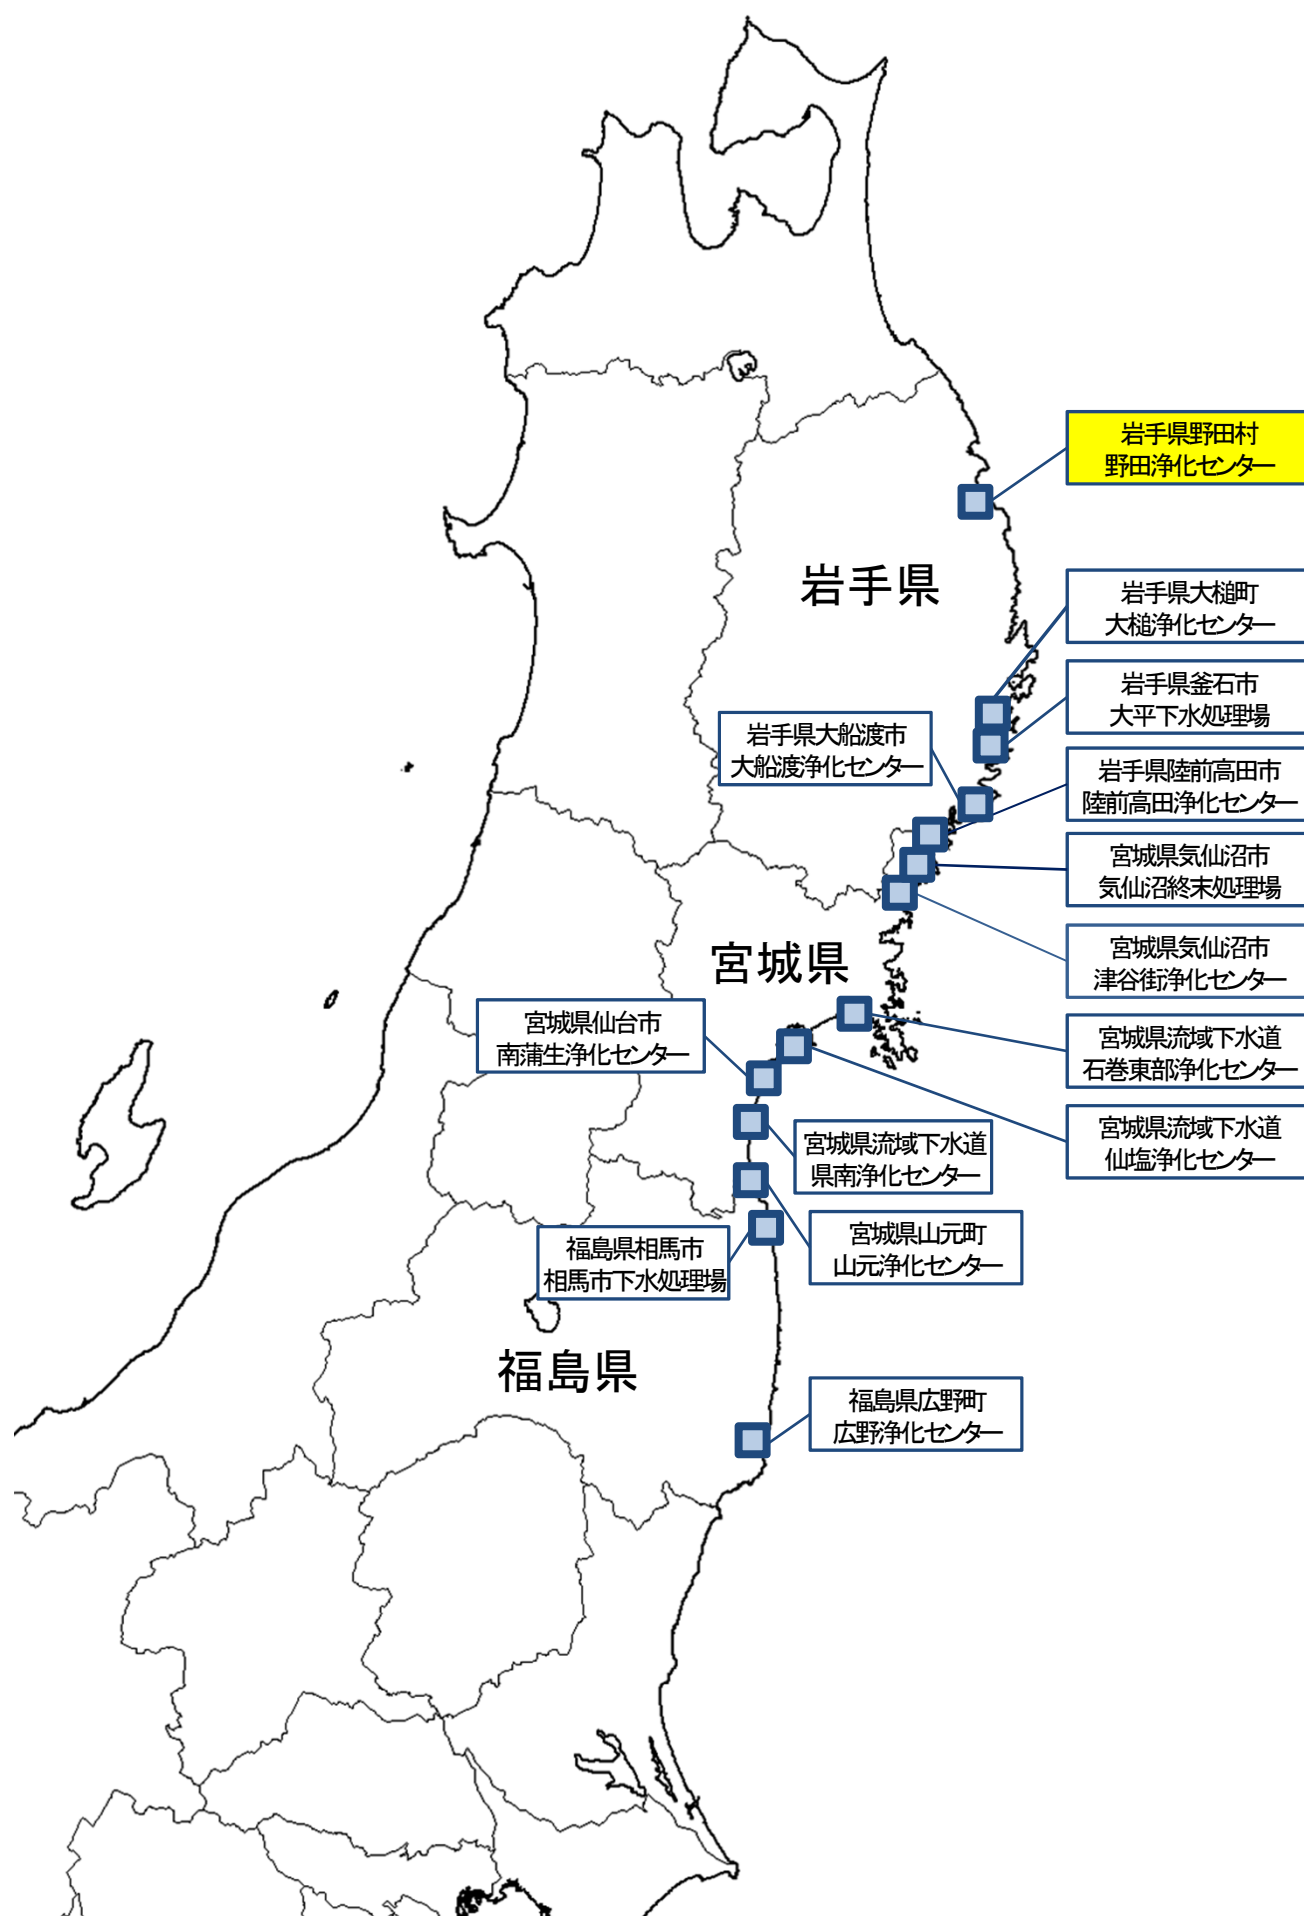

## 4. 農地・農業用施設

### ①被災状況

津波により50haの農地及び農業用施設に甚大な被害

### ②農地の復旧状況

平成 24 年度までに復旧を完了した。

○平成 23 年度から営農が可能な農地 1 ha

○平成 24 年度から営農が可能な農地 46ha

### ③区画整理等の実施状況

宇部川地区において、区画整理を実施しているところ。

## 5. 海岸防災林

①箇所名： 野田前浜

②被災状況

津波により防潮堤 1,350mが被災（うち 840m が倒壊）した。また、森林 12.15ha が流失した。

③事業計画の内容

被災した防潮堤（1,350m）については、治山施設災害復旧事業により復旧する。  
被災した森林については、防災林造成事業で整備する。

④これまでの実施状況と今後の予定

被災した防潮堤のうち、倒壊区間（840m）の応急対策は平成 23 年度に完了した。  
防潮堤の復旧工事については、平成 24 年度に着手し、平成 27 年度に完了させる。  
森林の復旧については、防潮堤の復旧が完了した箇所について、平成 28 年度から順次、植栽を実施し、全体の復旧については、平成 30 年度の完了を目指す。

⑤平成 26 年度における成果

治山施設災害復旧事業： 防潮堤 850mの復旧を実施。

⑥平成 27 年度の成果目標（集中復興期間の成果目標）

治山施設災害復旧事業： 防潮堤 1,338mの復旧を実施。

⑦事業完了予定年度

平成 30 年度

（保全対象： 国道 45 号線、三陸鉄道北リアス線、村道等）



## 6. 漁港

### ①被害状況

漁港数：3 漁港

被災漁港数：3 漁港

### ②スケジュール

野田村内の各被災3 漁港において、平成 24 年度末時点で、全延長の陸揚げ機能が回復している。

また、その他の漁港施設の復旧も平成 25 年度までに完了している。

## 7. 復興まちづくり

### (1) 学校施設等

#### ① 幼稚園・小中高等学校等

##### (i) 公立学校

###### <野田村立学校>

東日本大震災により被災した村立学校のうち、公立学校施設の災害復旧に係る国庫補助に申請した2校について、以下のとおり復旧完了した。

- 甚大な被害を受けた野田小学校、野田中学校の2校の設備（スクールバス）については、平成23年度に事業着手し、復旧完了した。

#### ② 公立社会教育施設（公立社会体育施設と公立文化施設を含む）

##### <野田村立社会教育施設>

東日本大震災により被災した村立社会教育施設のうち、公立社会教育施設の災害復旧に係る国庫補助に申請した2施設について、以下のとおり復旧完了した。

- 甚大な被害を受けた野田村生涯学習センター（野田村図書館併設）、野田村体育館の2施設については、平成23年度に事業着手し、復旧完了した。

## 8. 災害廃棄物の処理

### ①推計量について

東日本大震災においては、地震による大規模な津波及び地震による建物の倒壊等により膨大な量の災害廃棄物等約 167 千トン（災害廃棄物が約 121 千トン、津波堆積物が約 46 千トン）発生した。

### ②搬入状況について

住民が生活している場所の近くの災害廃棄物については、平成 23 年 8 月中に仮置場へ概ね搬入した。その他の災害廃棄物（損壊家屋等の解体により生じた災害廃棄物を含む。）、津波堆積物についても、平成 24 年 12 月末までに仮置場への搬入は完了した。

### ③処理状況について


平成 26 年 3 月末までに、災害廃棄物等約 167 千トン（災害廃棄物が約 121 千トン、津波堆積物が約 46 千トン）の処理をすべて完了した。

## 9. 都市公園

### 【復興関係】

- ①地区名：城内、泉沢、南浜、米田地区
- ②東日本大震災復興交付金を活用して、平成 23 年度から都市公園事業に着手。
- ③平成 26 年度における成果  
全地区について、平成 25 年 1 月に津波防災緑地公園として都市計画決定し、平成 25 年 5 月に用地取得及び工事に着手している。
- ④平成 27 年度の成果目標（集中復興期間の成果目標）  
全地区について、平成 28 年度の事業完了に向けて着実に工事を進めていく。
- ⑤事業完了予定年度  
平成 28 年度予定

# 復興施策の工程表(岩手県野田村)

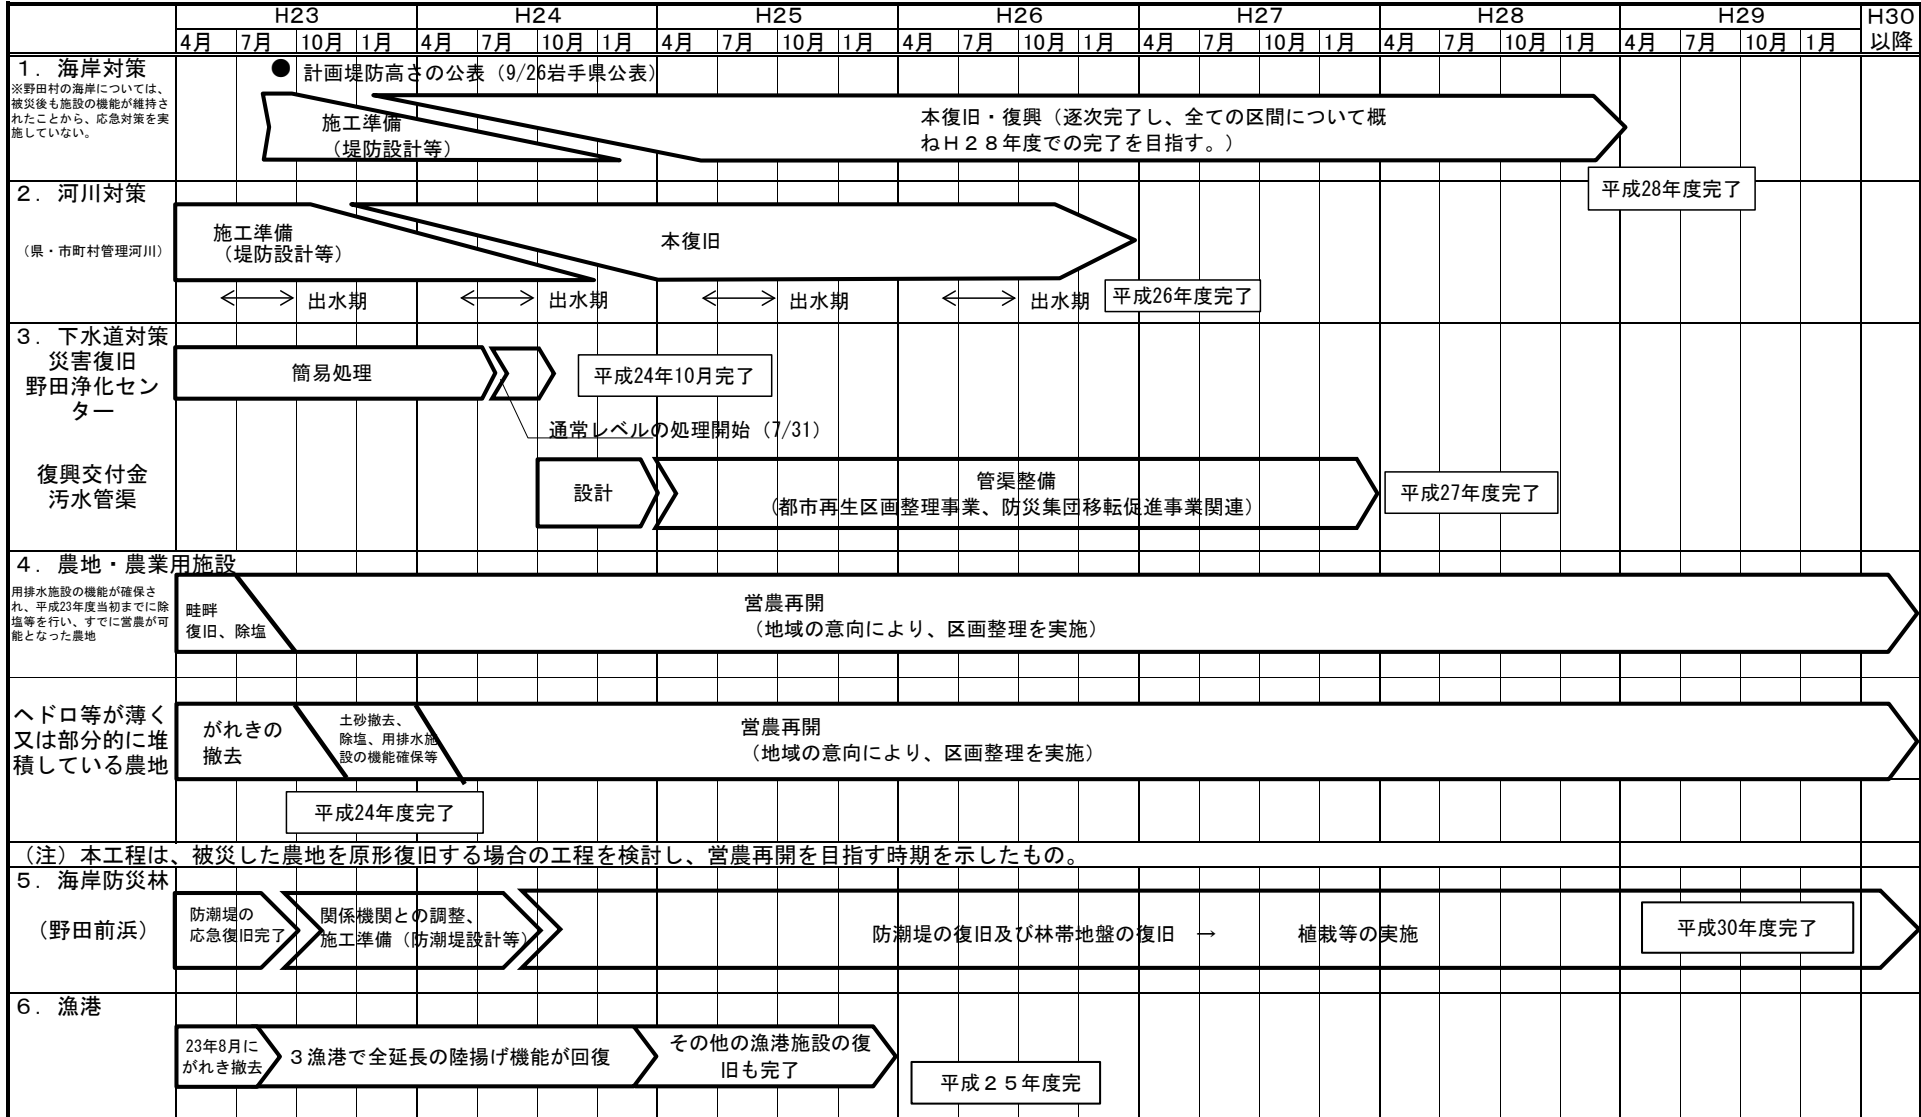



|                                                                                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>7. 復興まちづくり<br/>         (1) 学校施設等<br/>         ○幼稚園・小中高等学校等<br/>         &lt;市立学校&gt;<br/>         比較的軽微な被害に留まる学校の復旧</p> |  |
| <p>○公立社会教育施設（公立社会体育施設・公立文化施設を含む）<br/>         &lt;市立社会教育施設&gt;<br/>         大きな被害を受けた社会教育施設の復旧</p>                          |  |
| <p>8. 災害廃棄物等の処理</p>                                                                                                         |  |
| <p>9. 都市公園（復興）</p>                                                                                                          |  |
