

# 事業計画（岩手県大船渡市）

## 1. 海岸対策

### ①海岸の状況

|                |         |
|----------------|---------|
| 市内の地区海岸数       | 23 地区海岸 |
| 被災した地区海岸数      | 23 地区海岸 |
| 応急対策を実施した地区海岸数 | 7 地区海岸  |
| 本復旧を実施する地区海岸数  | 23 地区海岸 |
| 復興を実施する地区海岸    | 8 地区海岸  |

### ②堤防高

平成 23 年 9 月 26 日及び 10 月 20 日に堤防高を公表<sup>※1</sup>。

吉浜湾 : T. P. 14. 3m (対象津波 : 想定宮城県沖地震)

越喜来湾 : T. P. 11. 5m (対象津波 : 昭和三陸地震)

綾里湾 : T. P. 7. 9m (対象津波 : 想定宮城県沖地震)

大船渡湾外洋 : T. P. 14. 1m (対象津波 : 昭和三陸地震)

大船渡湾 : T. P. 7. 5m<sup>※2</sup> (対象津波 : 明治三陸地震)

大野湾 : T. P. 12. 8m (対象津波 : 昭和三陸地震)

※1 公表した堤防高を基本に、環境保全、周辺環境との調和、経済性、維持管理の容易性、施工性、公衆の利用等を総合的に考慮して決定する。

※2 平成 24 年 10 月 26 日に堤防高の変更を公表。(T. P. 7. 2m→T. P. 7. 5m)

### ③復旧の予定

復旧する施設の概要計画については、平成 25 年 5 月までに策定済み。

これに基づく本復旧工事については、平成 24 年 9 月より順次工事に着手し、平成 29 年度での完了を目指す。

復興する施設の概要計画については、平成 25 年 5 月までに策定済み。

これに基づく復興工事については、平成 26 年 3 月より順次工事に着手し、概ね平成 30 年度での完了を目指す。

### ④平成 26 年度における成果

- ・新たに、3 地区海岸において本復旧工事に着工した。(累計 20 地区海岸)
- ・全ての地区海岸で復興工事の事業進捗を図った。

### ⑤平成 27 度の成果目標（集中復興期間の成果目標）

- ・全ての地区海岸で本復旧工事の着工を目指す。(累計 23 地区海岸)
- ・全ての地区海岸で復興工事の着工を目指す。(累計 8 地区海岸)

⑥事業完了予定年度

概ね平成 30 年度での事業の完了を目指す。

⑦ その他

- ・ 地区海岸毎の計画等については別添一覧表に記載。

## 海岸保全施設の復旧・復興にかかる事業計画

| 市町村  | 地区海岸名 | 堤防護岸延長<br>(m) | 主な施設        | 施設の高さ (T.P)   |                | 応急対策 | 復旧・復興の予定 |        |         |        |         |        | H26年度の実施内容等 | H27年度の実施内容等    | その他の場合に詳細を記載 | 備考 |         |
|------|-------|---------------|-------------|---------------|----------------|------|----------|--------|---------|--------|---------|--------|-------------|----------------|--------------|----|---------|
|      |       |               |             | 被災前現況高<br>(m) | 被災後復旧高<br>(m)  |      | 概要計画策定   | 詳細計画策定 | 左記の実施状況 | 工事着工   | 左記の実施状況 | 工事完了   |             |                |              |    | 左記の実施状況 |
| 大船渡市 | 合足    | 219           | 堤防、排水樋門     | 9.00          | 14.10          | 完了   | H23.12   | H25.3  | 策定済み    | H25.3  | 着工済み    | H29.3  | 完了予定        | 本工事            | 本工事          |    | 復旧      |
| 大船渡市 | 沖田    | 160           | 護岸堤         | 4.50          | (14.30)<br>4.5 | —    | H23.12   | H24.11 | 策定済み    | H24.9  | 着工済み    | H25.6  | 完了済み        |                |              |    | 復旧      |
| 大船渡市 | 吉浜    | 570           | 堤防、離岸堤、排水樋門 | 7.15          | 7.15           | 完了   | H23.12   | H25.3  | 策定済み    | H25.3  | 着工済み    | H29.3  | 完了予定        | 本工事            | 本工事          |    | 復旧      |
| 大船渡市 | 崎浜漁港  | 418           | 防潮堤、水門、陸閘   | 7.90          | 11.50          | —    | H24.3    | H26.3  | 策定済み    | H25.9  | 着工済み    | H28.3  | 完了予定        | 本工事            | 本工事          |    | 復旧      |
| 大船渡市 | 越喜来漁港 | 242           | 防潮堤、水門、陸閘   | 7.90          | 11.50          | —    | H24.5    | H26.3  | 策定済み    | H25.3  | 着工済み    | H28.3  | 完了予定        | 本工事            | 本工事          |    | 復旧      |
| 大船渡市 | 綾里漁港  | 641           | 防潮堤、水門、陸閘   | 7.90          | 11.60          | —    | H25.5    | H26.9  | 策定済み    | H27.6  | 着工予定    | H30.3  | 完了予定        | 地権者等との調整       | 地権者等との調整     |    | 復旧      |
| 大船渡市 | 大船渡漁港 | 1,546         | 防潮堤、水門、陸閘   | 3.40          | 7.50           | —    | H25.2    | H26.3  | 策定済み    | H25.12 | 着工済み    | H29.3  | 完了予定        | 本工事            | 本工事          |    | 復旧      |
| 大船渡市 | 門の浜漁港 | 1,536         | 防潮堤、水門、陸閘   | 8.50          | 12.80          | 完了   | H24.7    | H26.3  | 策定済み    | H25.7  | 着工済み    | H29.3  | 完了予定        | 本工事            | 本工事          |    | 復旧      |
| 大船渡市 | 吉浜漁港  | 171           | 防潮堤、水門、陸閘   | 7.15          | 7.15           | —    | H24.7    | H26.3  | 策定済み    | H26.3  | 着工済み    | H28.3  | 完了予定        | 本工事            | 本工事          |    | 復旧      |
| 大船渡市 | 泊漁港   | 235           | 防潮堤、水門、陸閘   | 7.90          | 11.50          | 完了   | H24.7    | H26.3  | 策定済み    | H26.3  | 着工済み    | H28.3  | 完了予定        | 本工事            | 本工事          |    | 復旧      |
| 大船渡市 | 鬼沢漁港  | 111           | 護岸          | 4.30          | 4.30           | —    | H23.11   | H23.12 | 策定済み    | H25.11 | 着工済み    | H26.12 | 完了済み        | 本工事            | 本工事          |    | 復旧      |
| 大船渡市 | 小石浜漁港 | 156           | 防潮堤、水門、陸閘   | 6.80          | 11.50          | —    | H24.7    | H26.3  | 策定済み    | H26.5  | 着工済み    | H28.3  | 完了予定        | 本工事            | 本工事          |    | 復旧      |
| 大船渡市 | 野野前漁港 | 519           | 防潮堤、水門、陸閘   | 7.90          | 7.90           | —    | H24.7    | H26.3  | 策定済み    | H26.6  | 着工済み    | H28.3  | 完了予定        | 本工事            | 本工事          |    | 復旧      |
| 大船渡市 | 蛸ノ浦漁港 | 1,324         | 防潮堤、水門、陸閘   | 3.50          | 7.50           | —    | H25.5    | H26.10 | 策定中     | H27.6  | 着工予定    | H28.3  | 完了予定        | 地権者等との調整       | 地権者等との調整     |    | 復旧      |
| 大船渡市 | 碁石漁港  | 177           | 防潮堤、水門、陸閘   | 8.00          | 8.00           | —    | H24.9    | H26.10 | 策定中     | H27.3  | 着工済み    | H28.3  | 完了予定        | 背後の復興計画の策定・調整等 | 本工事          |    | 復旧      |
| 大船渡市 | 泊里漁港  | 282           | 防潮堤、水門、陸閘   | 6.30          | 12.80          | 完了   | H24.9    | H26.10 | 策定中     | H27.6  | 着工予定    | H28.3  | 完了予定        | 地権者等との調整       | 地権者等との調整     |    | 復旧      |
| 大船渡市 | 越喜来   | 948           | 防潮堤、水門      | 7.90          | 11.50          | 完了   | H23.9    | H26.6  | 策定中     | H25.2  | 着工済み    | H28.3  | 完了予定        | 本工事            | 本工事          |    | 復旧      |

| 市町村  | 地区海岸名     | 堤防護岸延長(m) | 主な施設                      | 施設の高さ(T.P) |           | 応急対策 | 復旧・復興の予定 |        |         |        |         |       | H26年度の実施内容等 | H27年度の実施内容等 | その他の場合に詳細を記載 | 備考 |         |
|------|-----------|-----------|---------------------------|------------|-----------|------|----------|--------|---------|--------|---------|-------|-------------|-------------|--------------|----|---------|
|      |           |           |                           | 被災前現況高(m)  | 被災後復旧高(m) |      | 概要計画策定   | 詳細計画策定 | 左記の実施状況 | 工事着工   | 左記の実施状況 | 工事完了  |             |             |              |    | 左記の実施状況 |
| 大船渡市 | 下甫嶺地先     | 380       | 防潮堤、水門                    | 7.90       | 11.50     | —    | H23.10   | H26.6  | 策定中     | H25.2  | 着工済み    | H28.3 | 完了予定        | 本工事         | 本工事          |    | 復旧      |
| 大船渡市 | 大船渡港清水    | 983       | 胸壁、その他(陸閘、水門)             | 3.50       | 7.50      | —    | H23.11   | H26.6  | 策定済み    | H26.3  | 着工済み    | H29.3 | 完了予定        | 本工事         | 本工事          |    | 復旧      |
| 大船渡市 | 大船渡港永浜    | 781       | 胸壁、その他(陸閘、水門)             | 3.00       | 7.50      | 完了   | H23.11   | H26.6  | 策定済み    | H26.3  | 着工済み    | H29.3 | 完了予定        | 本工事         | 本工事          |    | 復旧      |
| 大船渡市 | 大船渡港山口    | 391       | 胸壁、その他(陸閘、水門)             | 3.10       | 7.50      | —    | H23.11   | H26.6  | 策定済み    | H26.3  | 着工済み    | H29.3 | 完了予定        | 本工事         | 本工事          |    | 復旧      |
| 大船渡市 | 大船渡港茶屋前   | 1,211     | 胸壁、その他(陸閘、水門)             | 3.40       | 7.50      | —    | H23.11   | H26.6  | 策定済み    | H25.2  | 着工済み    | H29.3 | 完了予定        | 本工事         | 本工事          |    | 復旧      |
| 大船渡市 | 大船渡港野々田   | 0         | 胸壁、その他(水門)                | 3.40       | 7.50      | —    | H23.11   | H26.6  | 策定済み    | H26.3  | 着工済み    | H29.3 | 完了予定        | 本工事         | 本工事          |    | 復旧      |
| 大船渡市 | 綾里漁港      | 641       | 防潮堤500m<br>陸閘2基           | 4.10       | 11.60     | —    | H25.5    | H26.10 | 策定中     | H27.9  | 着工予定    | H30.3 | 完了予定        | 詳細設計        | 地権者等との調整     |    | 復興      |
| 大船渡市 | 大船渡漁港     | 1,546     | 防潮堤1,580m<br>陸閘9基<br>水門2基 | 1.80       | 7.50      | —    | H25.2    | H26.12 | 策定中     | H27.6  | 着工予定    | H31.3 | 完了予定        | 詳細設計        | 地権者等との調整     |    | 復興      |
| 大船渡市 | 普金        | 無堤        | 防潮堤 600m                  | 0.00       | 7.50      | —    | H23.11   | H26.6  | 策定中     | H27.7  | 着工予定    | H29.3 | 完了予定        | 本工事等        | 本工事          |    | 復興      |
| 大船渡市 | 跡浜        | 無堤        | 防潮堤 800m                  | 0.00       | 7.50      | —    | H23.11   | H26.6  | 策定中     | H27.10 | 着工予定    | H29.3 | 完了予定        | 本工事等        | 本工事          |    | 復興      |
| 大船渡市 | 大船渡港野々田   | 無堤        | 防潮堤L=700m                 | 0.00       | 7.50      | —    | H23.11   | H26.3  | 策定済み    | H26.3  | 着工済み    | H29.3 | 完了予定        | 本工事等        | 本工事          |    | 復興      |
| 大船渡市 | 大船渡港永浜    | 無堤        | 防潮堤L=1,000m               | 0.00       | 7.50      | —    | H23.11   | H26.11 | 策定済み    | H26.3  | 着工済み    | H29.3 | 完了予定        | 本工事等        | 本工事          |    | 復興      |
| 大船渡市 | 大船渡港山口    | 無堤        | 防潮堤L=1,000m               | 0.00       | 7.50      | —    | H23.11   | H26.6  | 策定済み    | H26.3  | 着工済み    | H29.3 | 完了予定        | 本工事等        | 本工事          |    | 復興      |
| 大船渡市 | 大船渡港野々田 他 | 無堤        | 海岸環境L=600m                | 0.00       | 7.50      | —    | H23.11   | H26.3  | 策定済み    | H27.10 | 着工予定    | H29.3 | 完了予定        | 詳細設計        | 本工事          |    | 復興      |

## 2. 河川対策

### 【県・市町村管理区間】

① 2級水系盛川水系など※<sup>1</sup>の県・市管理区間では、全箇所<sup>※2</sup>の災害査定を完了し、13箇所<sup>※2</sup>で災害復旧事業を予定。そのうち、施設の被災及び背後地の状況に応じて緊急度の高い3箇所については大型土のう積み等による応急対策を完了。

本復旧については、平成24年度内に、設計、地元調整等の施工準備が 整った12箇所で着手し、9箇所で完了済。

②平成26年度に、1箇所（累計12箇所）で本復旧完了。

③平成26年度に、新たに1箇所で本復旧に着手予定（累計13箇所）。

また、1箇所で本復旧完了予定（累計12箇所）。

本復旧は、海岸堤防の整備計画及び市が策定する復興計画等と整合を図りながら逐次整備し、概ね5年を目途に全箇所完了させることを目標とする。（まちづくりと一体となって実施する区間については、まちづくりと堤防整備の調整を図りながら実施。）

併せて、堤防において液状化のおそれがある箇所については対策を実施。

また、今後津波の遡上が想定される区間については、水門等の機能が確実に発揮されるよう、耐震化、自動化及び遠隔操作化の対策を実施。

④平成25年度までの成果

- ・全箇所（13箇所）で災害査定を完了
- ・13箇所で本復旧に着手
- ・12箇所で本復旧を完了

⑤平成26年度の成果目標

- ・本復旧の完了予定は、以下の通り  
平成27年度内に1箇所完了予定（累計13箇所）

⑥事業完了予定年度

- ・平成27年度までに1箇所完了予定（累計13箇所）

※1 位置図を参照

※2 一連区間の取扱い方等により、箇所数は変動しうる



### 3. 下水道対策


#### 【災害復旧事業】

- ①箇所名：大船渡浄化センター
- ②浄化センターは平成 24 年 1 月に一部生物処理、平成 24 年 4 月に通常レベルの処理を開始し、平成 25 年 3 月に復旧を完了。

#### 【復興交付金事業】

- ①箇所名：大船渡地区、中赤崎地区污水管渠
- ②都市再生区画整理・防災集団移転促進・津波復興拠点整備の各事業における復興まちづくりにあわせた污水管渠整備。
- ③平成 26 年度の成果  
管渠整備は復興まちづくりの進捗にあわせて実施中。
- ④平成 27 年度の成果目標（集中復興期間の成果目標）  
管渠整備は都市再生区画整理事業等の進捗に併せて引き続き整備を進め、平成 30 年度完了を目指す。
- ⑤事業完了予定年度  
平成 30 年度

# (参考)下水処理場 位置図

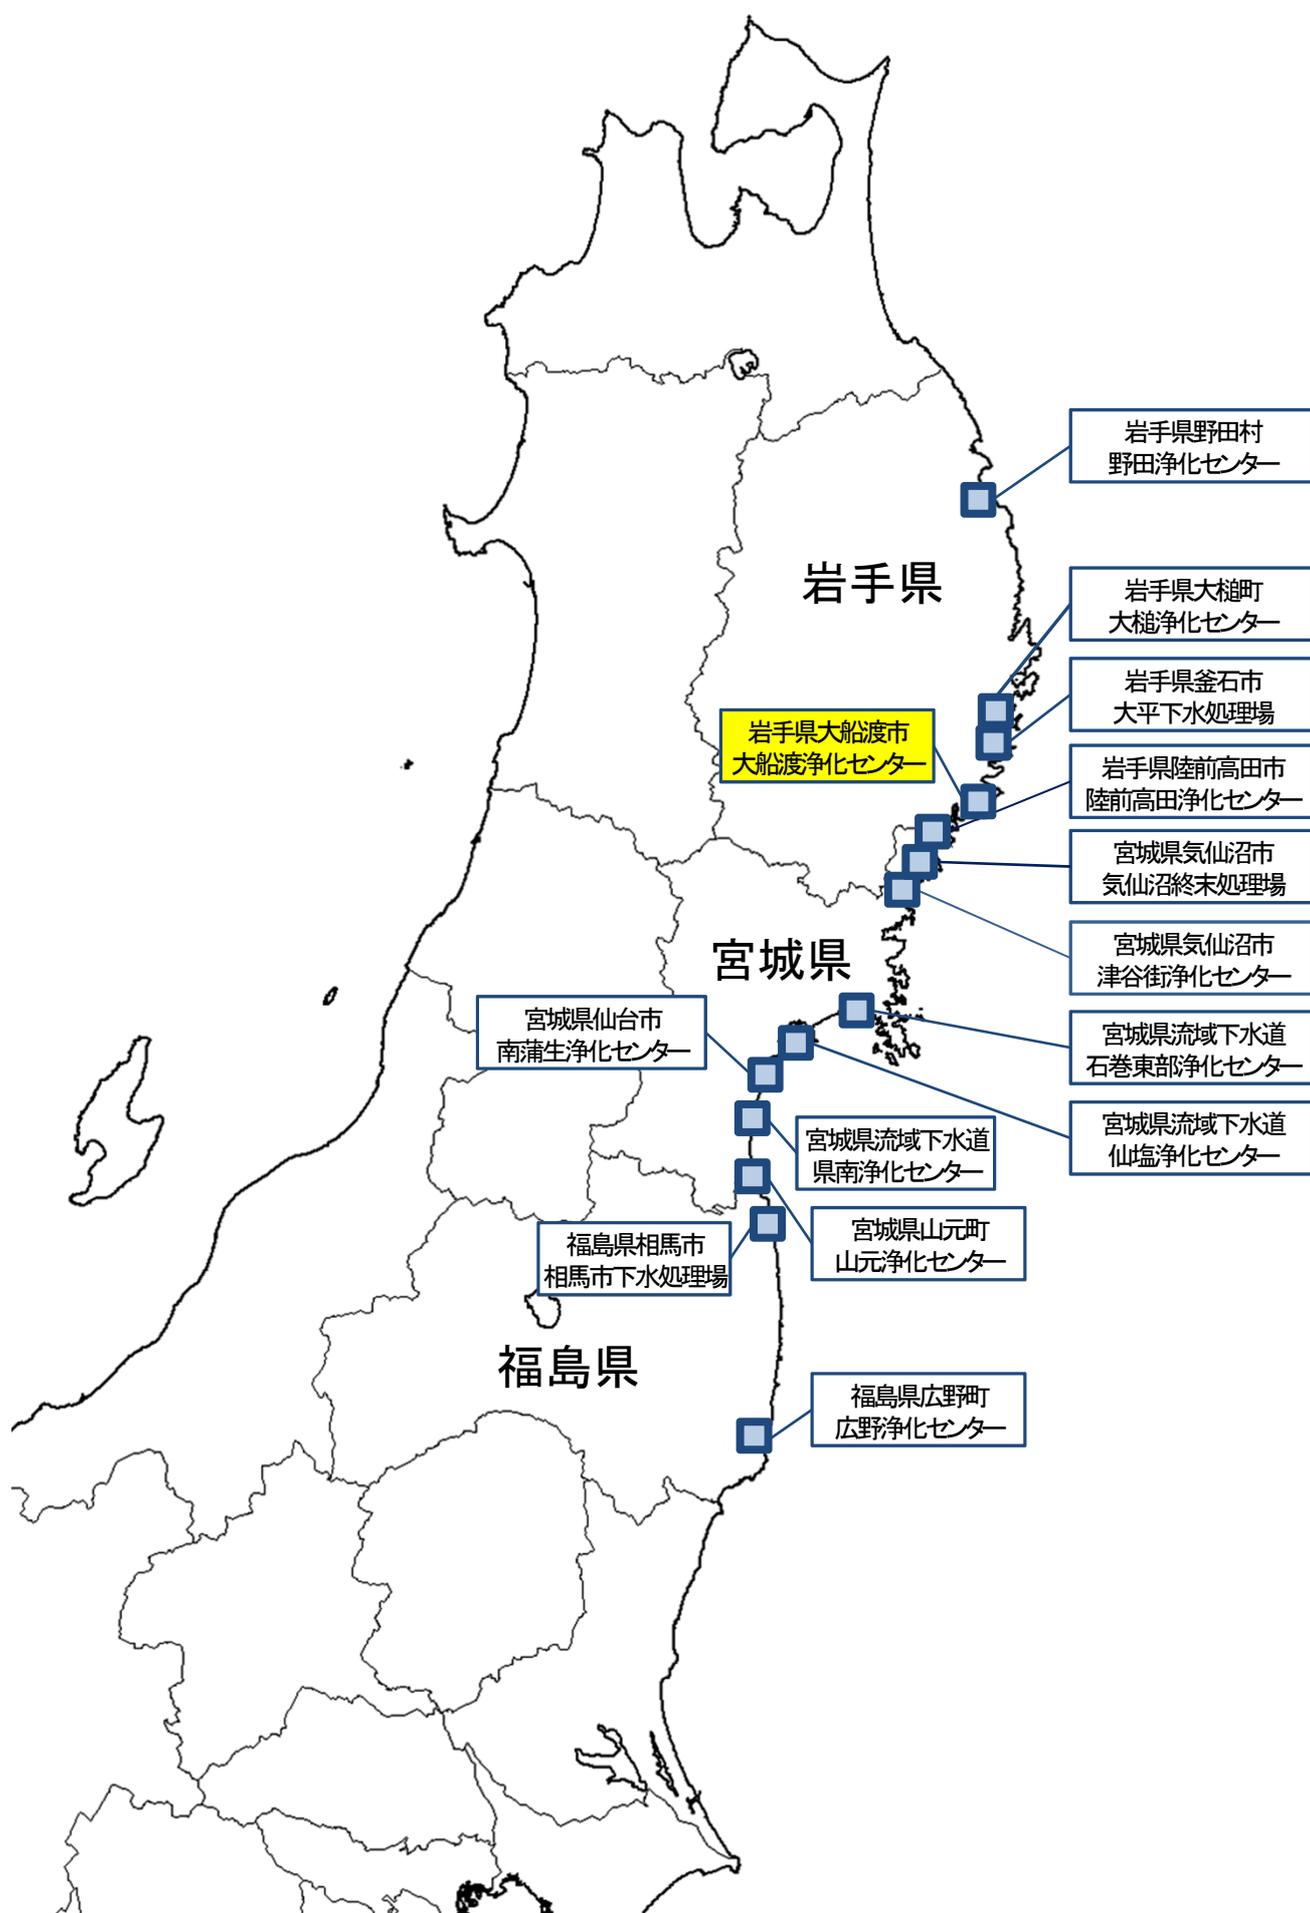

## 4. 交通網

### 自治体管理道路

- ①箇所（工区）名：主要地方道大船渡広田陸前高田線、一般県道碁石海岸線、主要地方道大船渡綾里三陸線、一般県道崎浜港線、一般県道吉浜上荒川線、一般県道唐丹日頃市線、一般県道吉浜上荒川線、一般県道唐丹日頃市線、一般県道丸森権現堂線、市道浪板漁港線、市道野々田川口橋線外1路線、市道野尻萱中2号線他1路線、市道甫嶺東側添線、市道平林大田線、市道平館堤防線外1路線、市道葡萄沢上甲子線、市道白木沢橋線、市道白浜線、市道白浜海岸線外1路線、市道泊里海岸1号線外2路線、市道泊開拓地線、市道展勝地砂子浜線、市道長安寺板用線、市道茶屋前1号線、市道地ノ森2号線、市道蛸ノ浦合足線外3路線、市道沢川3号線、市道大船渡高校北線、市道大船渡駅前線、市道大窪線、市道大塩線、市道大塩2号線、市道台8号線、市道袖の沢線、市道増館線、市道前田線、市道扇洞線、市道千歳線、市道石浜海岸線外4路線、市道盛線、市道清水山手線、市道水口線、市道須崎川右岸2号線外1路線、市道上平5号線、市道沼川大森線、市道小壁線、市道小田大田線、市道小石浜砂子浜線、市道小石浜海岸線、市道小石浜横断2号線外1路線、市道舟野線、市道山馬越線外3路線、市道三陸駅小泊線、市道作沢大田線、市道崎浜寺線、市道砂子浜新釜線、市道佐野橋取付線、市道根白漁港線、市道根白漁港線、市道合野線、市道合足海岸線、市道高清水鶴巻線外3路線、市道後ノ入線外1路線、市道郷道2号線、市道旧崎浜線、市道宮ノ前砂子前線、市道宮ノ前下平線、市道吉浜漁港線、市道岩崎野形線、市道岩崎港堤防線外5路線、市道岩崎港堤防線、市道花崎後山線、市道河内線、市道下甲子3号線、市道沖田シミア沢線、市道越喜来中学校線、市道永沢7号線、市道浦浜川東側添線外3路線、市道綾里岬線、市道綾里線、市道綾里駅野々前線外2路線（※参考に位置図を添付）

- ②平成25年度までに本復旧全153箇所のうち、149箇所に着手し、148箇所を完了した。

③平成26年度における成果

着手：1箇所（累計150箇所）

完了：1箇所（累計149箇所）

廃工：1箇所（累計1箇所）

未着手：2箇所

④平成 27 年度の成果目標（集中復興期間の成果目標）

着手し、未完了の 1 箇所については、引き続き工事を進捗し、平成 27 年度の完了を目指す。

未着手 2 箇所については、引き続き、まちづくり計画等と調整し、早期着手あるいは施工の可否について判断する。

⑤事業完了予定年度

平成 27 年度

# 復興施策の事業計画 参考図面 道路 大船渡市

## 大船渡市

### 【県・市管理道路】

主要地方道大船渡広田陸前高田線、一般県道基石海岸線、主要地方道大船渡綾里三陸線、一般県道崎浜港線、一般県道吉浜上荒川線、一般県道唐丹日頃市線、一般県道吉浜上荒川線、一般県道唐丹日頃市線、一般県道丸森権現堂線

市道浪板漁港線、市道野々田川口橋線外1路線、市道野尻萱中2号線他1路線、市道甫嶺東側添線、市道平林大田線、市道平館堤防線外1路線、市道葡萄沢上甲子線、市道白木沢橋線、市道白浜線、市道白浜海岸線外1路線、市道泊里海岸1号線外2路線、市道泊開拓地線、市道展勝地砂子浜線、市道長安寺板用線、市道茶屋前1号線、市道地ノ森2号線、市道蛸ノ浦合足線外3路線、市道沢川3号線、市道大船渡高校北線、市道大船渡駅前線、市道大窪線、市道大塩線、市道大塩2号線、市道台8号線、市道袖の沢線、市道増館線、市道前田線、市道扇洞線、市道千歳線、市道石浜海岸線外4路線、市道盛線、市道清水山手線、市道水口線、市道須崎川右岸2号線外1路線、市道上平5号線、市道沼川大森線、市道小壁線、市道小田大田線、市道小石浜砂子浜線、市道小石浜海岸線、市道小石浜横断2号線外1路線、市道舟野線、市道山馬越線外3路線、市道三陸駅小泊線、市道作沢大田線、市道崎浜寺線、市道砂子浜新釜線、市道佐野橋取付線、市道根白漁港線、市道根白漁港線、市道合野線、市道合足海岸線、市道高清水鶴巻線外3路線、市道後ノ入線外1路線、市道郷道2号線、市道旧崎浜線、市道宮ノ前砂子前線、市道宮ノ前下平線、市道吉浜漁港線、市道岩崎野形線、市道岩崎港堤防線外5路線、市道岩崎港堤防線、市道花崎後山線、市道河内線、市道下甲子3号線、市道沖田シミア沢線、市道越喜来中学校線、市道永沢7号線、市道浦浜川東側添線外3路線、市道綾里岬線、市道綾里線、市道綾里駅野々前線外2路線

108路線 153箇所



※ 一連区間の取扱い方等により、路線数は変動しうる

## 5. 農地・農業用施設

### ①被災状況

津波により77haの農地及び農業用施設に甚大な被害

### ②農地の復旧状況

復興計画等に基づく各種工程と調整を図りながら、早期の復旧を目指す。

○平成 23 年度当初から既に営農が可能な農地 1 ha

○平成 25 年度から営農が可能な農地 15ha

○平成 26 年度から営農が可能な農地 26ha

○平成 29 年度以降の営農再開を目指す農地 28ha

○平成 27 年度の成果目標（集中復興期間の成果目標）

平成 28 年度春の作付時期から、津波被災農地約 77ha のうち約 42ha（約 55%）で営農が可能となる見込み。

○事業完了予定年度 平成 30 年度以降

（ 現時点における農地復旧の見通しを示したものであり、今後の地元調整等により、面積は変わり得るもの。 ）

### ③区画整理等の実施状況

大船渡・釜石地区において、区画整理等を実施しているところ。

## 6. 海岸防災林

①箇所名： 三陸町沖田、三陸町本郷、三陸町浦浜、赤崎町合足

②被災状況

津波により森林 3.0ha が流失した。

③事業計画の内容

被災した森林については、防災林造成事業により整備する。

④これまでの実施状況と今後の計画

大船渡市復興計画等を踏まえて海岸防災林の再生方針を決定した。なお、浦浜地区は他所管の防潮堤敷となるため、復旧を取りやめることとした。浦浜を除く各地区については、他所管防潮堤の復旧工事が計画されており、関係機関と調整が整い次第、植栽に着手し、平成 30 年度の完了を目指す。

⑤平成 26 年度における成果

海岸防災林の再生方針に基づき事業計画を検討。

⑥平成 27 年度の成果目標（集中復興期間の成果目標）

防災林造成事業： 関係機関との調整を踏まえ事業計画を作成

⑦事業完了予定年度

平成 30 年度

（保全対象： 国道 45 号線、三陸鉄道南リアス線、JR 大船渡線、県道、市道、農地等）

## 7. 漁港

### ①被害状況

漁港数：22 漁港

被災漁港数：22 漁港

### ②スケジュール

大船渡市内の各被災 22 漁港において、平成 24 年度末時点で、18 漁港で部分的に陸揚げ機能が回復している。

今後、平成 27 年度までに、その他の漁港施設の復旧の完了を目指す。

## 8. 復興まちづくり

### (1) 学校施設等

#### ① 幼稚園・小中高等学校等

##### (i) 公立学校

###### <大船渡市立学校>

東日本大震災により被災した市立学校のうち、公立学校施設の災害復旧に係る国庫補助に申請したまたは申請予定の9校と1施設について、以下のとおり、早期の復旧を目指す。

○比較的軽微な被害に留まる6校については、平成23年度内に事業着手し、うち4校が平成23年度内に、1校が平成24年度内に復旧完了した。残りの1校は、平成25年度内に復旧が完了した。

○津波により甚大な被害を受け、移転が必要となる赤崎小学校、越喜来小学校、赤崎中学校の3校及び赤崎共同調理場については、平成23年度から事業着手し、平成23年10月に策定した当市の復興計画に基づき、赤崎共同調理場については平成25年度で復旧が完了し、2小学校・1中学校については平成28年度までの復旧完了を目標とする。

なお、赤崎中学校については平成24年4月に仮設校舎の建設に着手し、平成24年7月に完成した。

###### <県立学校>

東日本大震災により被災した県立学校のうち、公立学校施設の災害復旧に係る国庫補助に申請した2校について、以下のとおり、復旧を完了した。

○比較的軽微な被害に留まる2校については、平成23年10月までに復旧完了した。

##### (ii) 私立学校

東日本大震災により被災した私立学校のうち、私立学校施設の災害復旧に係る国庫補助に申請している1園について、以下のとおり、早期の復旧工事を実施し完了した。

○比較的軽微な被害に留まる1園については、平成23年8月に事業着手し、平成23年9月に復旧完了した。

#### ②大学等

##### (i) 私立学校

東日本大震災により被災した私立大学のうち、私立学校施設の災害復旧に係る国庫補助に申請予定の1校について、以下のとおり、早期の復旧を目指す。

○甚大な被害を受けた1校については、平成25年度に復旧完了した。

#### ③公立社会教育施設（公立社会体育施設と公立文化施設を含む）

###### <大船渡市立社会教育施設>

東日本大震災により被災した市立社会教育施設のうち、市営球場を除く公立社会教育施設の災害復旧に係る国庫補助に申請した11施設について、以下のとおり早期の復旧を目指す。

○市民文化会館については、平成23年度内に復旧完了した。

○三陸体育館については、平成23年度に事業着手し、平成24年度に復旧完了

した。

- 体育センター、市民テニスコート、市民弓道場については、平成 24 年度に事業着手し、平成 24 年度内に復旧完了した。
- 市民体育館、三陸総合運動公園グラウンド、勤労青少年ホーム、働く婦人の家、三陸公民館については、平成 24 年度に事業着手し、平成 26 年度に復旧完了した。
- 田中島グラウンドについては、被災に係る廃棄物の埋設地として使用されたことから、平成 26 年度に事業着手し、平成 27 年度の復旧完了を目標とする。
- その他、市営球場については仮設住宅敷地として使用されていることから、使用状況を見据えながら、できる限り早期の復旧を図る。

## (2) 津波復興拠点整備事業

### ①地区名：大船渡地区

②東日本大震災復興交付金を活用して、平成 24 年度から津波復興拠点整備事業に着手。

### ③平成 26 年度までの成果

平成 25 年 5 月に一団地の津波防災拠点市街地形成施設として都市計画決定し、平成 25 年 7 月に事業認可、平成 25 年 10 月に工事着手している。

### ④平成 27 年度の成果目標（集中復興期間の成果目標）

平成 29 年度の事業完了に向けて着実に工事を進めていく。

### ⑤事業完了予定年度

平成 29 年度予定

## 9. 土砂災害対策

- ①平成 23 年 8 月末までに、市内約 840 箇所の土砂災害危険箇所の点検を実施し、約 30 箇所で斜面の変状等を確認。降雨等により二次的な被害の恐れがある箇所等、必要に応じ土のう積みや観測等の応急対策を実施。(降雨の状況等を考慮し、随時再調査等を実施。)
  
- ②最大震度 6 弱を観測した大船渡市では、地震により地盤が脆弱になっている可能性が高く、降雨による土砂災害の危険性が通常よりも高いと考えられるため、県と気象台が連携し、平成 23 年 3 月より土砂災害警戒情報の発表基準を引き下げて運用していたが、降雨と土砂災害の発生状況を考慮して基準を見直し、平成 24 年 3 月に通常基準への引き上げを実施。

## 10. 災害廃棄物等の処理

### ①推計量について

東日本大震災においては、地震による大規模な津波及び地震による建物の倒壊等により膨大な量の災害廃棄物等約 853 千トン※（災害廃棄物が約 624 千トン、津波堆積物が約 230 千トン）発生した。

### ②搬入状況について


住民が生活している場所の近くの災害廃棄物については、平成 23 年 8 月末までに仮置場へ概ね搬入した。その他の災害廃棄物（損壊家屋等の解体により生じた災害廃棄物を含む。）、津波堆積物についても、平成 26 年 2 月末までに仮置場への搬入は完了した。


### ③処理状況について

平成 26 年 3 月末までに、災害廃棄物等約 853 千トン※（災害廃棄物が約 624 千トン、津波堆積物が約 230 千トン）の処理をすべて完了した。




※）災害廃棄物等推計量、災害廃棄物推計量及び津波堆積物推計量は、各推計量の合計値を 100 トン単位で個別に四捨五入した値のため、千トンの誤差を生じる場合がある。


## 復興施策の工程表(岩手県大船渡市)

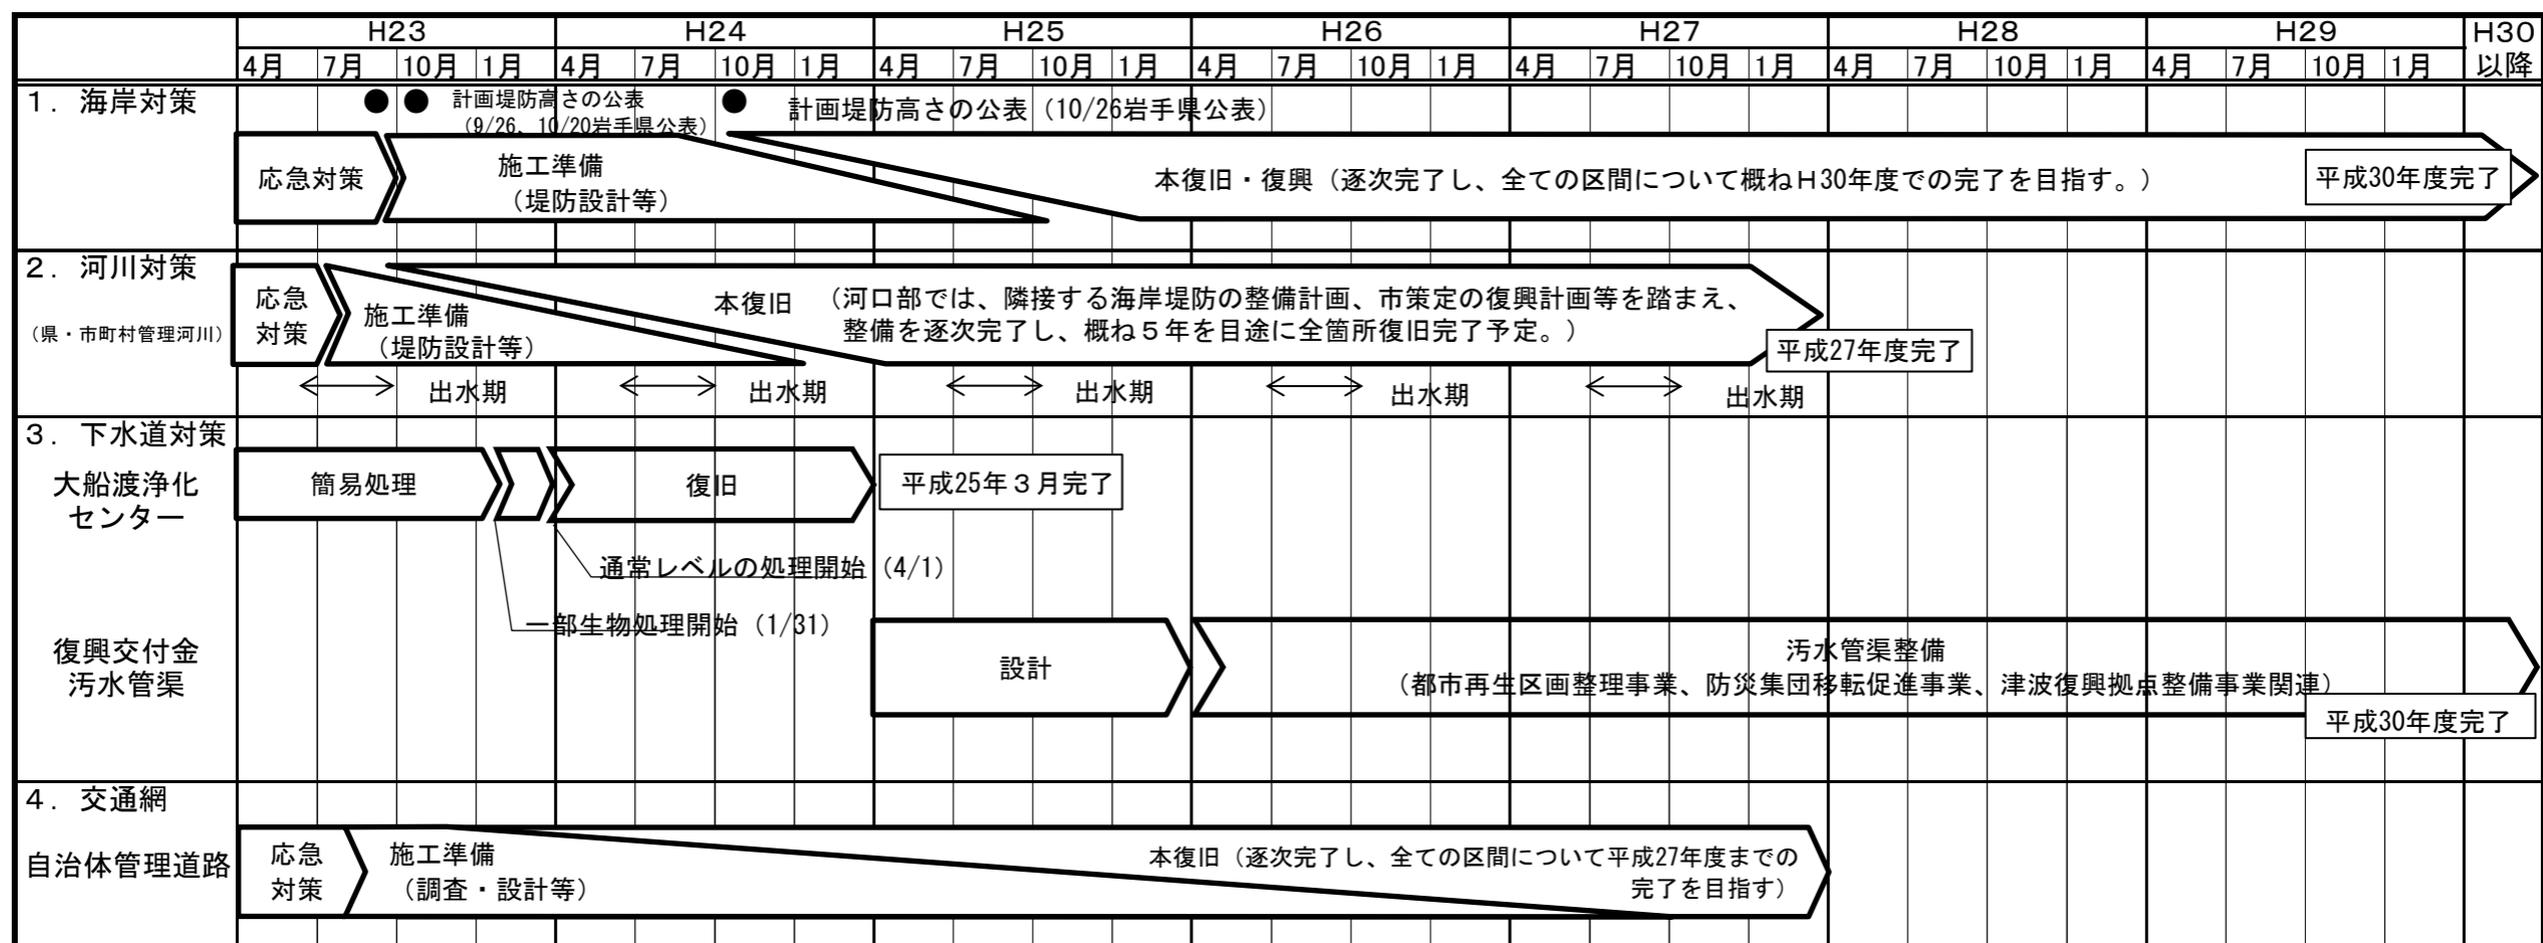

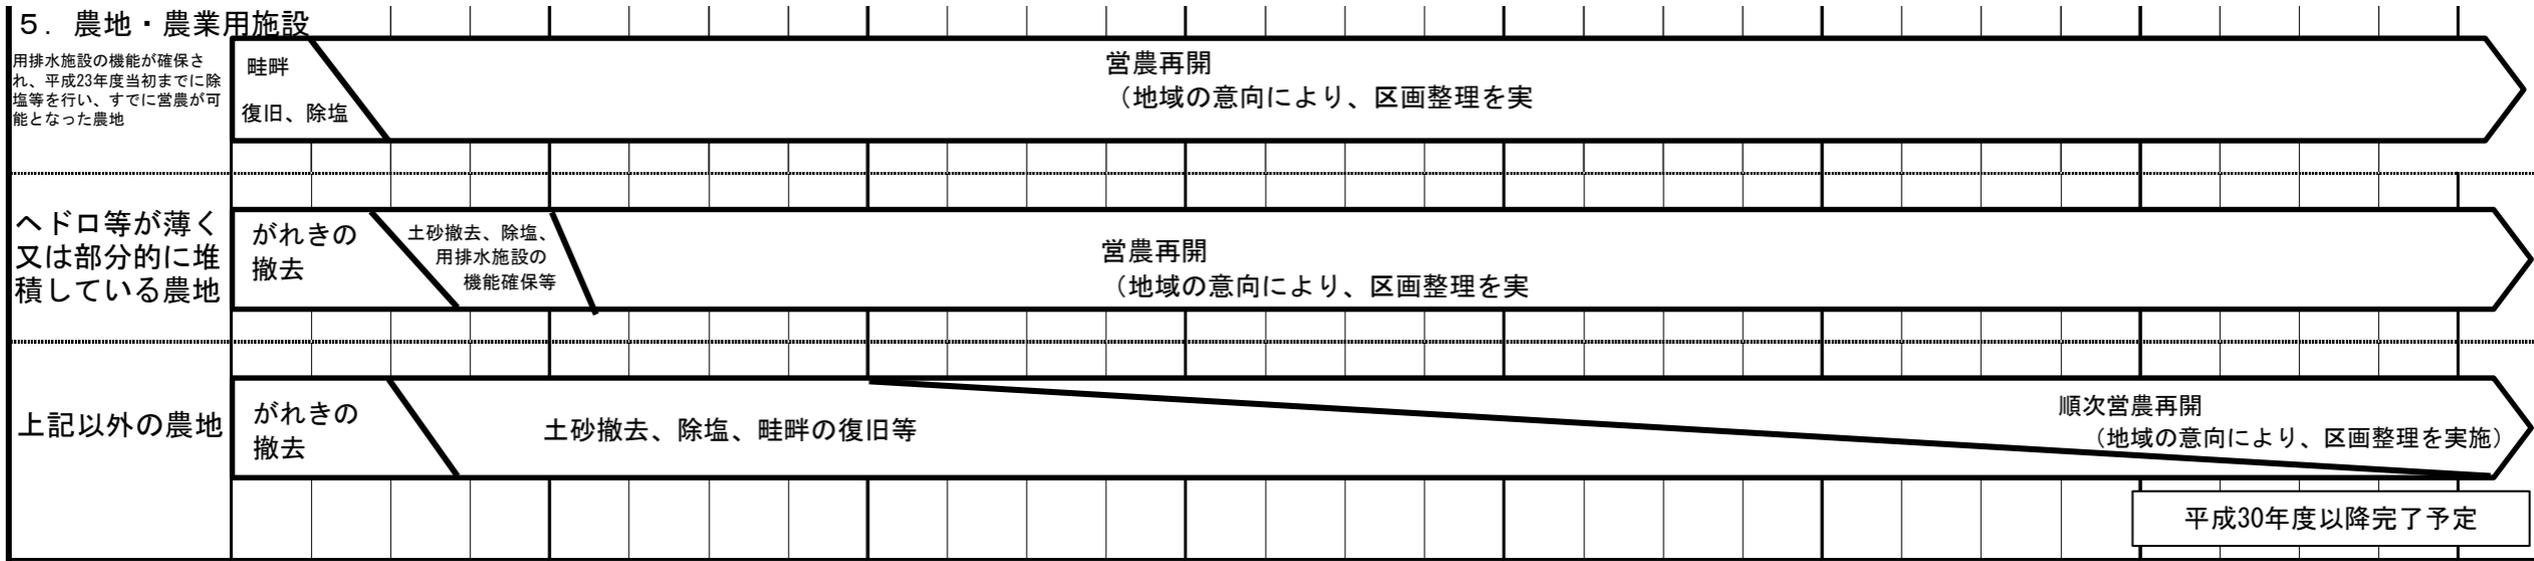

(注)本工程は、被災した農地を原形復旧する場合の工程を検討し、営農再開を目指す時期を示したもの。

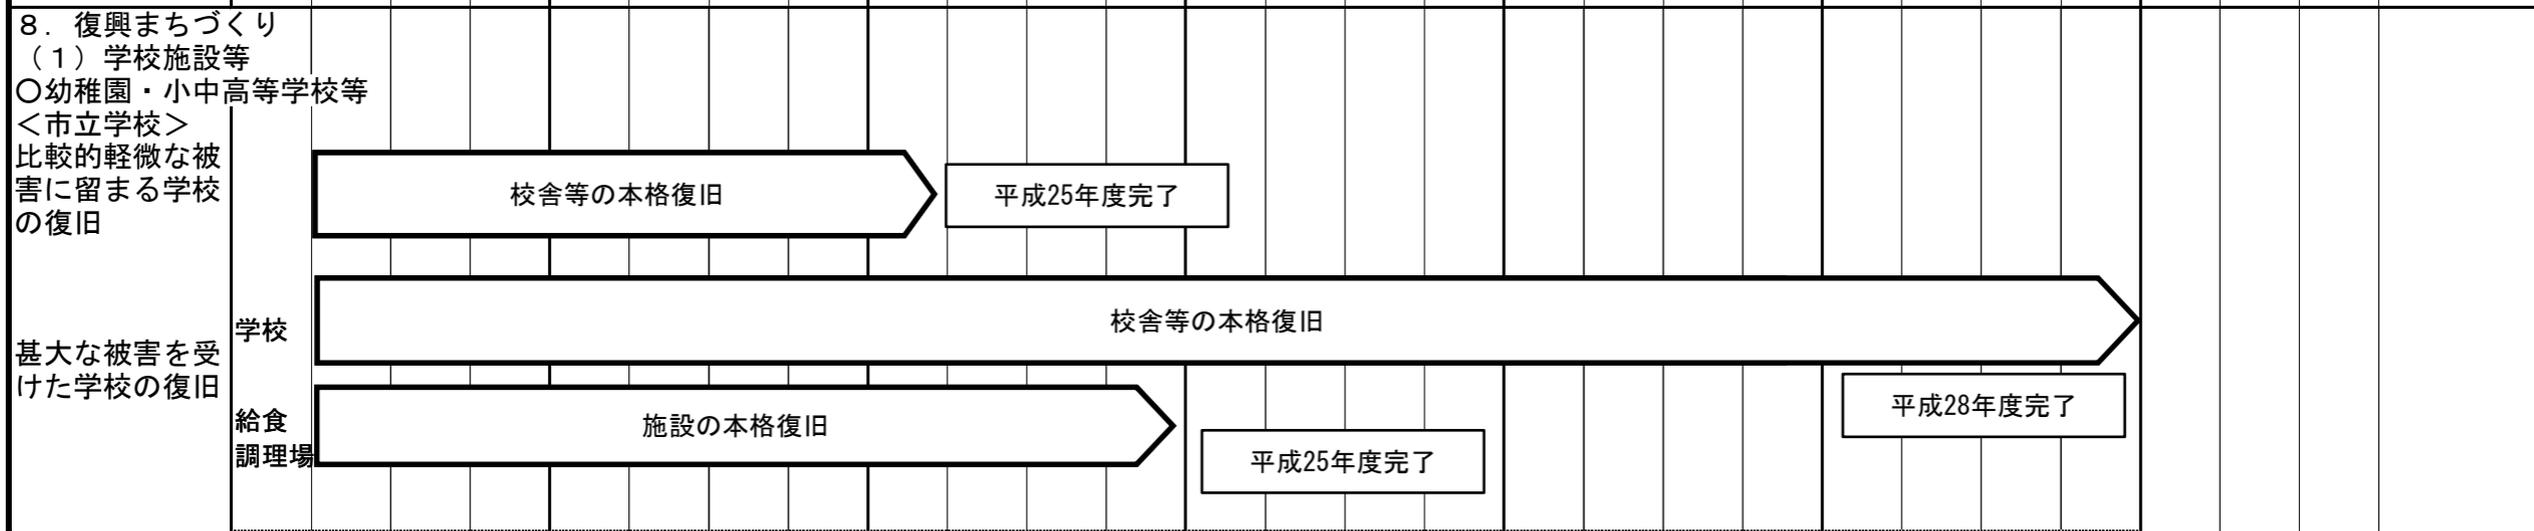

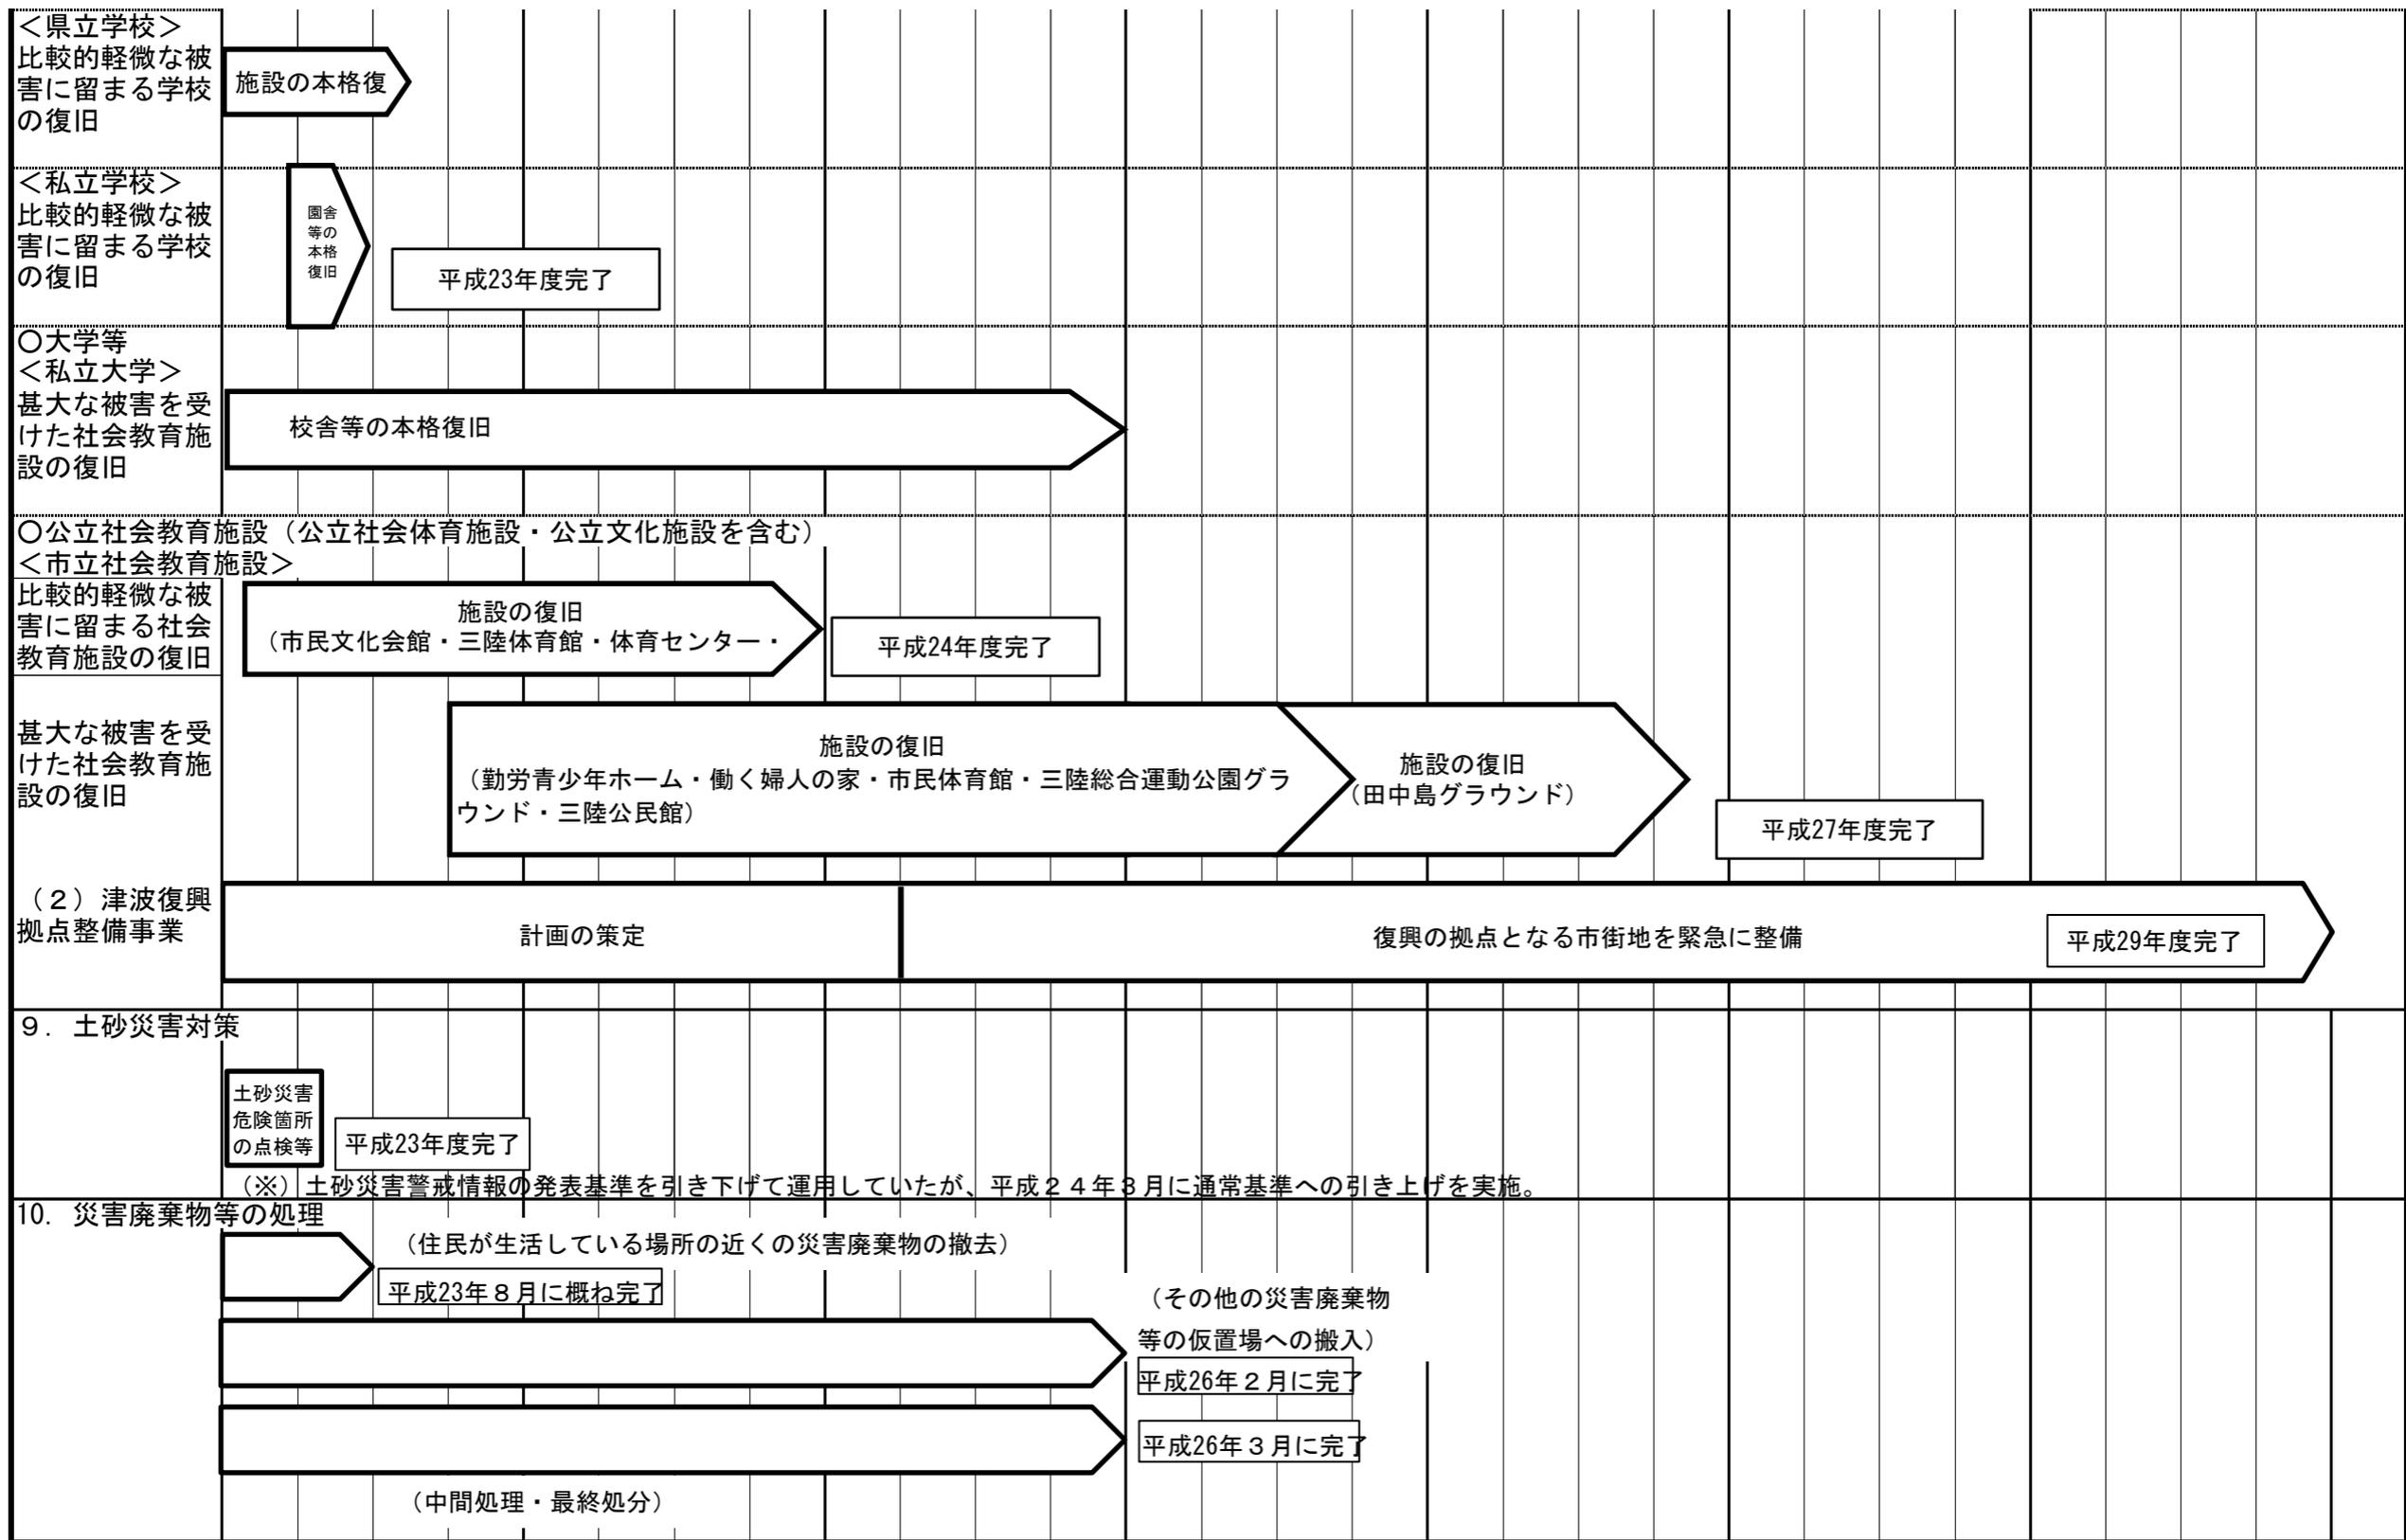

施設の本格復

園舎等の  
本格  
復旧

平成23年度完了

校舎等の本格復旧

施設の復旧  
（市民文化会館・三陸体育館・体育センター・

平成24年度完了

施設の復旧  
（勤労青少年ホーム・働く婦人の家・市民体育館・三陸総合運動公園グラ  
ウンド・三陸公民館）

施設の復旧  
（田中島グラウンド）

平成27年度完了

計画の策定

復興の拠点となる市街地を緊急に整備

平成29年度完了

土砂災害  
危険箇所の  
点検等

平成23年度完了

（※）土砂災害警戒情報の発表基準を引き下げて運用していたが、平成24年3月に通常基準への引き上げを実施。

（住民が生活している場所の近くの災害廃棄物の撤去）

平成23年8月に概ね完了

（その他の災害廃棄物

等の仮置場への搬入）

平成26年2月に完了

平成26年3月に完了

（中間処理・最終処分）
