

・昨年度第3次補正予算の段階で作成した事業計画と工程表について、今般、平成24年度予算等の内容を踏まえ、以下の通り見直し。

- ①平成23年度の取り組み成果及び平成24年度の成果目標を記載
- ②公共インフラに係る事業計画及び工程表(市町村版)において、復興まちづくりに関する事項を拡充

・公共インフラ(全体版)の対象18事業について、所管省庁による進捗確認を実施。

## 【公共インフラ】

### ■作成内容

#### ○事業計画

対象事業ごとに、復旧・復興に向けた基本的考え方、成果、目標などを記載。

#### ○工程表

ア. 上記の事業計画に即して、対象事業ごとに復旧・復興の目標をバーチャートで表示。

イ. 対象期間は、早急に予算措置の検討が必要なH26年度末までの3ヶ年を中心。

### ■対象事業

海岸、河川、下水道、交通網(道路、鉄道、空港、港湾)<sup>※</sup>、農地・農業用施設、海岸防災林の再生、漁港・漁場・養殖施設・大型定置網<sup>※</sup>、復興住宅(災害公営住宅)、復興まちづくり(防災集団移転・区画整理等、医療施設等、学校施設等)、土砂災害対策、地盤沈下・液状化対策、災害廃棄物の処理

(下線は、今回の見直しにより市町村版に追加した事業)

注1) 全体版と市町村版を作成。ただし、<sup>※</sup>は全体版のみ作成。なお、市町村版は、市街地復興パターンの検討調査を実施した43市町村を中心に作成。

注2) 事業の性質に応じて、路線・施設単位等でも作成。

注3) 公共インフラ以外の復興施策(雇用対策、教育の振興など)についても、取り組み状況や目標を取りまとめを実施。

# 復興まちづくりに係る事業計画及び工程表 (宮城県石巻市)

## ■事業計画

### 復興住宅(災害公営住宅)

#### ①地区名

湊、大街道西三丁目、流留、黄金浜①、黄金浜②、大街道西二丁目、駅前北通り一丁目、南光町一丁目、大街道北三丁目、向陽町、鹿妻、蛇田境谷地、蛇田二番谷地、南中里一丁目、本庁

②平成23年度から用地の選定や整備手法等、災害公営住宅の整備に向けた準備を進めており、東日本大震災復興交付金を活用し、用地の取得造成や調査設計等に順次着手していく予定。

#### ③平成24年度の成果目標

用地取得、設計、工事を順次行う。

### 復興まちづくり(防災集団移転促進事業)

#### ①地区名

【集団移転促進事業計画の策定済地区】本庁地区(うち鹿立浜地区、桃浦地区、竹浜地区)、牡鹿地区(うち小網倉浜・清水田浜地区、給分浜地区、十八成浜地区、鮫浦地区、前網浜地区)、雄勝地区(うち名振地区、船越地区、熊沢・大須地区)、北上地区(うち小室地区、小指地区)

【集団移転促進事業計画の策定準備中地区】本庁地区、牡鹿地区、雄勝地区、北上地区

②東日本大震災復興交付金を活用して、平成23年度から集団移転促進事業計画案作成に向けた調査を開始。集団移転促進事業計画の策定、住民の合意形成等の事業化に向けた準備が整った地区において事業に着手。

#### ③平成24年度の成果目標


集団移転促進事業計画の案の作成のための測量・設計等を行う。

## ■工程表

	H23				H24				H25				H26				H27以降
	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
7. 復興住宅(災害公営住宅等)																	
	住宅復興計画の策定				具体的な計画が決まったものから順次、用地取得、設計、工事着手、管理開始												
8. 復興まちづくり (1)防災集団移転促進事業																	
	集団移転促進事業計画案作成に向けた調査を開始 集団移転促進事業計画の策定、住民の合意形成等の事業化に向けた準備が整った地区において事業に着手																

# 【参考1】 工程表（宮城県石巻市）

## ■ 海岸対策、河川対策、下水道対策、農地・農業用施設

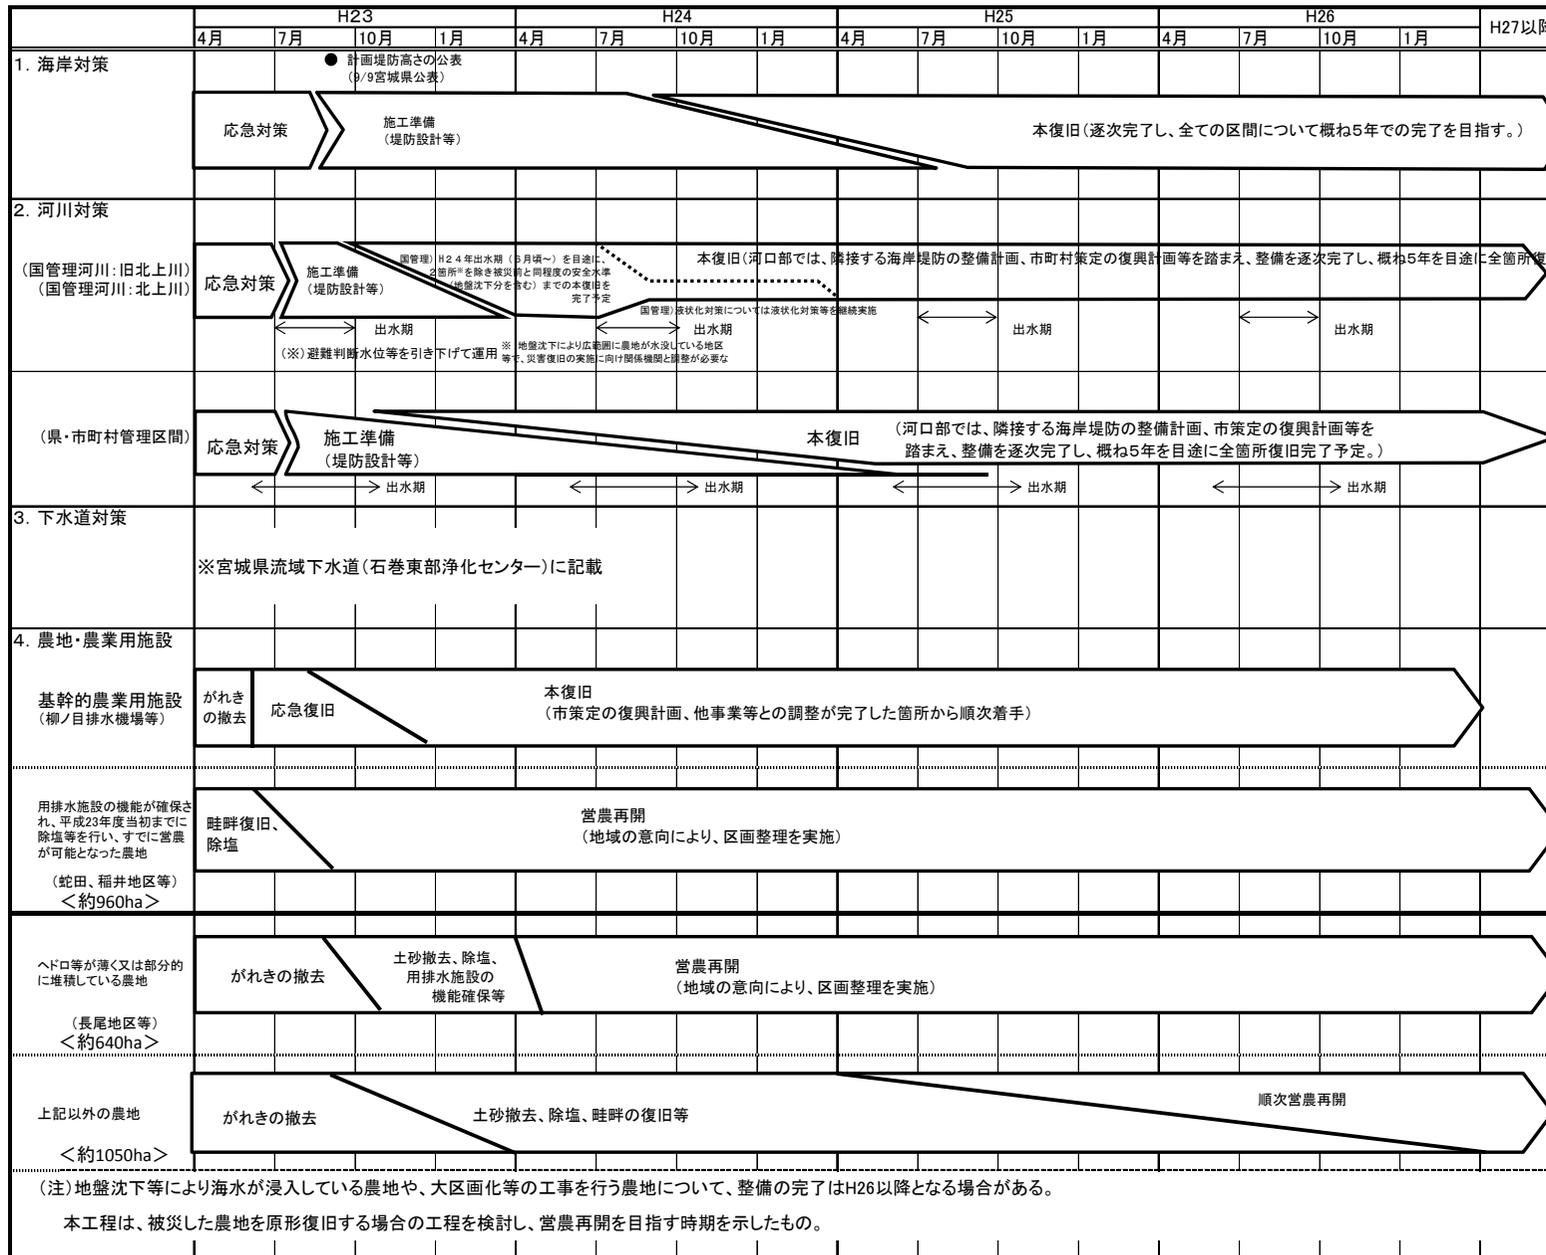



# 公共インフラの進捗確認

- ・公共インフラ(全体版)の対象18事業について、所管省庁による進捗確認を実施。
- ・その結果、2事業が「目標を若干下回った」、他の事業は「概ね目標通り」もしくは「目標通り」であり、全体としては概ね目標通りに進んでいると認識。
- ・地域における合意形成や用地取得などの進捗上の課題はあるが、本格的な復旧・復興に向け着実な実施と更なる進捗を期待。

事業名		平成23年度成果の進捗分析【評価】	事業名		平成23年度成果の進捗分析【評価】
1.	海岸対策	目標を若干下回った	10.	漁港・漁場・養殖施設・定置網	概ね目標通り
2.	河川対策	【国管理区間】概ね目標通り 【県・市町村管理区間】概ね目標通り	11.	復興住宅(災害公営住宅等)	目標通り
3.	下水道	目標通り	12.	復興まちづくり(防災集団移転促進事業、土地区画整理事業等)	目標通り
4.	交通網(道路)	目標通り	13.	復興まちづくり(被災した造成宅地)	目標通り
5.	交通網(鉄道)	【旅客鉄道】目標通り 【貨物鉄道】目標通り	14.	復興まちづくり(医療施設等)	目標通り
6.	交通網(空港)	目標通り	15.	復興まちづくり(学校施設等)	【幼稚園・小中高等学校等】概ね目標通り 【大学等】目標通り 【公立社会教育施設】概ね目標通り
7.	交通網(港湾)	目標通り	16.	土砂災害対策	概ね目標通り
8.	農地・農業用施設	概ね目標通り	17.	地盤沈下・液状化対策	目標通り
9.	海岸防災林の再生	概ね目標通り	18.	災害廃棄物の処理	【災害廃棄物の仮置き場への移動】 目標を若干下回った 【中間処理・最終処分】一部前倒しで完了
