

# 特措法に基づく汚染状況重点調査地域の指定及び市町村除染実施計画策定状況

(平成26年1月9日現在)

- 除染特別地域 (11)
  - 汚染状況重点調査地域 (40) ※重複4市町村
  - 除染実施計画策定市町村 (36)
- ※ ( ) 内は対象市町村



# 市町村の除染の進捗状況

## 【平成25年11月末現在までの計画・発注状況】

	<平成25年度末までの 計画>	<発注済>	<実施済>
住宅(戸)	235,208	158,239 (67.3%)	83,249 (35.4%)
公共施設(施設数)	5,871	5,304 (90.3%)	4,260 (72.6%)
道路(km)	5,335	3,356 (62.9%)	1,427 (26.7%)
農地(ha)	24,067	22,170 (92.1%)	19,493 (81.0%)
生活圏森林(ha)	4,085	1,650 (40.4%)	519 (12.7%)

## 除染の進捗状況

除染実施計画 策定済

出典：福島県除染対策課

平成25年12月末時点

### 公共施設 【施設数】

計画数 1,283

発注数 1,283

実績数 1,201

【除染実施数: 1201 調査にて終了: 0】

### 住宅 【戸】

計画数 43,624

発注数 43,624

実績数 25,704

【除染実施数: 25704 調査にて終了: 0】

### 道路 【km】

計画数 95.7

発注数 95.7

実績数 89.4

### 農地：水田 【ha】

計画数 2,361.0

発注数 2,361.0

実績数 2,361.0

### 農地：畑地 【ha】

計画数 1,184.0

発注数 888.0

実績数 888.0

### 農地：樹園地 【ha】

計画数 2,034.8

発注数 2,034.8

実績数 2,034.8

### その他：牧草地 【ha】

計画数 120.0

発注数 109.8

実績数 56.5

### その他：森林 （生活圏）【ha】

計画数 1,271.4

発注数 45.8

実績数 17.4



= 実績数のうち調査にて終了の数

（事前のモニタリングの結果により、除染作業が必要ないと判断されたもの）

# 着実に進んでいます。“福島市ふるさと除染”

福島市では、一日も早い震災からの復興のため、県内の他自治体に先駆け、「ふるさと除染実施計画」に基づき住宅の面的除染を進めています。平成25年9月1日現在、市内12地区で約3万9千件の除染の発注を完了しました。

今後もスピーディーな除染に努め、平成28年度までの5年間で市内全域の除染を行います。

## 住宅除染の進捗状況

(平成25年9月1日現在)

※法に基づき空間線量率が0.23マイクロシーベルト/時以上の地区は全て除染を実施します。

発注件数

39,285


除染作業中・完了

18,146

発注件数・除染完了件数とも、福島市は県内一です。

市名	住宅(戸)	
	発注	除染完了
福島市	39,285	14,294
郡山市	28,112	12,435
いわき市	9,492	576
伊達市	22,241	6,867
二本松市	10,581	7,250

(平成25年8月末現在、出典:福島県除染対策課資料)

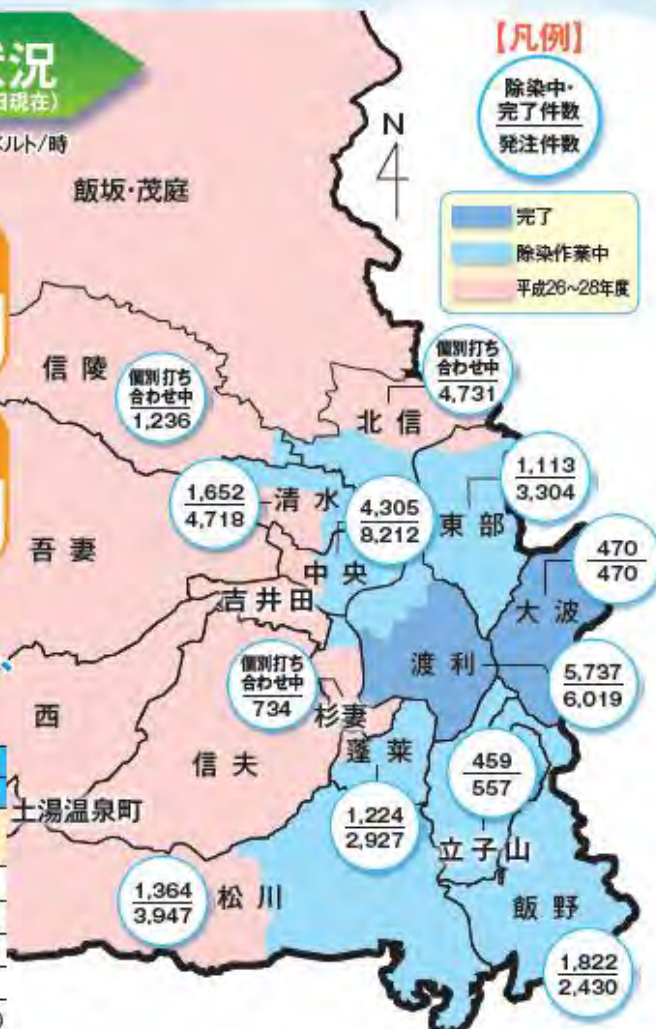

## 仮置き場の設置・進捗状況

(平成25年9月1日現在)

地区名	現在の作業状況	搬入開始の見通し
大波	-	平成23年秋から搬入開始
渡利	進入路及び造成箇所の伐採作業中	平成26年春頃
東部	進入路設置工事完了 本体造成工事まもなく完了	平成25年9月搬入開始
松川	進入路舗装修繕工事中 本体造成工事実施中	平成25年秋頃
飯野・立子山	進入路拡幅工事準備中	平成26年春頃
信陵	周辺整備工事準備中	平成26年春頃
中央東	造成箇所の伐採作業中	平成25年年末

仮置き場には、通学路や側溝の除去土壌などを優先的に搬入します。

地区に仮置き場が確保されれば、通学路や側溝などの除染を進めることができます。

住宅除染で出た除去土壌は、仮置き場の容量が確保された場合に搬入します。



# 住宅除染の進め方

住民説明会を開催後、全住宅を個別に訪問して詳細な打ち合わせを行い、屋根やベランダなども含めた丁寧な除染を進めています。  
また、除染前後には空間線量率のモニタリングを行い、測定値をお知らせしています。

地域除染等対策委員会(※1)  
実施検討会(※2)

市から地域除染等対策委員会へ除染の内容を説明し、実施検討会において除染順序を決定します。

住民説明会

住民説明会を開催し、共通的な除染の内容を説明します。

同意書・アンケートの送付

## 各住宅における除染の流れ

現地調査・測量

除染業者が各住宅の調査・測量を行います。

個別打ち合わせ

市委託の除染監理員と除染業者が全住宅を訪問し、住民の方と除染内容の打ち合わせをします。

除染前の測定

除染前の空間線量率のモニタリングを行います。

除染作業

市の除染管理基準に基づいて作業を実施します。  
市委託の除染監理員が作業を監督します。

除染後の測定

除染後のモニタリング及び効果の検証を行います。

(※1)地域除染等対策委員会…支所ごとに町内会やPTAなど地域の皆さんで組織し、除染の進め方や設置場所の候補地について協議します。  
(※2)実施検討会…町会長など地元の方々にお願いいただき、除染の進め方や実施するエリア分けなどを決定します。

## 主な除染作業



屋根のブラッシング



窓枠のふき取り



ベランダの洗浄・ふき取り



庭の土壌のはぎ取り



庇木下の土の除去



除染前・後のモニタリング

## 住宅除染の効果

測定高:1cm、単位:マイクロシーベルト/時

測定箇所	除染前空間線量率	除染後空間線量率	低減率
玄関	0.32	0.13	59%
庭中央	0.94	0.21	78%

【数値は渡利地区第1次除染分住宅等717戸の平均値、平成25年1月末とめ】



福島市 除染企画課・除染推進課 ☎024-535-1136(直通)

# 平成25年度 福島市ガラスバッジ測定結果のまとめ

## 1. 対象者数・配布者数・回収数

測定期間：原則平成25年9月～平成25年11月の3か月間


対象者数	申込件数	申込率	配布個数	回収数 (測定者数)	回収率	回収数内訳			未回収者 (未測定者含む)
						期限内提出者数 10,566			
						3か月間 測定者数	2か月間 測定者数	1か月間 測定者数	
37,741	12,000	31.80%	12,000	10,566	88.05%	10,100	357	109	1,434

※平成25年12月26日現在確定数

## 2. 3か月間の測定結果数・割合


		H25年度	
		人数(人)	割合(%)
3か月間測定者数		10,100	100%
内訳	0.1未満(X)	2,275	22.52%
	0.1以上～0.5未満	7,759	76.82%
	0.5以上～1.0未満	63	0.62%
	1.0以上～1.5未満	3	0.02%
	1.5以上～2.0未満	0	0.00%
	2.0以上～2.5未満	0	0.00%
2.5以上～3.0未満		0	0.00%

参考：H24年度		参考：H23年度	
人数(人)	割合(%)	人数(人)	割合(%)
16,223	100%	36,767	100%
2,888	17.80%	3,313	9.01%
13,127	80.91%	28,763	78.20%
203	1.25%	4,581	12.46%
2	0.01%	93	0.25%
2	0.01%	10	0.02%
1	0.00%	2	0.00%
0	0.00%	5	0.01%

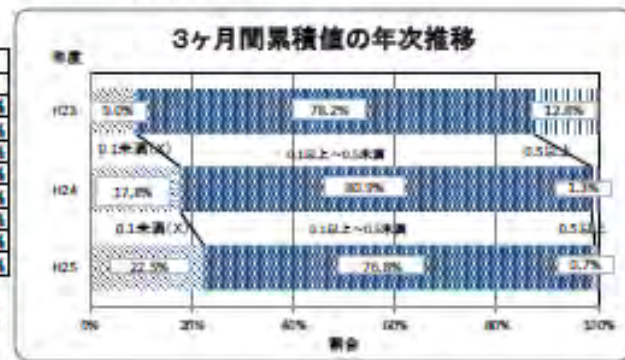

- H23 3か月間の積算線量平均値：0.26mSv ※最大値は2.7mSv 申込率：1回目38,182/46,300=82.46%  
1.0mSv未満の方が全体の99.70%  
2回目38,153/46,300=82.40%
- H24 3か月間の積算線量平均値：0.14mSv ※最大値は2.1mSv 申込率：16,225/38,974=46.76%  
1.0mSv未満の方が全体の99.97%
- H25 3か月間の積算線量平均値：0.11mSv ※最大値は1.2mSv 申込率：12,000/37,741=31.80%  
1.0mSv未満の方が全体の99.97%

## 3. 1年間の線量の推計値

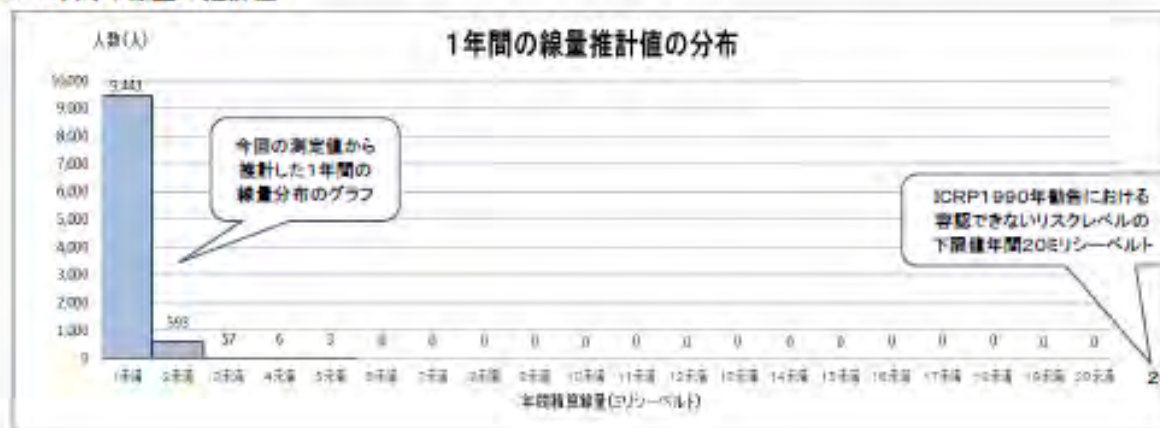


分布図の内訳			
3ヶ月間の積算線量(A)	年間線量推計値(A×4)	人数(人)	割合(%)
A(0.1未満)	1未満	2,275	9,441 93.48
	0.1	5,288	
	0.2	1,878	
0.3	2未満	477	593 5.87
	0.4	116	
	0.5	39	
0.6	3未満	13	57 0.56
	0.7	5	
0.8	4未満	3	6 0.06
	0.9	3	
1.0	5未満	1	3 0.03
1.2	2		

## 除染の進捗状況

除染実施計画 策定済

出典：福島県除染対策課  
平成25年12月末時点

### 公共施設 [施設数]




【除染実施数: 511 調査にて終了: 64】

### 住宅 [戸]




【除染実施数: 11059 調査にて終了: 5855】


### 道路 [km]



### 農地：水田 [ha]




### 農地：畑地 [ha]




### 農地：樹園地 [ha]



### その他：牧草地 [ha]



### その他：森林 (生活圏) [ha]



= 実績数のうち調査にて終了の数  
(事前のモニタリングの結果により、除染作業が必要ないと判断されたもの)



国見町

宮城県

桑折町

Cエリア

Cエリア

Bエリア

Bエリア

福島市

Aエリア

Aエリア

飯舘村  
居住制限区域

川俣町



## 除染の進捗状況

除染実施計画 策定済

出典：福島県除染対策課

平成25年12月末時点

### 公共施設 [施設数]

計画数 227

発注数 221

実績数 208

【除染実施数: 208 調査にて終了: 0】

### 住宅 [戸]

計画数 12,380

発注数 12,380

実績数 8,895

【除染実施数: 8895 調査にて終了: 0】

### 道路 [km]

計画数 400.0

発注数 320.8

実績数 230.3

### 農地：水田 [ha]

計画数 2,328.2

発注数 2,328.2

実績数 2,328.2

### 農地：畑地 [ha]

計画数 194.0

発注数 194.0

実績数 98.0

### 農地：樹園地 [ha]

計画数 69.0

発注数 69.0

実績数 69.0

### その他：牧草地 [ha]

計画数 762.1

発注数 762.1

実績数 722.1

### その他：森林 (生活圏) [ha]

計画数 357.0

発注数 128.0

実績数 94.0

 = 実績数のうち調査にて終了の数  
(事前のモニタリングの結果により、除染作業が必要ないと判断されたもの)

## 除染の進捗状況

除染実施計画 策定済


出典：福島県除染対策課  
平成25年12月末時点

### 公共施設 [施設数]



[除染実施数: 47 調査にて終了: 0]

### 住宅 [戸]




[除染実施数: 290 調査にて終了: 0]

### 道路 [km]



### 農地：水田 [ha]



### 農地：畑地 [ha]

計画数  
発注数  
実績数


### 農地：樹園地 [ha]



### その他：牧草地 [ha]

計画数  
発注数  
実績数

### その他：森林 (生活圏) [ha]



 = 実績数のうち調査にて終了の数  
(事前のモニタリングの結果により、除染作業が必要ないと判断されたもの)

## 除染の進捗状況

除染実施計画 策定済

出典：福島県除染対策課  
平成25年12月末時点

### 公共施設 【施設数】




### 住宅 【戸】



### 道路 【km】




### 農地：水田 【ha】



### 農地：畑地 【ha】

計画数  
発注数  
実績数

### 農地：樹園地 【ha】



### その他：牧草地 【ha】

計画数  
発注数  
実績数

### その他：森林 （生活圏）【ha】



 = 実績数のうち調査にて終了の数  
(事前のモニタリングの結果により、除染作業が必要ないと判断されたもの)

## 除染の進捗状況

除染実施計画 策定済


出典：福島県除染対策課  
平成25年12月末時点

### 公共施設 【施設数】




【除染実施数: 129 調査にて終了: 0】

### 住宅 【戸】



【除染実施数: 1246 調査にて終了: 0】

### 道路 【km】



### 農地：水田 【ha】



### 農地：畑地 【ha】



### 農地：樹園地 【ha】



### その他：牧草地 【ha】



= 実績数のうち調査にて終了の数  
(事前のモニタリングの結果により、除染作業が必要ないと判断されたもの)


# 福島県 大玉村

## 除染の進捗状況

除染実施計画 策定済

出典：福島県除染対策課  
平成25年12月末時点

### 公共施設 [施設数]



[除染実施数: 59 調査にて終了: 0]

### 住宅 [戸]



[除染実施数: 830 調査にて終了: 0]

### 道路 [km]



### 農地：水田 [ha]




### 農地：畑地 [ha]




### 農地：樹園地 [ha]



### その他：牧草地 [ha]



### その他：森林 (生活圏) [ha]



= 実績数のうち調査にて終了の数  
(事前のモニタリングの結果により、除染作業が必要ないと判断されたもの)

除染の進捗状況

除染実施計画 策定済


出典：福島県除染対策課  
平成25年12月末時点

公共施設 [施設数]



[除染実施数: 24 調査にて終了: 0]

住宅 [戸]




[除染実施数: 2185 調査にて終了: 0]


道路 [km]



農地：水田 [ha]



農地：畑地 [ha]




農地：樹園地 [ha]



その他：牧草地 [ha]



その他：森林 (生活圏) [ha]



= 実績数のうち調査にて終了の数  
(事前のモニタリングの結果により、除染作業が必要ないと判断されたもの)
