

事業計画（宮城県南三陸町）

1. 海岸対策

① 海岸の状況

| | |
|----------------|--------|
| 町内の地区海岸数 | 44地区海岸 |
| 被災した地区海岸数 | 36地区海岸 |
| 応急対策を実施した地区海岸数 | 13地区海岸 |
| 本復旧を実施する地区海岸数 | 36地区海岸 |
| 復興を実施する地区海岸数 | 13地区海岸 |

② 堤防高

平成23年9月9日に堤防高を公表[※]。

小泉湾 : T.P. 9.8m（対象津波：明治三陸地震）

志津川湾 : T.P. 8.7m（対象津波：想定宮城県沖地震）

※ 公表した堤防高を基本に、環境保全、周辺環境との調和、経済性、維持管理の容易性、施工性、公衆の利用等を総合的に考慮して決定する。

③ 復旧・復興の予定

復旧する施設の概要計画については、平成23年11月までに策定済み。

これに基づく本復旧工事については、平成24年7月より順次工事に着手し、平成30年度での完了を目指す。

復興する施設の概要計画については、平成24年11月までに策定済み。

これに基づく復興工事については、平成27年度より順次工事に着手し、概ね平成30年度での完了を目指す。

④ 平成26年度における成果

- ・新たに、9地区海岸において本復旧工事に着工した。（累計27地区海岸）

⑤ 平成27年度における成果

- ・新たに、2地区海岸において本復旧工事に着工した。（累計29地区海岸）
- ・新たに、4地区海岸において本復旧工事を完了した。（累計9地区海岸）
- ・新たに、5地区海岸において復興工事に着工した。（累計5地区海岸）

⑥ 平成28年度の成果目標

- ・全ての地区海岸において本復旧工事の着工を目指す。(累計 37 地区海岸)
- ・新たに、10 地区海岸において本復旧工事の完了を目指す。(累計 19 地区海岸)
- ・全ての地区海岸において復興工事の着工を目指す。(累計 13 地区海岸)
- ・新たに、1 地区海岸において復興工事の完了を目指す。(累計 1 地区海岸)

⑦ 事業完了予定年度

平成 30 年度

⑧ その他

地区海岸毎の計画等については別添一覧表に記載。

海岸保全施設の復旧・復興にかかる事業計画

| 市町村 | 地区海岸名 | 堤防護岸延長 (m) | 主な施設 | 施設の高さ(T.P) | | 応急 対策 | 復旧・復興の予定 | | | | | | H27年度の 実施内容等 | H28年度の 実施内容等 | その他の場合に詳細を 記載 | 備考 | |
|------|---|---------------|-----------|-------------------|----------------------|----------|------------|------------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------|----|-----------------|
| | | | | 被災前 現況高 (m) | 被災後 復旧高 (m) | | 概要計 画策定 | 詳細計 画策定 | 左記の 実施状 況 | 工事 着工 | 左記の 実施状 況 | 工事 完了 | | | | | 左記の 実施状 況 |
| 南三陸町 | 草木沢 | 194 | 護岸 | 4.50 | 9.80 | — | H23.11 | H26.12 | 策定予定 | H27.3 | 着工済み | H29.3 | 完了予定 | 本工事 | 本工事 | | 復旧 |
| 南三陸町 | 石浜 | 163 | 護岸 | 4.50 | 4.50 | — | H23.11 | H24.5 | 策定済み | H27.3 | 着工済み | H29.3 | 完了予定 | 本工事 | 本工事 | | 復旧 |
| 南三陸町 | 田の浦 | 193 | 護岸 | 4.50 | 4.50 | — | H23.11 | H24.5 | 策定済み | H27.3 | 着工済み | H28.3 | 完了済み | 本工事 | — | | 復旧 |
| 南三陸町 | 細浦 | 350 | 護岸 | 3.62 | 8.70 (一部 3.62) | — | H23.11 | H24.5 | 策定済み | H27.3 | 着工済み | H29.3 | 完了予定 | 本工事 | 本工事 | | 復旧 |
| 南三陸町 | 荒砥 <small>(農振局)</small> | 187 | 護岸 | 3.82 | 3.82 | — | H23.11 | H24.5 | 策定済み | H27.3 | 着工済み | H28.3 | 完了済み | 本工事 | — | | 復旧 |
| 南三陸町 | 寺浜 | 217 | 護岸 | 4.12 | 7.30 | — | H23.11 | H25.10 | 策定済み | H26.2 | 着工済み | H28.3 | 完了済み | 本工事 | — | | 復旧 |
| 南三陸町 | 浜谷 <small>(伊勢)</small> <small>(農振局)</small> | 500 | 護岸 | 4.62 | 4.62 | — | H23.11 | H24.4 | 策定済み | H24.7 | 着工済み | H25.12 | 完了済み | — | — | | 復旧 |
| 南三陸町 | 滝浜 <small>(近東)</small> | 391 | 護岸 | 5.12 | 5.12 | — | H23.11 | H24.4 | 策定済み | H24.7 | 着工済み | H25.12 | 完了済み | — | — | | 復旧 |
| 南三陸町 | 清水 | 799 | 護岸 | 4.12 | 8.70 (一部 4.12) | — | H23.11 | H26.12 | 策定予定 | H27.1 | 着工済み | H29.3 | 完了予定 | 本工事 | 本工事 | | 復旧 |
| 南三陸町 | 藤浜Ⅰ | 115 | 護岸 | 5.00 | 5.00 | — | H23.11 | H24.4 | 策定済み | H24.7 | 着工済み | H25.12 | 完了済み | — | — | | 復旧 |
| 南三陸町 | 藤浜Ⅱ | 232 | 護岸 | 5.00 | 5.00 | — | H23.11 | H24.4 | 策定済み | H24.7 | 着工済み | H25.12 | 完了済み | — | — | | 復旧 |
| 南三陸町 | 水戸辺 <small>(農振局)</small> | 346 | 護岸 | 4.50 | 4.50 | — | H23.11 | H24.5 | 策定済み | H27.3 | 着工済み | H28.3 | 完了済み | 本工事 | — | | 復旧 |
| 南三陸町 | 泊 <small>(歌津)</small> 壱港 | 273 | 護岸 | 4.62 | 8.70 | — | H23.11 | H28.3 | 策定予定 | H28.7 | 着工予定 | H31.3 | 完了予定 | 用地買収、本工事 | 詳細設計、用地測量、用地買収、本工事 | | 復旧 |
| 南三陸町 | 伊里前 壱港 | 515 | 護岸、防潮堤 | 4.62 | 8.70 | 完了 | H23.11 | H27.12 | 策定済 | H28.2 | 着工済み | H31.3 | 完了予定 | 用地買収、本工事 | 用地測量、用地買収、本工事 | | 復旧 |
| 南三陸町 | 志津川 壱港 | 2,728 | 防潮堤、護岸 | 4.62 | 8.70 | 完了 | H23.11 | H28.3 | 策定予定 | H25.12 | 着工済み | H31.3 | 完了予定 | 詳細設計、用地買収、本工事 | 詳細設計、用地測量、用地買収、本工事 | | 復旧 |
| 南三陸町 | 波谷谷 壱港 | 1,335 | 防潮堤、護岸 | 4.62 | 7.30 | — | H23.11 | H27.3 | 策定予定 | H27.9 | 着工予定 | H29.3 | 完了予定 | 詳細設計 | 詳細設計 | | 復旧 |
| 南三陸町 | 港漁港 | 243 | 護岸、防潮堤、胸壁 | 4.62 | 9.80 | 完了 | H23.11 | H27.3 | 策定予定 | H25.11 | 着工済み | H28.3 | 完了予定 | 詳細設計 | 詳細設計 | | 復旧 |

| 市町村 | 地区海岸名 | 堤防護岸延長(m) | 主な施設 | 施設の高さ(T.P) | | 応急対策 | 復旧・復興の予定 | | | | | | H27年度の実施内容等 | H28年度の実施内容等 | その他の場合に詳細を記載 | 備考 | |
|------|-----------|-----------|--------------|------------|--------------|------|----------|--------|---------|--------|---------|-------|-------------|--------------------|---------------|----|---------|
| | | | | 被災前現況高(m) | 被災後復旧高(m) | | 概要計画策定 | 詳細計画策定 | 左記の実施状況 | 工事着工 | 左記の実施状況 | 工事完了 | | | | | 左記の実施状況 |
| 南三陸町 | 田浦漁港 | 599 | 防潮堤、護岸、胸壁、堤防 | 4.62 | 9.80 | 完了 | H23.11 | H28.3 | 策定予定 | H25.11 | 着工済み | H30.3 | 完了予定 | 詳細設計、用地測量、用地買収 | 詳細設計、用地測量、本工事 | | 復旧 |
| 南三陸町 | ばなな漁港 | 869 | 防潮堤、護岸、胸壁 | 4.62 | 8.70 | — | H23.11 | H28.3 | 策定予定 | H25.11 | 着工済み | H30.3 | 完了予定 | 詳細設計、用地測量、用地買収 | 詳細設計、用地測量、本工事 | | 復旧 |
| 南三陸町 | 寄木漁港 | 412 | 防潮堤、胸壁 | 3.62 | 8.70 | 完了 | H23.11 | H28.3 | 策定予定 | H28.12 | 着工予定 | H31.3 | 完了予定 | 詳細設計、用地測量、用地買収 | 詳細設計、用地測量、本工事 | | 復旧 |
| 南三陸町 | 萑浜漁港 | 272 | 護岸、胸壁 | 3.62 | 8.70 | — | H23.11 | H28.3 | 策定予定 | H28.10 | 着工予定 | H30.3 | 完了予定 | 詳細設計、用地測量、用地買収 | 詳細設計、用地測量、本工事 | | 復旧 |
| 南三陸町 | 細浦漁港 | 389 | 防潮堤、護岸 | 3.62 | 8.70 | 完了 | H23.11 | H27.3 | 策定予定 | H27.6 | 着工予定 | H30.3 | 完了予定 | 詳細設計 | 詳細設計 | | 復旧 |
| 南三陸町 | 清水漁港 | 262 | 防潮堤 | 4.12 | 8.70 | 完了 | H23.11 | H28.3 | 策定予定 | H28.6 | 着工予定 | H30.3 | 完了予定 | 詳細設計、用地測量、用地買収 | 詳細設計、用地測量、本工事 | | 復旧 |
| 南三陸町 | 荒砥漁港 | 346 | 防潮堤、護岸、胸壁 | 4.12 | 8.70 | — | H23.11 | H28.3 | 策定予定 | H25.12 | 着工済み | H30.3 | 完了予定 | 詳細設計、用地測量、用地買収 | 詳細設計、用地測量、本工事 | | 復旧 |
| 南三陸町 | 平磯漁港 | 361 | 護岸、防潮堤、胸壁 | 4.12 | 8.70 | — | H23.11 | H28.2 | 策定予定 | H25.12 | 着工済み | H30.3 | 完了予定 | 詳細設計、用地測量、用地買収、本工事 | 詳細設計、用地測量、本工事 | | 復旧 |
| 南三陸町 | 折立漁港 | 301 | 防潮堤 | 5.12 | 8.70 | — | H23.11 | H27.3 | 策定予定 | H27.6 | 着工予定 | H30.3 | 完了予定 | 詳細設計 | 詳細設計 | | 復旧 |
| 南三陸町 | 水戸辺漁港 | 363 | 防潮堤 | 4.42 | 7.30 | 完了 | H23.11 | H28.2 | 策定予定 | H28.6 | 着工予定 | H30.3 | 完了予定 | 詳細設計、用地測量、用地買収、本工事 | 詳細設計、用地測量、本工事 | | 復旧 |
| 南三陸町 | 津ノ宮漁港 | 340 | 護岸 | 4.12 | 7.30 | 完了 | H23.11 | H28.2 | 策定予定 | H26.2 | 着工済み | H30.3 | 完了予定 | 詳細設計、用地測量、用地買収、本工事 | 詳細設計、用地測量、本工事 | | 復旧 |
| 南三陸町 | 滝浜漁港 | 266 | 護岸、堤防 | 5.12 | 7.30 | — | H23.11 | H28.3 | 策定予定 | H28.12 | 着工予定 | H31.3 | 完了予定 | 詳細設計、用地測量、用地買収 | 詳細設計、用地測量、本工事 | | 復旧 |
| 南三陸町 | 長清水漁港 | 152 | 堤防、護岸 | — | 7.30 | — | H23.11 | H27.8 | 策定済み | H25.12 | 着工済み | H30.3 | 完了予定 | 詳細設計、用地買収、本工事 | 詳細設計、用地買収、本工事 | | 復旧 |
| 南三陸町 | 長須賀 | 570.0 | 堤防、護岸、離岸堤 | 5.50 | 8.70 | 完了 | H23.11 | H24.12 | 策定済み | H26.3 | 着工済み | H29.3 | 完了予定 | 本工事等 | 本工事等 | | 復旧 |
| 南三陸町 | 館浜 | 411.0 | 堤防、護岸、離岸堤 | 4.50 | 8.70 | 完了 | H23.11 | H24.12 | 策定済み | H26.3 | 着工済み | H29.3 | 完了予定 | 本工事等 | 本工事等 | | 復旧 |
| 南三陸町 | 荒砥(水国土局) | 375.0 | 堤防、護岸 | 4.50 | 8.70 | — | H23.11 | H24.12 | 策定済み | H26.5 | 着工済み | H29.3 | 完了予定 | 本工事等 | 本工事等 | | 復旧 |
| 南三陸町 | 黒崎 | 312.0 | 護岸 | 5.20 | 8.70 5.20 | — | H23.11 | H24.8 | 策定済み | H25.9 | 着工済み | H28.5 | 完了予定 | 本工事等 | 本工事等 | | 復旧 |
| 南三陸町 | 水戸辺(水国土局) | 164.0 | 堤防、護岸 | 4.50 | 7.30 | 完了 | H23.11 | H24.12 | 策定済み | H26.10 | 着工済み | H29.3 | 完了予定 | 本工事等 | 本工事等 | | 復旧 |
| 南三陸町 | 戸倉 | 619.0 | 堤防、護岸 | 4.50 | 8.70 | 完了 | H23.11 | H24.12 | 策定済み | H24.10 | 着工済み | H29.3 | 完了予定 | 本工事等 | 本工事等 | | 復旧 |

| 市町村 | 地区海岸名 | 堤防護岸延長(m) | 主な施設 | 施設の高さ(T.P) | | 応急対策 | 復旧・復興の予定 | | | | | | H27年度の実施内容等 | H28年度の実施内容等 | その他の場合に詳細を記載 | 備考 | |
|------|-----------|-----------|---------|------------|-----------|------|----------|--------|---------|--------|---------|-------|-------------|--------------------|--------------------|----|---------|
| | | | | 被災前現況高(m) | 被災後復旧高(m) | | 概要計画策定 | 詳細計画策定 | 左記の実施状況 | 工事着工 | 左記の実施状況 | 工事完了 | | | | | 左記の実施状況 |
| 南三陸町 | 波伝谷(水国土局) | 108.0 | 護岸 | 4.50 | 4.50 | — | H23.11 | H24.6 | 策定済み | H25.12 | 着工済み | H27.1 | 完了済み | — | — | | 復旧 |
| 南三陸町 | 泊(歌津)漁港 | 273 | 護岸、陸閘2基 | 4.62 | 8.70 | — | H24.11 | H28.3 | 策定予定 | H28.12 | 着工予定 | H31.3 | 完了予定 | 詳細設計、用地測量、用地買収、本工事 | 詳細設計、用地測量、用地買収、本工事 | | 復興 |
| 南三陸町 | 志津川漁港 | 2,728 | 護岸、陸閘2基 | 4.62 | 8.70 | — | H24.11 | H28.3 | 策定予定 | H28.2 | 着工済み | H30.3 | 完了予定 | 詳細設計、用地買収、本工事 | 用地買収、本工事 | | 復興 |
| 南三陸町 | 波伝谷漁港 | 1,335 | 護岸 | 4.62 | 7.30 | — | H24.11 | H27.10 | 策定予定 | H28.2 | 着工済み | H29.3 | 完了予定 | 詳細設計、用地測量、用地買収、本工事 | 用地買収、本工事 | | 復興 |
| 南三陸町 | 浜(歌津)漁港 | 無堤 | 護岸、陸閘4基 | — | 8.70 | — | H24.11 | H28.3 | 策定予定 | H28.6 | 着工予定 | H31.3 | 完了予定 | 詳細設計、用地測量 | 詳細設計、用地測量 | | 復興 |
| 南三陸町 | 稲淵漁港 | 無堤 | 護岸、陸閘1基 | — | 8.70 | — | H24.11 | H28.3 | 策定予定 | H28.6 | 着工予定 | H31.3 | 完了予定 | 詳細設計、用地測量 | 詳細設計、用地測量 | | 復興 |
| 南三陸町 | 館浜漁港 | 無堤 | 防潮堤 | — | 8.70 | — | H24.11 | H28.3 | 策定予定 | H28.6 | 着工予定 | H31.3 | 完了予定 | 詳細設計、用地測量 | 詳細設計、用地測量 | | 復興 |
| 南三陸町 | 藤浜漁港 | 無堤 | 護岸 | — | 7.30 | — | H24.11 | H28.2 | 策定予定 | H28.3 | 着工済み | H31.3 | 完了予定 | 詳細設計、用地買収、用地測量 | 詳細設計、用地測量、本工事 | | 復興 |
| 南三陸町 | 寺浜漁港 | 無堤 | 護岸、陸閘1基 | — | 7.30 | — | H24.11 | H28.2 | 策定済み | H28.3 | 着工済み | H31.3 | 完了予定 | 詳細設計、用地買収、用地測量 | 詳細設計、用地測量、本工事 | | 復興 |
| 南三陸町 | 田浦漁港 | 599 | 護岸 | 4.62 | 9.80 | — | H24.11 | H28.3 | 策定予定 | H28.6 | 着工予定 | H31.3 | 完了予定 | 詳細設計、用地買収、用地測量 | 詳細設計、用地測量 | | 復興 |
| 南三陸町 | 荒砥漁港 | 346 | 護岸 | 4.12 | 8.70 | — | H24.11 | H28.3 | 策定予定 | H28.6 | 着工予定 | H31.3 | 完了予定 | 詳細設計、用地買収、用地測量 | 詳細設計、用地測量 | | 復興 |
| 南三陸町 | 平磯漁港 | 361 | 護岸 | 4.12 | 8.70 | — | H24.11 | H28.2 | 策定予定 | H28.6 | 着工予定 | H31.3 | 完了予定 | 詳細設計、用地買収、用地測量 | 詳細設計、用地測量、本工事 | | 復興 |
| 南三陸町 | 津ノ宮漁港 | 340 | 護岸 | 4.12 | 7.30 | — | H24.11 | H28.2 | 策定予定 | H28.6 | 着工予定 | H31.3 | 完了予定 | 詳細設計、用地買収、用地測量 | 詳細設計、用地測量、本工事 | | 復興 |
| 南三陸町 | 長清水漁港 | 無堤 | 護岸 | — | 7.30 | — | H24.11 | H28.3 | 策定予定 | H28.3 | 着工済み | H31.3 | 完了予定 | 詳細設計、用地買収、用地測量 | 詳細設計、用地測量、本工事 | | 復興 |

2. 河川対策

【県・市町村管理区間】

- ① 2級水系八幡川水系など※1の県・町管理区間では、全箇所（27箇所）※2の災害復旧事業を予定。そのうち、施設の被災及び背後地の状況に応じて緊急度の高い9箇所については大型土のう積み等による応急対策を完了。

本復旧については、平成24年度は8箇所、平成25年度は3箇所、平成26年度は9箇所、平成27年度には新たに2箇所（累計23箇所）で着手。

- ② 平成28年度に、新たに4箇所（累計26箇所）で本復旧に着手予定。

また、平成28年度内に8箇所（累計30箇所）で本復旧完了予定。

残る箇所についても、順次、本復旧に着手し、海岸堤防の整備計画及び町が策定する復興計画等と整合を図りながら逐次整備し、概ね8年を目途に全箇所完了させることを目標とする。（まちづくりと一体となって実施する区間については、まちづくりと堤防整備の調整を図りながら実施。）

また、今後津波の遡上が想定される区間については、水門等の機能が確実に発揮されるよう、耐震化、自動化及び遠隔操作化の対策を実施。

- ③ 平成27年度における成果

- ・新たに2箇所（累計22箇所）で本復旧に着手
- ・新たに3箇所（累計6箇所）で本復旧完了
- ・上記箇所を除く復旧中の箇所の推進を図った。

- ④ 平成28年度の成果目標

- ・新たに4箇所（累計10箇所）で本復旧に着手予定
- ・本復旧の完了予定は、以下の通り
平成28年度：8箇所（累計14箇所）

- ⑤ 事業完了予定年度

平成30年度

復興施策の事業計画 参考図面 河川 南三陸町

図面：宮城県提供


| 河川名 | 延長(km) | 流域面積(km ²) | 平均流量(m ³ /s) | 平均流速(m/s) | 平均水深(m) | 平均河床高(m) | 平均河床傾斜(%) |
|--------|--------|------------------------|-------------------------|-----------|---------|----------|-----------|
| 1 北上川 | 54.000 | 83 | 1,000 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| 2 大沢川 | 6,840 | 84 | 1,000 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| 3 長瀬川 | 1,000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 大瀬川 | 8,760 | 86 | 2,700 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| 5 藤谷川 | 1,500 | 87 | 1,000 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| 6 高井川 | 10,526 | 88 | 3,000 | 206 | 206 | 206 | 206 |
| 7 高瀬川 | 2,500 | 90 | 1,000 | 208 | 208 | 208 | 208 |
| 8 中瀬川 | 3,400 | 91 | 1,000 | 209 | 209 | 209 | 209 |
| 9 大瀬川 | 640 | 92 | 1,000 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 10 大瀬川 | 1,300 | 93 | 1,000 | 211 | 211 | 211 | 211 |
| 11 大瀬川 | 5,445 | 94 | 2,512 | 212 | 212 | 212 | 212 |
| 12 大瀬川 | 1,800 | 95 | 2,300 | 213 | 213 | 213 | 213 |
| 13 大瀬川 | 2,300 | 96 | 1,020 | 214 | 214 | 214 | 214 |
| 14 大瀬川 | 1,715 | 97 | 450 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| 15 大瀬川 | 220 | 98 | 1,300 | 216 | 216 | 216 | 216 |
| 16 大瀬川 | 1,500 | 99 | 1,040 | 217 | 217 | 217 | 217 |
| 17 大瀬川 | 35,000 | 100 | 1,540 | 218 | 218 | 218 | 218 |
| 18 大瀬川 | 1,150 | 101 | 9,000 | 219 | 219 | 219 | 219 |
| 19 大瀬川 | 31,720 | 102 | 1,800 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 20 大瀬川 | 26,100 | 103 | 3,000 | 221 | 221 | 221 | 221 |
| 21 大瀬川 | 8,855 | 104 | 1,000 | 222 | 222 | 222 | 222 |
| 22 大瀬川 | 7,626 | 105 | 2,200 | 223 | 223 | 223 | 223 |
| 23 大瀬川 | 1,150 | 106 | 9,000 | 224 | 224 | 224 | 224 |
| 24 大瀬川 | 31,720 | 107 | 1,800 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 25 大瀬川 | 5,545 | 108 | 6,054 | 226 | 226 | 226 | 226 |
| 26 大瀬川 | 2,300 | 109 | 4,000 | 227 | 227 | 227 | 227 |
| 27 大瀬川 | 2,200 | 110 | 1,000 | 228 | 228 | 228 | 228 |
| 28 大瀬川 | 2,500 | 111 | 3,500 | 229 | 229 | 229 | 229 |
| 29 大瀬川 | 1,400 | 112 | 2,075 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 30 大瀬川 | 9,000 | 113 | 8,126 | 231 | 231 | 231 | 231 |
| 31 大瀬川 | 6,500 | 114 | 7,110 | 232 | 232 | 232 | 232 |
| 32 大瀬川 | 1,300 | 115 | 2,000 | 233 | 233 | 233 | 233 |
| 33 大瀬川 | 4,000 | 116 | 5,200 | 234 | 234 | 234 | 234 |
| 34 大瀬川 | 4,000 | 117 | 12,339 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| 35 大瀬川 | 1,800 | 118 | 6,000 | 236 | 236 | 236 | 236 |
| 36 大瀬川 | 3,500 | 119 | 3,500 | 237 | 237 | 237 | 237 |
| 37 大瀬川 | 16,181 | 120 | 3,500 | 238 | 238 | 238 | 238 |
| 38 大瀬川 | 6,654 | 121 | 2,230 | 239 | 239 | 239 | 239 |
| 39 大瀬川 | 3,230 | 122 | 3,500 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 40 大瀬川 | 5,260 | 123 | 7,554 | 241 | 241 | 241 | 241 |
| 41 大瀬川 | 1,750 | 124 | 5,017 | 242 | 242 | 242 | 242 |
| 42 大瀬川 | 3,500 | 125 | 3,300 | 243 | 243 | 243 | 243 |
| 43 大瀬川 | 5,000 | 126 | 7,500 | 244 | 244 | 244 | 244 |
| 44 大瀬川 | 21,588 | 127 | 1,024 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| 45 大瀬川 | 7,700 | 128 | 1,530 | 246 | 246 | 246 | 246 |
| 46 大瀬川 | 2,300 | 129 | 1,100 | 247 | 247 | 247 | 247 |
| 47 大瀬川 | 6,599 | 130 | 2,400 | 248 | 248 | 248 | 248 |
| 48 大瀬川 | 38,072 | 131 | 7,417 | 249 | 249 | 249 | 249 |
| 49 大瀬川 | 2,500 | 132 | 3,500 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 50 大瀬川 | 5,772 | 133 | 2,200 | 251 | 251 | 251 | 251 |
| 51 大瀬川 | 2,100 | 134 | 6,270 | 252 | 252 | 252 | 252 |
| 52 大瀬川 | 2,000 | 135 | 11,959 | 253 | 253 | 253 | 253 |
| 53 大瀬川 | 2,000 | 136 | 3,500 | 254 | 254 | 254 | 254 |
| 54 大瀬川 | 7,450 | 137 | 7,700 | 255 | 255 | 255 | 255 |
| 55 大瀬川 | 47,400 | 138 | 1,800 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| 56 大瀬川 | 11,781 | 139 | 10,000 | 257 | 257 | 257 | 257 |
| 57 大瀬川 | 1,300 | 140 | 2,000 | 258 | 258 | 258 | 258 |
| 58 大瀬川 | 9,750 | 141 | 3,000 | 259 | 259 | 259 | 259 |
| 59 大瀬川 | 4,254 | 142 | 1,900 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 60 大瀬川 | 1,300 | 143 | 2,000 | 261 | 261 | 261 | 261 |
| 61 大瀬川 | 1,500 | 144 | 2,000 | 262 | 262 | 262 | 262 |
| 62 大瀬川 | 400 | 145 | 1,000 | 263 | 263 | 263 | 263 |
| 63 大瀬川 | 10,000 | 146 | 1,000 | 264 | 264 | 264 | 264 |
| 64 大瀬川 | 15,726 | 147 | 2,400 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| 65 大瀬川 | 1,320 | 148 | 6,000 | 266 | 266 | 266 | 266 |
| 66 大瀬川 | 11,344 | 149 | 1,000 | 267 | 267 | 267 | 267 |
| 67 大瀬川 | 1,500 | 150 | 1,000 | 268 | 268 | 268 | 268 |
| 68 大瀬川 | 26,395 | 151 | 2,600 | 269 | 269 | 269 | 269 |
| 69 大瀬川 | 24,135 | 152 | 2,600 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 70 大瀬川 | 4,500 | 153 | 2,600 | 271 | 271 | 271 | 271 |
| 71 大瀬川 | 3,000 | 154 | 2,600 | 272 | 272 | 272 | 272 |
| 72 大瀬川 | 3,000 | 155 | 2,600 | 273 | 273 | 273 | 273 |
| 73 大瀬川 | 3,000 | 156 | 2,600 | 274 | 274 | 274 | 274 |
| 74 大瀬川 | 3,000 | 157 | 2,600 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| 75 大瀬川 | 3,000 | 158 | 2,600 | 276 | 276 | 276 | 276 |
| 76 大瀬川 | 3,000 | 159 | 2,600 | 277 | 277 | 277 | 277 |
| 77 大瀬川 | 3,000 | 160 | 2,600 | 278 | 278 | 278 | 278 |
| 78 大瀬川 | 3,000 | 161 | 2,600 | 279 | 279 | 279 | 279 |
| 79 大瀬川 | 3,000 | 162 | 2,600 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 80 大瀬川 | 3,000 | 163 | 2,600 | 281 | 281 | 281 | 281 |
| 81 大瀬川 | 3,000 | 164 | 2,600 | 282 | 282 | 282 | 282 |
| 82 大瀬川 | 3,000 | 165 | 2,600 | 283 | 283 | 283 | 283 |

南三陸町

【県・町管理河川】

10水系 35河川 27箇所

- (二) 伊里前川水系 1河川 1箇所
- (二) 稲淵川水系 1河川 1箇所
- (二) 港川水系 1河川 1箇所
- (二) 桜川水系 1河川 1箇所
- (二) 新井田川水系 5河川 2箇所
- (二) 水戸辺川水系 1河川 2箇所
- (二) 水尻川水系 1河川 2箇所
- (二) 折立川水系 1河川 1箇所
- (二) 長清水川水系 1河川 1箇所
- (二) 八幡川水系他 22河川 15箇所

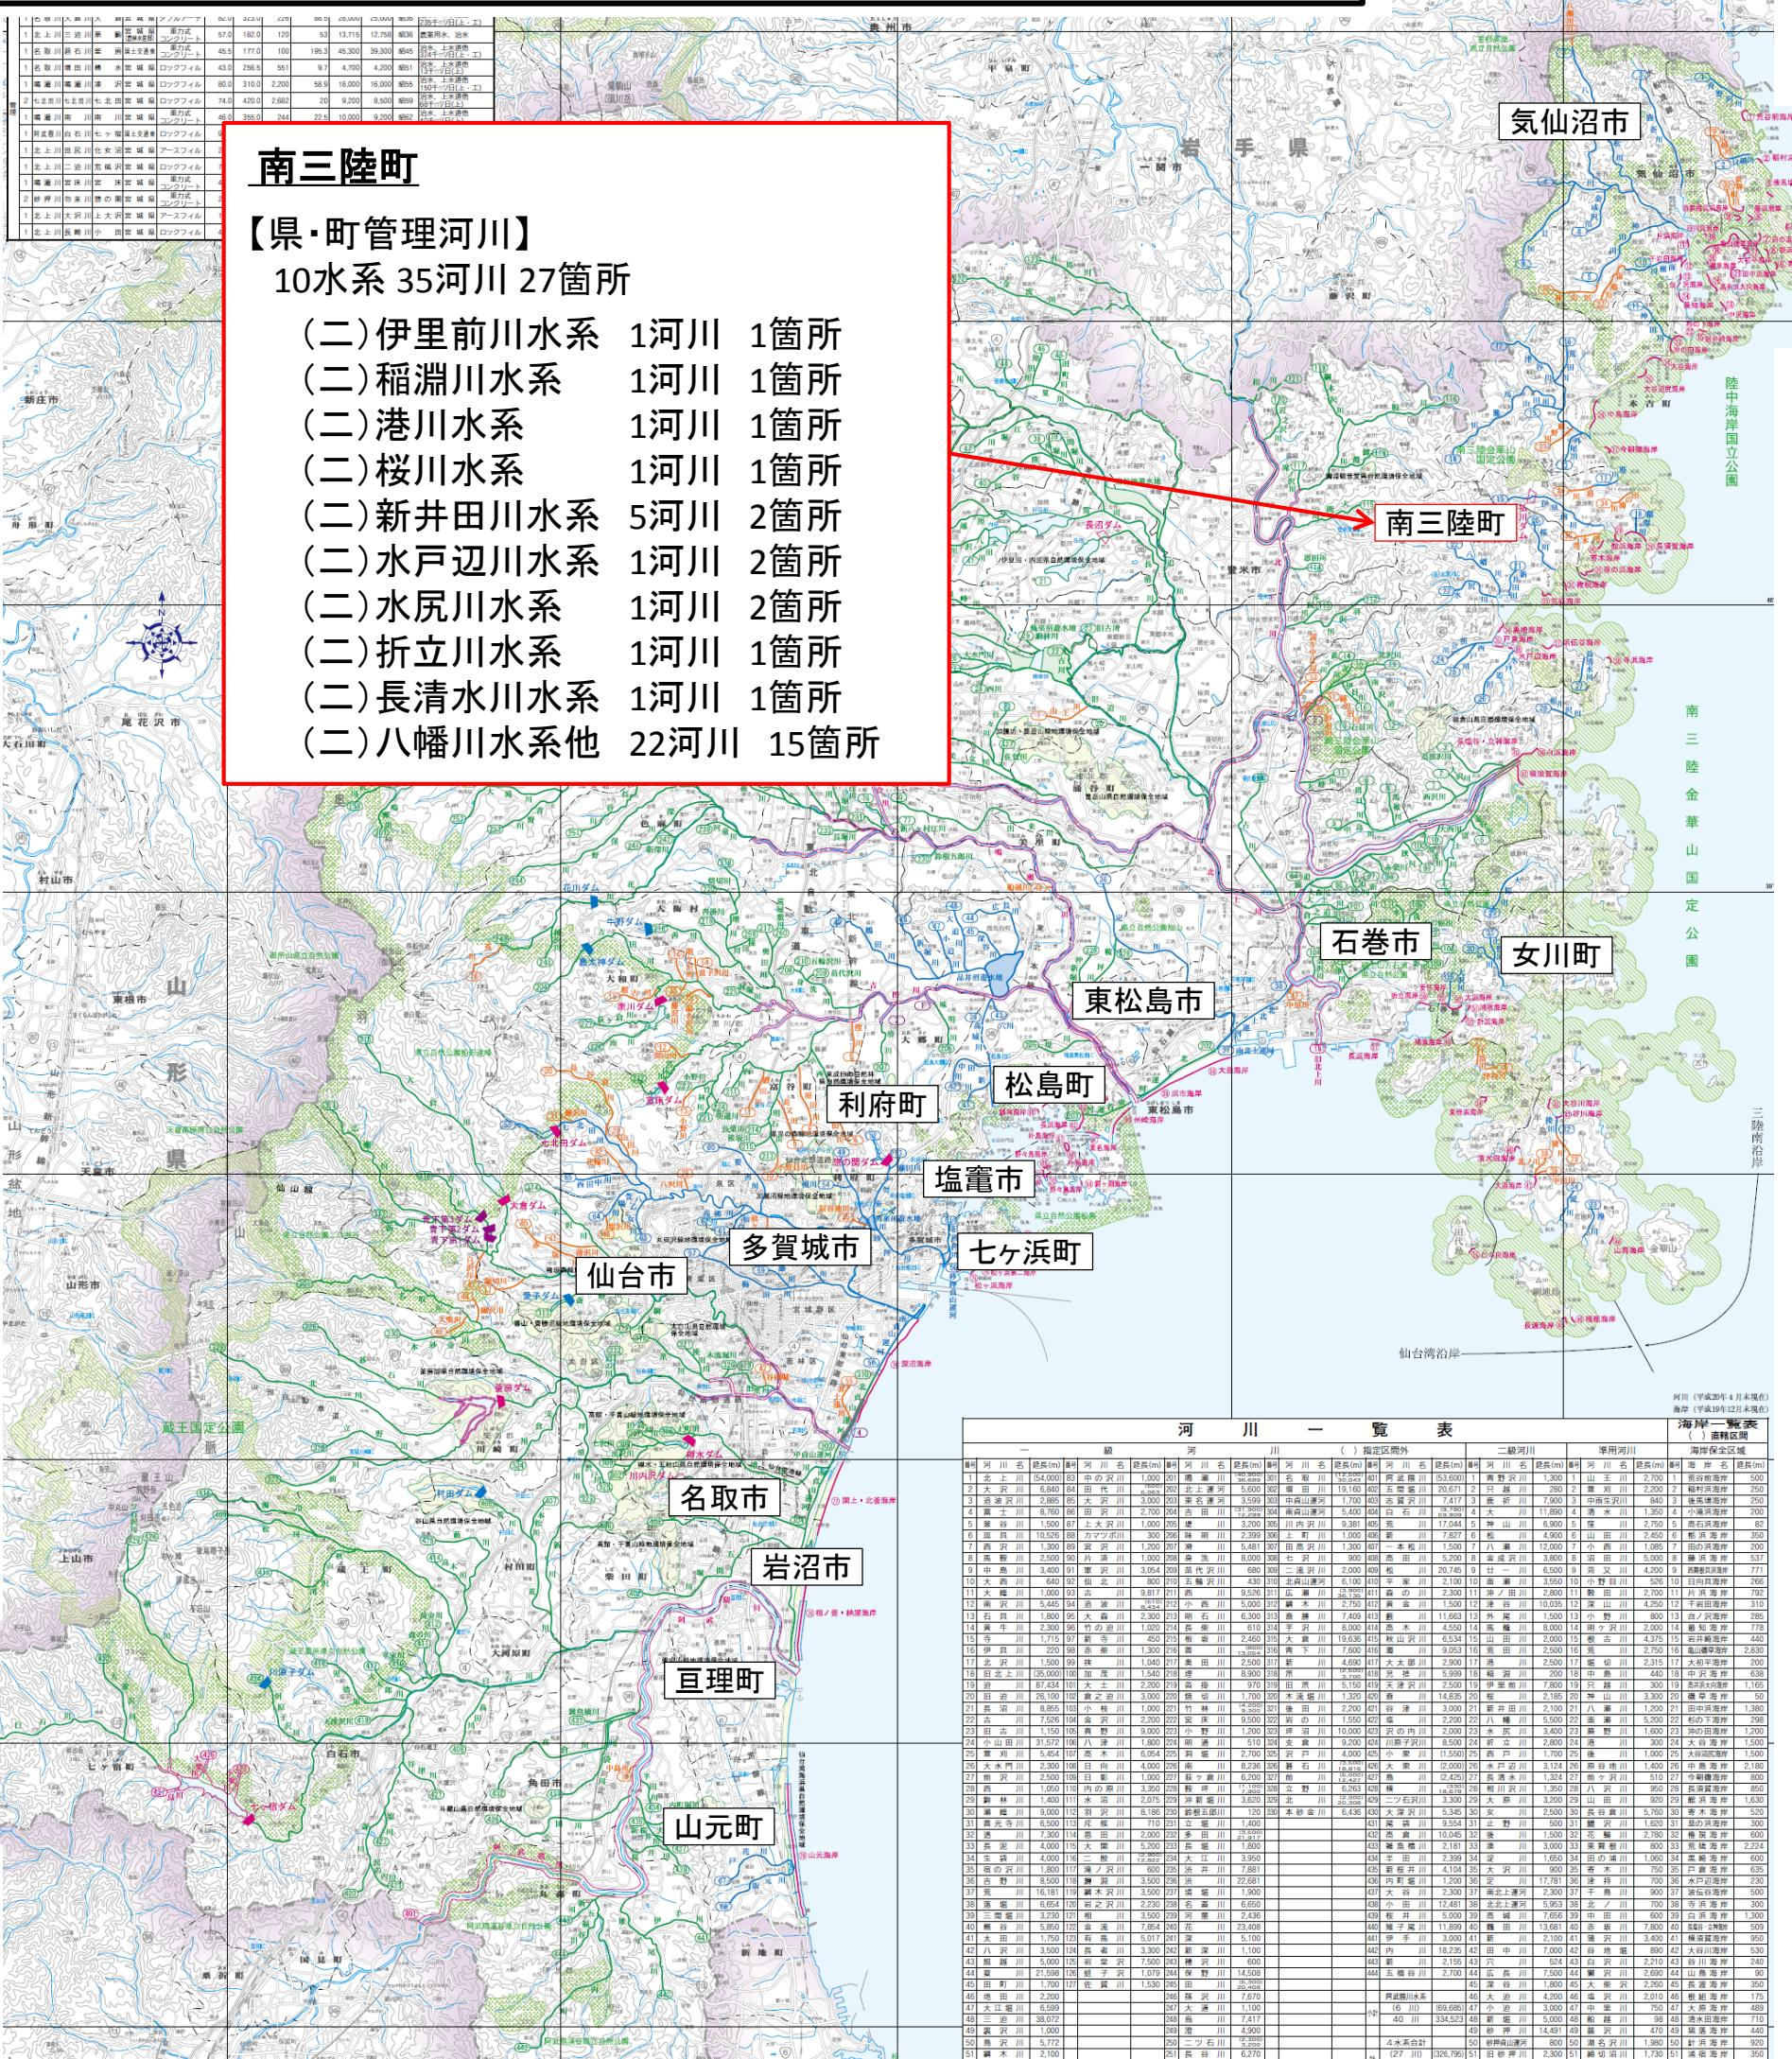

河川一覽表

| 河川名 | 延長(km) | 流域面積(km ²) | 平均流量(m ³ /s) | 平均流速(m/s) | 平均水深(m) | 平均河床高(m) | 平均河床傾斜(%) |
|--------|--------|------------------------|-------------------------|-----------|---------|----------|-----------|
| 1 北上川 | 54.000 | 83 | 1,000 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| 2 大沢川 | 6,840 | 84 | 1,000 | 202 | 202 | 202 | 202 |
| 3 長瀬川 | 1,000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 大瀬川 | 8,760 | 86 | 2,700 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| 5 藤谷川 | 1,500 | 87 | 1,000 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| 6 高井川 | 10,526 | 88 | 3,000 | 206 | 206 | 206 | 206 |
| 7 高瀬川 | 2,500 | 90 | 1,000 | 208 | 208 | 208 | 208 |
| 8 中瀬川 | 3,400 | 91 | 1,000 | 209 | 209 | 209 | 209 |
| 9 大瀬川 | 640 | 92 | 1,000 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 10 大瀬川 | 1,300 | 93 | 1,000 | 211 | 211 | 211 | 211 |
| 11 大瀬川 | 5,445 | 94 | 2,512 | 212 | 212 | 212 | 212 |
| 12 大瀬川 | 1,800 | 95 | 2,300 | 213 | 213 | 213 | 213 |
| 13 大瀬川 | 2,300 | 96 | 1,020 | 214 | 214 | 214 | 214 |
| 14 大瀬川 | 1,715 | 97 | 450 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| 15 大瀬川 | 220 | 98 | 1,300 | 216 | 216 | 216 | 216 |
| 16 大瀬川 | 1,500 | 99 | 1,040 | 217 | 217 | 217 | 217 |
| 17 大瀬川 | 35,000 | 100 | 1,540 | 218 | 218 | 218 | 218 |
| 18 大瀬川 | 1,150 | 101 | 9,000 | 219 | 219 | 219 | 219 |
| 19 大瀬川 | 31,720 | 102 | 1,800 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 20 大瀬川 | 26,100 | 103 | 3,000 | 221 | 221 | 221 | 221 |
| 21 大瀬川 | 8,855 | 104 | 1,000 | 222 | 222 | 222 | 222 |
| 22 大瀬川 | 7,626 | 105 | 2,200 | 223 | 223 | 223 | 223 |
| 23 大瀬川 | 1,150 | 106 | 9,000 | 224 | 224 | 224 | 224 |
| 24 大瀬川 | 31,720 | 107 | 1,800 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 25 大瀬川 | 5,545 | 108 | 6,054 | 226 | 226 | 226 | 226 |
| 26 大瀬川 | 2,300 | 109 | 4,000 | 227 | 227 | 227 | 227 |
| 27 大瀬川 | 2,200 | 110 | 1,000 | 228 | 228 | 228 | 228 |
| 28 大瀬川 | 2,500 | 111 | 3,500 | 229 | 229 | 229 | 229 |
| 29 大瀬川 | 1,400 | 112 | 2,075 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 30 大瀬川 | 9,000 | 113 | 8,126 | 231 | 231 | 231 | 231 |
| 31 大瀬川 | 6,500 | 114 | 7,110 | 232 | 232 | 232 | 232 |
| 32 大瀬川 | 1,300 | 115 | 2,000 | 233 | 233 | 233 | 233 |
| 33 大瀬川 | 4,000 | 116 | 5,200 | 234 | 234 | 234 | 234 |
| 34 大瀬川 | 4,000 | 117 | 12,339 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| 35 大瀬川 | 1,800 | 118 | 6,000 | 236 | 236 | 236 | 236 |
| 36 大瀬川 | 3,500 | 119 | 3,500 | 237 | 237 | 237 | 237 |
| 37 大瀬川 | 16,181 | 120 | 3,500 | 238 | 238 | 238 | 238 |
| 38 大瀬川 | 6,654 | 121 | 2,230 | 239 | 239 | 239 | 239 |
| 39 大瀬川 | 3,230 | 122 | 3,500 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 40 大瀬川 | 5,260 | 123 | 7,554 | 241 | 241 | 241 | 241 |
| 41 大瀬川 | 1,750 | 124 | 5,017 | 242 | 242 | 242 | 242 |
| 42 大瀬川 | 3,500 | 125 | 3,300 | 243 | 243 | 243 | 243 |
| 43 大瀬川 | 5,000 | 126 | 7,500 | 244 | 244 | 244 | 244 |
| 44 大瀬川 | 21,588 | 127 | 1,024 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| 45 大瀬川 | 7,700 | 128 | 1,530 | 246 | 246 | 246 | 246 |
| 46 大瀬川 | 2,300 | 129 | 1,100 | 247 | 247 | 247 | 247 |
| 47 大瀬川 | 6,599 | 130 | 2,400 | 248 | 248 | 248 | 248 |
| 48 大瀬川 | 38,072 | 131 | 7,417 | 249 | 249 | 249 | 249 |
| 49 大瀬川 | 2,500 | 132 | 3,500 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 50 大瀬川 | 5,772 | 133 | 2,200 | 251 | 251 | 251 | 251 |
| 51 大瀬川 | 2,100 | 134 | 6,270 | 252 | 252 | 252 | 252 |
| 52 大瀬川 | 2,000 | 135 | 11,959 | 253 | 253 | 253 | 253 |
| 53 大瀬川 | | | | | | | |

3. 交通網

自治体管理道路

国道 398 号外 4 路線（他路線：（一）泊崎半島線，（一）弘川町向線，（一）清水浜志津川港線，（一）志津川登米線）

- ① 箇所（工区）名：管の浜外、大久保外、小涼外、坂本外、名足外、館浜外、長清水、田の浦外、長清水橋、伊里前橋、八幡橋外、折立橋、横津橋
- ② 全箇所ともに平成 23 年 12 月までに概ね復旧を完了し、交通機能を確保済み。
- ③ 他事業に関連する一部工区（大久保外、折立橋）を除き平成 28 年度末までに復旧を完了する予定
国道 398 号の大久保外、折立橋については、平成 29 年度末までに本復旧を完了する予定
- ④ 平成 27 年度における成果
昨年度より着手している 6 箇所を含めた 7 箇所の本復旧を進捗。
- ⑤ 平成 28 年度の成果目標（集中復興期間の成果目標）
実施中箇所（7 箇所）については、早期本復旧完了に努める。
- ⑥ 事業完了予定年度
平成 29 年度

（町）東橋港線外 105 路線 外 13 路線

- ① 町道（1 級）東橋港線外 105 路線 南三陸町志津川字汐見町地内外
- ② 町道（1 級）東橋港線外 105 路線については、平成 30 年 3 月末までに復旧を完了。
平成 30 年度までに広域迂回解消予定
- ③ 町道（2 級）寄木線は、平成 29 年度末までに寄木橋を含め、本復旧を完了する予定
- ④ 平成 27 年度における成果
町道（2 級）寄木線外 9 路線 外 6 路線 実施設計完了

⑤ 平成 28 年度の成果目標（集中復興期間の成果目標）
町道（2 級）寄木線外 9 路線 外 6 路線 工事着手

⑥ 事業完了予定年度
平成 29 年度

4. 農地・農業用施設

① 被災状況

津波により約 460ha の農地及び農業用施設に甚大な被害

② 農地の復旧状況

平成 28 年度までに復旧を完了の見込み。

○平成 24 年度から営農再開が可能な農地 約 21ha
(志津川地区の一部農地)

○平成 25 年度から営農再開が可能な農地 約 137ha

○平成 26 年度から営農再開が可能な農地 約 104ha

○平成 27 年度から営農再開が可能な農地 約 80ha

○平成 28 年度から営農再開が可能な農地 約 24ha

○平成 28 年度の成果目標

平成 28 年度春の作付時期から、津波被災農地約 460ha のうち約 366ha (約 80%) で営農再開が可能となる見込み。

○事業完了予定年度 平成 28 年度

(現時点における農地復旧の見通しを示したものであり、今後の地元調整等により、面積は変わり得るもの。)

③ 区画整理等の実施状況

南三陸地区において、大区画化等の区画整理を実施しているところ。

5. 海岸防災林の再生

① 箇所名：旧歌津町、旧志津川町

② 被災状況

津波により防潮堤 685m、森林 29ha が被災した。

③ 事業計画の内容

被災した防潮堤（685m）については、治山施設災害復旧事業により復旧する。被災した森林（29ha）については、防災林造成事業により整備をする。

④ これまでの実施状況と今後の予定

居住可能な家屋の残っている集落が背後に存する区間の応急復旧を実施した。

防潮堤の復旧工事については、平成 25 年度に着手し、平成 28 年度に完了させる。

また、森林造成については、防潮堤の復旧工事が完了した箇所から順次、植栽に着手し、平成 29 年度の完了を目指す。

⑤ 平成 27 年度の成果

防災林造成事業：防潮堤 17.8m の復旧を完了。

0.24ha で林帯地盤の復旧を完了。

⑥ 平成 28 年度の成果目標

治山施設災害復旧事業：防潮堤全箇所の復旧を完了。

防災林造成事業：防災林造成 2 箇所の完了。

⑦ 事業完了予定年度

平成 29 年度

（保全対象：国道 45 号線、県道 225 号線他、農地、人家（波伝谷地区他））

6. 漁港

① 被害状況

漁港数：23 漁港

被災漁港数：23 漁港

② これまでの実施状況と今後の予定

南三陸町内の各被災 23 漁港において、平成 26 年度末時点で、18 漁港で全延長の陸揚げ機能が回復し、5 漁港で部分的に陸揚げ機能が回復している。

今後、平成 29 年度までに、その他の漁港施設の復旧の完了を目指す。

7. 復興まちづくり

(1) 津波復興拠点整備事業

① 地区名：志津川東地区、志津川中央地区

② 東日本大震災復興交付金を活用して、平成 24 年度から津波復興拠点整備事業に着手。

③ 平成 27 年度までの成果

志津川東地区については、平成 24 年 8 月に一団地の津波防災拠点市街地形成施設として都市計画決定し、平成 25 年 3 月に事業認可、平成 25 年 4 月に工事着手^{※1}している。

志津川中央地区については、平成 24 年 8 月に一団地の津波防災拠点市街地形成施設として都市計画決定し、平成 25 年 11 月に事業認可、平成 25 年 11 月に工事着手^{※1}している。

④ 平成 28 年度の成果目標

志津川東地区については、平成 29 年度の事業完了に向けて着実に工事を進めていく。

志津川中央地区については、平成 29 年度の事業完了に向けて着実に工事を進めていく。

⑤ 事業完了予定年度

志津川東地区：平成 29 年度予定

志津川中央地区：平成 29 年度予定

※1 工事着手には設計付き工事発注を含む

(2) 学校施設等

① 幼稚園・小中高等学校等

(i) 公立学校

<南三陸町立学校等>

東日本大震災により被災した町立学校等のうち、公立学校施設の災害復旧に係る国庫補助に申請予定の 7 校・1 施設（学校給食センター）について、以下のとおり、早期の復旧を目指す。

- 比較的軽微な被害に留まる5校については、平成23年度内の事業着手、平成24年度内に復旧を完了した。
- 津波により甚大な被害を受けた3校・1施設のうち、名足小学校については、平成25年度内に復旧を完了した。戸倉小学校及び学校給食センターについては、安全な高台へ移転新築することとし、戸倉小学校は平成27年9月末に復旧を完了した。学校給食センターは平成29年6月までの復旧完了を目標とする。
なお、戸倉中学校については、平成26年4月に志津川中学校と統合した。

<県立学校>

南三陸町に所在する県立学校のうち、東日本大震災により被災し、公立学校施設の災害復旧に係る国庫補助に申請した1校については、比較的軽微な被害に留まり、平成24年度内の復旧を完了した。

(ii) 私立学校

東日本大震災により被災した私立学校のうち、私立学校施設の災害復旧に係る国庫補助に申請予定の1校について、以下のとおり、早期の復旧を目指す。

津波被害により園舎が流失したあさひ幼稚園について、同地での再建が困難であるため、同町内の公民館を間借りして平成23年6月から保育を再開していたが、応急仮設校舎が完成したことにより、平成24年8月から同地で開園している。なお、本園舎については、平成27年度内に事業着手し、平成28年度内に復旧完了する予定である。

② 公立社会教育施設（公立社会体育施設を含む）

<南三陸町立社会教育施設>

東日本大震災により被災し、公立社会教育施設の災害復旧に係る国庫補助に申請予定の7施設について、以下のとおり、早期の復旧を目指す。

- 比較的軽微な被害に留まる南三陸町総合体育館、南三陸町平成の森野球場の2施設については、平成24年度内の事業着手、平成25年度内に復旧を完了した。
- 甚大な被害を受け津波により滅失した志津川公民館、戸倉公民館、歌津公民館、南三陸町図書館、南三陸町総合運動場の5施設については、平成28年度以降の復旧を目指している。また、志津川公民館と図書館等は2施設を1施設に統合し復旧する予定である。

<県立社会教育施設>

南三陸町に所在する社会教育施設のうち、東日本大震災により被災し、公立社会教

育施設の災害復旧に係る国庫補助に申請のあった1施設については、以下のとおり復旧完了した。

- 津波による艇庫の全損などの被害を受けた志津川自然の家については、平成23年度に事業着手、平成27年3月に事業を完了した。

8. 土砂災害対策

- ① 平成 23 年 8 月末までに、町内約 200 箇所土砂災害危険箇所の点検を実施し、約 10 箇所で斜面の変状等を確認。降雨等により二次的な被害の恐れがある箇所等、必要に応じ土のう積みや観測等の応急対策を実施。（降雨の状況等を考慮し、随時再調査等を実施。）

- ② 最大震度 6 弱を観測した南三陸町では、地震により地盤が脆弱になっている可能性が高く、降雨による土砂災害の危険性が通常よりも高いと考えられるため、県と気象台 が連携し、平成 23 年 3 月より土砂災害警戒情報の発表基準を引き下げて運用していたが、降雨と土砂災害発生状況を考慮して基準を見直し、平成 25 年 9 月に通常基準への引き上げを実施。

- ③ 事業完了年度
平成 23 年度

9. 災害廃棄物の処理

① 推計量について

東日本大震災においては、地震による大規模な津波及び地震による建物の倒壊等により膨大な量の災害廃棄物等約 723 千トン※（災害廃棄物が約 556 千トン、津波堆積物が約 167 千トン）発生した。

② 搬入状況について

住民が生活している場所の近くの災害廃棄物については、平成 23 年 7 月中に仮置場へ概ね搬入した。その他の災害廃棄物（損壊家屋等の解体により生じた災害廃棄物を含む。）、津波堆積物についても、平成 25 年 8 月末までに仮置場への搬入は完了した。

③ 処理状況について

平成 26 年 3 月末までに、災害廃棄物等約 723 千トン※（災害廃棄物が約 556 千トン、津波堆積物が約 172 千トン）の処理をすべて完了した。

④ 事業完了年度

平成 25 年度

※）災害廃棄物等推計量、災害廃棄物推計量及び津波堆積物推計量は、各推計量の合計値を 100 トン単位で個別に四捨五入した値のため、千トンの誤差を生じる場合がある。

10. 都市公園

【復旧関係】

① 箇所名：松原公園

② 被災状況

津波により、全施設が損壊及び流出

地震の影響により、一部敷地土壌の流出及び地盤沈下が発生

③ 平成 28 年度の成果目標

都市災害復旧事業により、陸上競技場、野球場、遊戯施設等の復旧工事に着手し、事業の進捗を図る。

④ 事業完了予定年度

平成 29 年度

【復興関係】

① 地区名：志津川地区

② 東日本大震災復興交付金を活用して、平成 24 年度から都市公園事業に着手。

③ 平成 27 年度における成果

平成 24 年度に土地利活用計画策定業務を実施し、その後他機関等の調整を行ってきた。平成 27 年 9 月に都市計画決定している。

④ 平成 28 年度の成果目標

平成 28 年度末までに工事着手する。

⑤ 事業完了予定年度

平成 30 年度

復興施策の工程表(宮城県南三陸町)

